

目錄

第一章 計畫範圍	1
一、 依據	1
二、 工程概要	1
三、 適用對象	8
四、 名詞定義	9
第二章 管理責任及權責分工	11
一、 品管組織	11
二、 工作職掌	12
三、 人員輪值及請休假事項	14
四、 管理審查	14
五、 應用表單	15
第三章 施工要領	16
三、 施工要領訂定	17
第四章 品質管理標準	39
一、 品質管理標準訂定	39
二、 應用表單	40
第五章 材料及施工檢驗程序	82
一、 材料設備檢驗程序	82
二、 施工檢驗程序	84
三、 應用表單	112
第六章 設備功能運轉測試程序及標準	132
一、 設備功能運轉測試檢測程序	132
二、 設備功能運轉測試檢驗標準	135
三、 應用表單	136
第七章 自主檢查表	138
一、 自主檢查表之訂定	138
二、 自主檢查表之執行	139
三、 應用表單	140
第八章 不合格品之管制	169
一、 不合格材料及設備之管制	169
二、 施工不合格品質之管制	171
三、 應用表單	173

第九章 矯正與預防措施	177
一、 矯正措施	177
二、 預防措施	179
三、 應用表單	181
第十章 內部品質稽核	184
一、 品質稽核權責	184
二、 品質稽核範圍	185
三、 品質稽核頻率	185
四、 品質稽核流程	186
五、 應用表單	187
第十一章 文件記錄管理系統	192
一、 文件管理系統	192
二、 紀錄管理作業程序	195
三、 文件紀錄移轉及存檔	197

表目錄

表 一-1 工程主要施工項目及數量	3
表 二-1 工作職掌表	12
表 二-2 公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表	15
表 三-1 各分項計畫管制表	16
表 三-2 各分項工程施工要領一覽表	17
表 三-3 交通臨時安全措施施工要領	18
表 三-4 道路土石方工程施工要領	19
表 三-5 級配粒料底層工程施工要領	20
表 三-6 測量工程施工要領	20
表 三-7 瀝青混凝土鋪面工程施工要領	21
表 三-8 鋼筋工程施工要領	22
表 三-9 模板工程施工要領	23
表 三-10 混凝土工程施工要領	24
表 三-11 照明工程施工要領	25
表 三-12 鍍鋅鋼網圍籬工程施工要領	26
表 三-12 植栽工程施工要領	26
表 三-14 兒童遊戲場設備工程施工要領	27
表 三-15 預鑄路緣石工程施工要領	28
表 三-16 鋪面磚(高壓), 警示磚、高壓混凝土磚工程施工要領	29
表 三-17 磨石子工程施工要領	30
表 三-18 抵石子工程施工要領	31
表 三-19 彈性無縫鋪面工程施工要領	32
表 三-20 地坪工程施工要領	33
表 三-21 磁磚工程施工要領	34
表 三-22 木作工程施工要領	35
表 三-23 排水工程施工要領	36
表 三-24 假設工程施工要領	37
表 三-25 電力配線工程施工要領	37
表 三-26 器具設備工程施工要領	37
表 三-27 濕式壓花地坪工程施工要領	38
表 四-1 主要項目施工品質管理標準一覽表	40
表 四-2 交通臨時安全措施工程品質管理標準表	42
表 四-3 土方管制施工工程品質管理標準表(1/2)	43
表 四-4 土方管制施工抽查標準(2/2)	44
表 四-5 道路土石方工程工程品質管理標準表	45
表 四-6 測量工程工程品質管理標準表	46
表 四-7 瀝青混凝土鋪面工程工程品質管理標準表	47
表 四-8 鋼筋工程工程品質管理標準表	48

表 四-9 模板工程施工工程品質管理標準表(1/2)	49
表 四-10 模板工程施工工程品質管理標準表(2/2)	50
表 四-11 混凝土工程施工工程品質管理標準表	51
表 四-12 照明工程施工工程品質管理標準表	52
表 四-13 鍍鋅鋼網圍籬工程施工工程品質管理標準表	53
表 四-14 植栽工程施工工程品質管理標準表	54
表 四-15 兒童遊戲場設備工程施工工程品質管理標準表(一)	55
表 四-16 兒童遊戲場設備工程施工工程品質管理標準表(二)	56
表 四-17 兒童遊戲場設備工程施工工程品質管理標準表(三)	57
表 四-18 兒童遊戲場設備工程施工工程品質管理標準表(四)	58
表 四-19 兒童遊戲場設備工程施工工程品質管理標準表(五)	59
表 四-20 兒童遊戲場設備工程施工工程品質管理標準表(六)	60
表 四-21 兒童遊戲場設備工程施工工程品質管理標準表(七)	61
表 四-22 預鑄路緣石工程施工工程品質管理標準表	62
表 四-23 鋪面磚鋪設工程施工工程品質管理標準表	64
表 四-24 磨石子工程施工工程品質管理標準表	65
表 四-25 抵石子工程施工工程品質管理標準表	66
表 四-26 彈性無縫鋪面工程檢查管理標準表	68
表 四-27 地坪工程檢查管理標準表	70
表 四-28 地(磁)磚工程檢查管理標準表(1/2)	71
表 四-29 地(磁)磚工程檢查管理標準表(2/2)	72
表 四-30 木作工程品質管理標準表	73
表 四-31 排水工程施工品質管理標準表	74
表 四-32 假設工程品質管理標準表(1/2)	75
表 四-33 假設工程品質管理標準表(2/2)	76
表 四-34 電力工程品質管理標準表	77
表 四-35 濕式壓花地坪工程品質管理標準表	79
表 四-36 汛期防災減災施工程品質管理標準表(1/2)	80
表 四-37 汛期防災減災施工程品質管理標準表(2/2)	81
表 五-1 各分項工程施工檢驗程序一覽表	85
表 五-2 交通臨時安全措工程施工檢驗程序	86
表 五-3 道路土石方工程施工檢驗程序	87
表 五-4 級配粒料底層工程施工檢驗程序	88
表 五-5 測量工程施工檢驗程序	89
表 五-6 瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序	90
表 五-7 鋼筋工程施工檢驗程序	91
表 五-8 模板工程施工檢驗程序	92
表 五-9 混凝土工程施工檢驗程序	93
表 五-10 照明工程施工檢驗程序	94
表 五-11 鍍鋅鋼網圍籬工程施工檢驗程序	95
表 五-12 植栽工程施工檢驗程序	96
表 五-13 兒童遊戲場設備工程施工檢驗程序	97

表 五-14 預鑄路緣石工程施工流程及檢驗點	98
表 五-15 鋪面磚(高壓)鋪設工程施工檢驗程序	99
表 五-16 磨石子工程施工檢驗程序	100
表 五-17 抵石子工程施工檢驗程序	101
表 五-18 彈性橡膠地墊工程施工檢驗程序	102
表 五-19 地坪工程施工檢驗程序	103
表 五-20 磁磚工程施工檢驗程序	104
表 五-21 木作工程施工檢驗程序	105
表 五-22 排水工程施工檢驗程序	106
表 五-23 假設工程施工檢驗程序	107
表 五-24 電力設備工程施工檢驗程序	108
表 五-25 器具設備施工檢驗程序	109
表 五-26 濕式壓花地坪工程施工檢驗程序	110
表 五-27 汛期防災施工檢驗程序	111
表 五-28 材料設備送審管制總表	112
表 五-29 材料設備檢(試)驗管制總表	119
表 五-30 材料/檢驗申請單	123
表 五-31 材料/設備品質自主檢查表	124
表 五-32 材料設備品質檢試驗紀錄表	125
表 五-33 施工抽查(驗)申請單	126
表 五-40 混凝土澆置申請單	127
表 五-35 材料及設備品質管理標準表	128
表 六-1 設備功能運轉檢驗標準表	135
表 六-2 照明設備功能運轉抽驗標準表	136
表 六-3 設備功能運轉檢測自主檢查表	137
表 七-1 主要施工項目施工自主檢查一覽表	140
表 七-2 施工中交通維持工程施工自主檢查表	141
表 七-3 土方開挖工程施工自主檢查表	142
表 七-4 道路工程施工自主檢查表	143
表 七-5 測量工程施工自主檢查表	144
表 七-6 瀝青混凝土鋪築工程施工自主檢查表	145
表 七-7 鋼筋工程施工自主檢查表	146
表 七-8 模板工程施工自主檢查表	147
表 七-9 混凝土澆注工程施工自主檢查表	148
表 七-10 照明施工自主檢查表	149
表 七-11 鍍鋅鋼網圍籬施工自主檢查表	150
表 七-12 植栽工程施工自主檢查表	151
表 七-13 兒童遊戲場設備工程施工自主檢查表	152
表 七-14 預鑄路緣石工程施工自主檢查表	153
表 七-15 鋪面磚(高壓)、警示磚、高壓混凝土磚工程施工自主檢查表	154
表 七-16 磨石子工程施工自主檢查表	155
表 七-17 抵石子工程施工自主檢查表	156

表 七-18 彈性無縫鋪面工程施工自主檢查表	157
表 七-19 泥作工程施工自主檢查表	158
表 七-20 磁磚工程施工自主檢查表	159
表 七-21 地(磁)磚工程施工自主檢查表	160
表 七-22 木作工程施工自主檢查表	161
表 七-23 排水工程工程施工自主檢查表	162
表 七-24 假設工程施工自主檢查表	163
表 七-25 電力配線工程施工自主檢查表	164
表 七-26 器具設備施工自主檢查表	165
表 七-27 濕式壓花地坪工程施工自主檢查表	166
表 七-28 汛期工地防災減災自主檢查表	167
表 八-1 不合格管制一覽表	173
表 八-2 材料退料紀錄表	174
表 八-3 不合格品改正紀錄表	175
表 八-4 施工缺失改善照片表	176
表 九-1 異常矯正與預防處理紀錄表	181
表 九-2 異常矯正與預防處理紀錄彙整總表	183
表 十-1 定期內部品質稽核計畫表	187
表 十-2 內部品質稽核通知單	188
表 十-3 內部品質稽核檢查表	189
表 十-4 內部品質稽核改善通知單	190
表 十-5 內部品質稽核成效追蹤表	191

圖目錄

圖 一-1 工程位置圖	2
圖 一-2 工址位置圖	2
圖 二-1 品管組織架構圖	11
圖 五-1 材料設備檢驗流程圖	83
圖 五-2 施工檢驗流程圖	84
圖 六-1 設備功能運轉檢測流程圖	134
圖 七-1 工程施工品質自主檢查流程圖	138
圖 八-1 材料自主檢查不合格管制作業流程	170
圖 八-2 施工自主檢查不合格管制作業流程	172
圖 八-3 施工自主檢查不合格管制作業流程	173
圖 九-1 矯正措施流程圖	178
圖 九-2 預防措施流程圖	180
圖 十-1 內部品質稽核組織圖	184
圖 十-2 品質稽核流程圖	186
圖 十一-1 收文文件傳送流程及歸檔流程圖	195
圖 十一-2 發文文件傳送流程及歸檔流程圖	196

第一章 計畫範圍

前言

五嶺營造有限公司（以下簡稱本公司）承攬桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程，為達成契約所規定之工程品質目標，如特性、規格、成本、有效性、壽命週期等，依據「公共工程施工品質管理制度及作業要點」建立施工品質管制系統，設立品質管理組織，訂定整體品質計畫，據以推動施實。執行施工及材料設備之檢查、內部品質稽核、統計分析、矯正與預防措施，並對結果進行檢討及改善，過程留存文件紀錄，以達成全面提升工程品質之目標。

一、依據

本品質計畫撰寫之依據，係以工程契約（含施工規範及設計圖說）、技師法、建築法、建築師法、營造業法、公共工程專業技師簽證規則、職業安全衛生法、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、環境保護相關規定、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點、公共工程施工綱要規範、公共工程施工階段契約約定權責分工表(無委託專案管理)、本公司品質系統作業規定編擬。

二、工程概要

本案基地位屬「縱貫公路桃園內壢間都市計畫」，區內公共設施用地已劃設逾 40 年遲未開闢，桃園市政府以公辦重劃方式取得仍有需要之公園用地之基地進行現況清整後歸還於民。

工程名稱：桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程

主辦機關：桃園市政府地政局

設計單位：杜風工程服務股份有限公司

監造單位：杜風工程服務股份有限公司

承攬廠商：五嶺營造有限公司

工程地點：桃園市桃園區

契約工期：540 日曆天

契約金額：新臺幣 107,947,000 元整

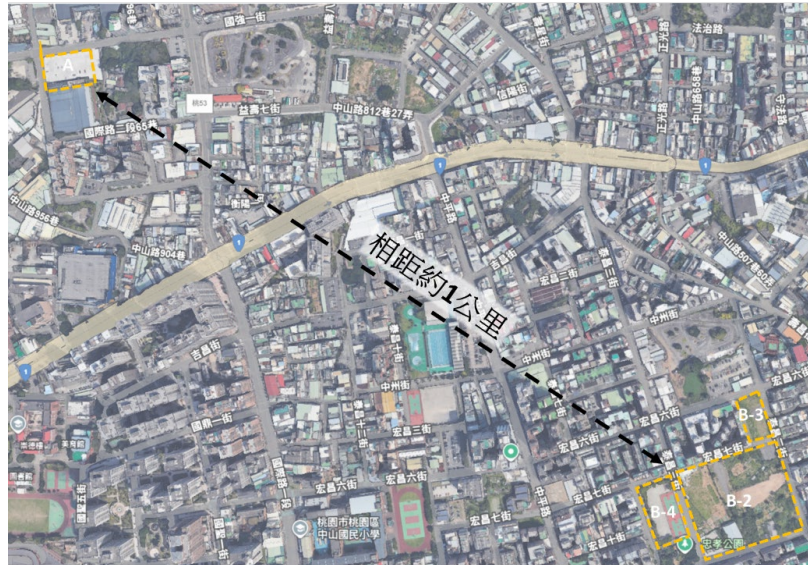


圖 一-1 工程位置圖

工程內容：

A 區位於國強一街及華德街路口東南側住二丘塊。(基地面積約 0.35 公頃)

B-1 區位於泰昌六街東側住二丘塊、B-2 區位於宏昌七街南側公園用地、

B-3 區於宏昌七街北側二丘塊。如圖一-2。



圖 一-2 工址位置圖

工程主要施工項目及數量

表 一-1 工程主要施工項目及數量

項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量
壹	直接工程費		
壹.一	整地拆除工程		
壹.一.1	清除及掘除	M2	15,148.00
壹.一.2	地坪打除，未含運費	M2	1,545.00
壹.一.3	機械拆除，鋼筋混凝土，未含運費	M3	951.00
壹.一.4	基地及路幅開挖(不含近運利用)	M3	1,266.00
壹.一.5	基地及路堤填築	M3	1,295.00
壹.一.6	餘方近運利用	M3	1,266.00
壹.一.7	PVC 披覆鐵絲網柵欄，鍍鋅鋼管支柱	M	624.00
壹.一.8	路幅整修，土方層整修	M2	29,236.00
壹.一.9	草籽撒播	M2	9,812.00
壹.一.10	鋼筋混凝土管(B 型)，D=300mm，三級管，含管配件	M	14.00
壹.一.11	禁倒廢土警告標示牌及安裝	座	7.00
壹.一.12	環境保護，空氣污染防治，防塵網	M2	9,812.00
壹.一.13	機械切割	M	161.00
壹.一.14	機械拆除，建築物拆除，鐵皮屋，未含運費	式	1.00
壹.一.15	籃球場地上物拆除	式	1.00
壹.一.16	廢棄物處理，營建廢棄物清除(含集中、運棄、處理)	M3	3,260.00
壹.一.17	一般廢棄物清除(含集中、運棄、處理)	T	200.00
壹.一.18	廢方處理(含運費)	M3	100.00
壹.一.19	環境保護，基地開挖 3M 及檢視	處	7.00
壹.二	景觀工程		
壹.二.1	景觀設施工程		
壹.二.1.1	基地及路幅開挖(不含近運利用)	M3	2,112.00
壹.二.1.2	餘方近運利用	M3	2,115.00
壹.二.1.3	水泥混凝土鋪面，停車場鋪面	M2	1,557.00
壹.二.1.4	水泥混凝土鋪面，路邊停車鋪面	M2	294.00
壹.二.1.5	人行道面層，鋪面磚(高壓)，警示磚	M2	29.00

壹.二.1.6	人行道面層，鋪面磚(高壓)，高壓混凝土磚	M2	4,144.00
壹.二.1.7	緣石，預鑄，路緣石，A 型	M	572.00
壹.二.1.9	緣石，預鑄，路緣石，C 型	M	1,290.00
壹.二.1.10	緣石，鋼板緣石	M	24.00
壹.二.1.11	室外簡易籃球場	式	1.00
壹.二.1.12	室外簡易籃球場，鍍鋅鋼網圍籬，H=3.08m	M	119.00
壹.二.1.13	室外簡易籃球場，鍍鋅鋼網圍籬雙開門	組	1.00
壹.二.1.14	兒童遊戲場設備，樓梯	組	2.00
壹.二.1.15	兒童遊戲場設備，磨石子滑梯	式	1.00
壹.二.1.16	兒童遊戲場設備，洗手台結構及面層	組	1.00
壹.二.1.17	兒童遊戲場設備，洗手台水電	組	1.00
壹.二.1.18	兒童遊戲場設備，彩色噴花地坪	M2	233.00
壹.二.1.19	兒童遊戲場設備，彈性無縫鋪面 t=7.5cm	M2	37.00
壹.二.1.20	兒童遊戲場設備，彈性無縫鋪面 t=4.5cm	M2	67.00
壹.二.1.21	兒童遊戲場設備，彈性橡膠地墊 t=9cm	M2	5.00
壹.二.1.22	兒童遊戲場設備，彈性橡膠地墊 t=4.5cm	M2	93.00
壹.二.1.23	兒童遊戲場設備，鋪面收邊	M	34.00
壹.二.1.24	兒童遊戲場設備，2.5cm 人工草皮	M2	83.00
壹.二.1.25	兒童遊戲場設備，樹皮塊地坪	M2	130.00
壹.二.1.26	兒童遊戲場設備，礫石地坪	M2	341.00
壹.二.1.27	兒童遊戲場設備，黑色隔草板	M	95.00
壹.二.1.28	標誌，無障礙停車位指示牌	組	2.00
壹.二.1.29	標誌，婦幼車位指示牌	組	2.00
壹.二.1.30	標誌，公園告示牌	組	1.00
壹.二.1.31	標誌，公園管理自治條例告示牌	組	1.00
壹.二.1.32	標誌，熱拌標線，厚 2mm	M2	304.00
壹.二.1.33	公園廁所，地面基礎及水電	式	1.00
壹.二.1.34	公園廁所，男廁單元	式	1.00
壹.二.1.35	公園廁所，女廁單元	式	1.00
壹.二.1.36	公園廁所，親子廁單元	式	1.00
壹.二.1.37	公園廁所，連接鋼架與頂板	式	1.00
壹.二.2	木作工程		
壹.二.2.1	粗木作，砂坑塑木花架	座	1.00

壹.二.2.2	粗木作，砂坑塑木花架雨遮	座	1.00
壹.二.2.3	粗木作，砂坑塑木木平台	座	1.00
壹.二.2.4	粗木作，塑木花廊架鋼構	座	1.00
壹.二.2.5	粗木作，塑木花廊架	座	1.00
壹.二.2.6	粗木作，塑木花廊架雙面座椅	組	5.00
壹.二.2.7	粗木作，塑木靠背座椅	座	5.00
壹.二.2.8	粗木作，塑木座椅 A	座	10.00
壹.二.2.9	粗木作，塑木座椅 B	座	1.00
壹.二.2.10	粗木作，洗手台塑木踏板	座	1.00
壹.二.2.11	粗木作，攀爬架 A	座	1.00
壹.二.2.12	粗木作，攀爬架 B	座	1.00
壹.二.2.13	粗木作，圓柱攀爬架	座	1.00
壹.二.3	遊戲場設施工程		
壹.二.3.1	兒童遊戲場設備，划船器	組	1.00
壹.二.3.2	兒童遊戲場設備，雙人浪板器	組	1.00
壹.二.3.3	兒童遊戲場設備，雙人漫步機	組	1.00
壹.二.3.4	兒童遊戲場設備，高中低單槓 230-200-170cm	組	1.00
壹.二.3.5	兒童遊戲場設備，複合式鞦韆	組	1.00
壹.二.3.6	兒童遊戲場設備，彈跳床 L150*W150cm	組	1.00
壹.二.3.7	兒童遊戲場設備，極限旋轉飛輪	組	1.00
壹.二.3.8	兒童遊戲場設備，擺盪大索	組	1.00
壹.二.3.9	兒童遊戲場設備，攀爬繩網	組	1.00
壹.二.3.10	兒童遊戲場設備，遊戲場告示牌	組	6.00
壹.二.4	公園排水工程		
壹.二.4.1	排水管溝，污水下水道連接、開挖及修復	式	1.00
壹.二.4.2	排水管溝，PE 地下儲水槽	組	3.00
壹.二.4.3	排水管溝，新設陰井 90x90x135cm	組	1.00
壹.二.4.4	排水管溝，新設陰井 70x70x75cm	組	36.00
壹.二.4.5	排水管溝，自設污水陰井內徑 60cm	組	2.00
壹.二.4.6	排水管溝，HDPE 透水網管(含埋設)	M	842.00
壹.二.4.7	排水管溝，3"PVC 加強埋設	M	81.00
壹.二.4.8	排水管溝，2"PVC 加強埋設	M	117.00

壹.二.4.9	排水管溝，4"污水用 PVC 管	M	77.00
壹.二.4.10	排水管溝，既有緣石打除及運棄	M	286.00
壹.二.4.11	排水管溝，既有預鑄溝蓋打除及運棄	M	104.00
壹.二.4.12	排水管溝，新作溝蓋板	M	104.00
壹.二.4.13	排水管溝，鍍鋅隔柵板(w=50cm)	組	24.00
壹.三	植栽工程		
壹.三.1	植栽維護，喬木類，枯木移除(喬木類)，樹 徑 $\leq 30\text{cm}$	株	40.00
壹.三.2	植栽維護，含斷根及定植作業	株	11.00
壹.三.3	植樹，杜英， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	24.00
壹.三.4	植樹，樟樹， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	56.00
壹.三.5	植樹，烏白， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	13.00
壹.三.6	植樹，青剛櫟， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹 幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	11.00
壹.三.7	植樹，洋紅風鈴木， $270\text{cm} \leq$ 樹高， 100cm $\leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	5.00
壹.三.8	植樹，黃花風鈴木， $270\text{cm} \leq$ 樹高， 100cm $\leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	9.00
壹.三.9	植樹，台灣檫木， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	7.00
壹.三.10	植樹，茄苳， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	32.00
壹.三.11	植樹，青楓， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	6.00
壹.三.12	植樹，光臘樹， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹 幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	20.00
壹.三.13	植樹，雀榕， $350\text{cm} \leq$ 樹高， $130\text{cm} \leq$ 樹幅， $9\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	3.00
壹.三.14	植樹，台灣欒樹， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	6.00
壹.三.15	植樹，流蘇， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	5.00
壹.三.16	植樹，藍花楹， $270\text{cm} \leq$ 樹高， $100\text{cm} \leq$ 樹 幅， $6\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	11.00
壹.三.17	植樹，羅漢松， $150\text{cm} \leq$ 樹高， $90\text{cm} \leq$ 樹幅， $5\text{cm} \leq$ 米高直徑	株	38.00

壹.三.18	植樹，灌木類，月橘，35cm≤高度，30cm≤寬度	株	361.00
壹.三.19	植樹，灌木類，厚葉石斑木，35cm≤高度，30cm≤寬度	株	400.00
壹.三.20	植草，假儉草(含施工養護)	M2	11,107.00
壹.四	景觀照明工程		
壹.四.1	照明燈具，電源開關箱，不銹鋼板，板厚2.0mm	只	3.00
壹.四.2	照明燈具，停車場單燈	組	8.00
壹.四.3	照明燈具，景觀高燈	組	27.00
壹.四.4	照明燈具，景觀柱燈	組	30.00
壹.四.5	照明燈具，籃球場投光燈	組	6.00
壹.四.6	照明燈具，多向性投光燈	組	8.00
壹.四.7	照明燈具，投光燈	組	9.00
壹.四.8	XLPE 電纜線 5.5mm ² *2C 600V(含損耗)	M	1,834.00
壹.四.9	PVC WIRE 接地線 3.5mm ² 600V (含損耗)	M	1,834.00
壹.四.10	PVC PIPE ϕ 41mm(含損耗)	M	1,834.00
壹.四.11	PVC 電纜線 3.5mm ² * 3/C(燈桿內)	M	461.00
壹.四.12	平面式塑膠警示帶	M	1,834.00
壹.四.13	開關箱至 TPC 管線材料含安裝	處	2.00
壹.四.14	申請用電文件費	式	1.00

三、適用對象

本計畫適用於「桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程」之施工品質管理部分，負責本工程之同仁，並包括材料供應商、設備製造商及分包施工廠商等均應遵循本品質計畫書之相關規定從事品質管理業務，以保證工程各項作業，均確實符合契約規範要求及相關法規之規定。

四、名詞定義

- (一)本工程：桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程
- (二)主辦機關：桃園市政府地政局(甲方)
- (三)設計廠商：杜風工程服務股份有限公司
- (四)監造單位：杜風工程服務股份有限公司(由桃園市政府地政局派駐工地負責監造之單位，本工程由桃園市政府地政局書面通知，由杜風工程服務股份有限公司派駐監造相關人員任之。)
- (五)承攬廠商、本公司：五嶺營造有限公司(乙方)
- (六)協力廠商：為材料及施工分包廠商。
- (七)工地主任：係指受聘於本公司，擔任本工程之工地事務及施工管理之人員。
- (八)專任工程人員：係指受聘於本公司之技師或建築師，，擔任本工程之施工技術指導及施工安全之人員。
- (九)品管人員：為本公司專責辦理品質計畫與執行查證工作，並且配合材料實驗室之各項品質檢驗，直接對本公司負責。
- (十)現場工程師：本公司派駐現場協助工地負責人執行各項工程進行之人員。
- (十一)程序：執行一項工程所規定的方法。
- (十二)檢驗：一種活動工程，例如量測、檢查、試驗或用樣板比測某一實體之一種或數種特性，將所得結果與規定要求相比較，以確定各個特性是否符合。
- (十三)自主檢驗：由承攬廠商按特定的規則所做之檢驗。
- (十四)確認：由檢查與提出客觀證據以證實某一特定預期用途之特別要求已被達成。
- (十五)品質：一個實體的特性總和，此種特性具有滿足明訂與潛在的需求之能力。
- (十六)一般條款：為用以規定承包商履行工程契約所應遵守之行為、履行之方式、業主與承包商間之責任與義務及業主、工程司、承包商之三者關係之規範，並為契約文件之一部分。
- (十七)施工規範：說明有關執行本契約工作之施工規定。

- (十八)契約圖說：說明有關執行本工程之施工及材料之尺寸、規格、注意事項。
- (十九)補充說明：說明執行本契約工程之補充規定。
- (二十)工作圖：說明有關執行本工程之施工及材料之尺寸、規格、注意事項。
- (二十一)施工製造圖：執行本契約圖說，另畫製施工詳細圖。
- (二十二)檢驗程序：施工、材料進場施作檢查留程及規定。
- (二十三)施工缺失：施工、材料施作時尺寸、規格不符契約及契約圖說之規定。
- (二十四)內部品質稽核：係本公司上級主管帶隊至各工地之品質稽核。
- (二十五)矯正措施：本工程之缺失改善之措施。
- (二十六)檢驗停留點：廠商應於品質計畫之材料及施工檢驗程序，明訂各項施工作業(含假設工程)及材料設備檢驗自主檢查之查驗點；自主檢查之查驗點應涵蓋監造單位明定之檢驗停留點。
- (二十七)安衛查驗點：各作業施工前，就施工過程設定安全衛生查驗點，並於施工中、驗收或使用前，分別執行查驗作業，相關執行紀錄應提報機關備查，並自查驗日起保存三年。稽查及檢查結果應記錄存檔，如有缺失需辦理扣罰者，紀錄應送機關備查，以作為懲罰性違約金扣罰之依據。
- (二十八)管理標準：依據契約、圖說、技術規範與特定條款，以及相關法規及標準等制定之標準，以進場材料及施工管理為依據。

第二章 管理責任及權責分工

一、品管組織

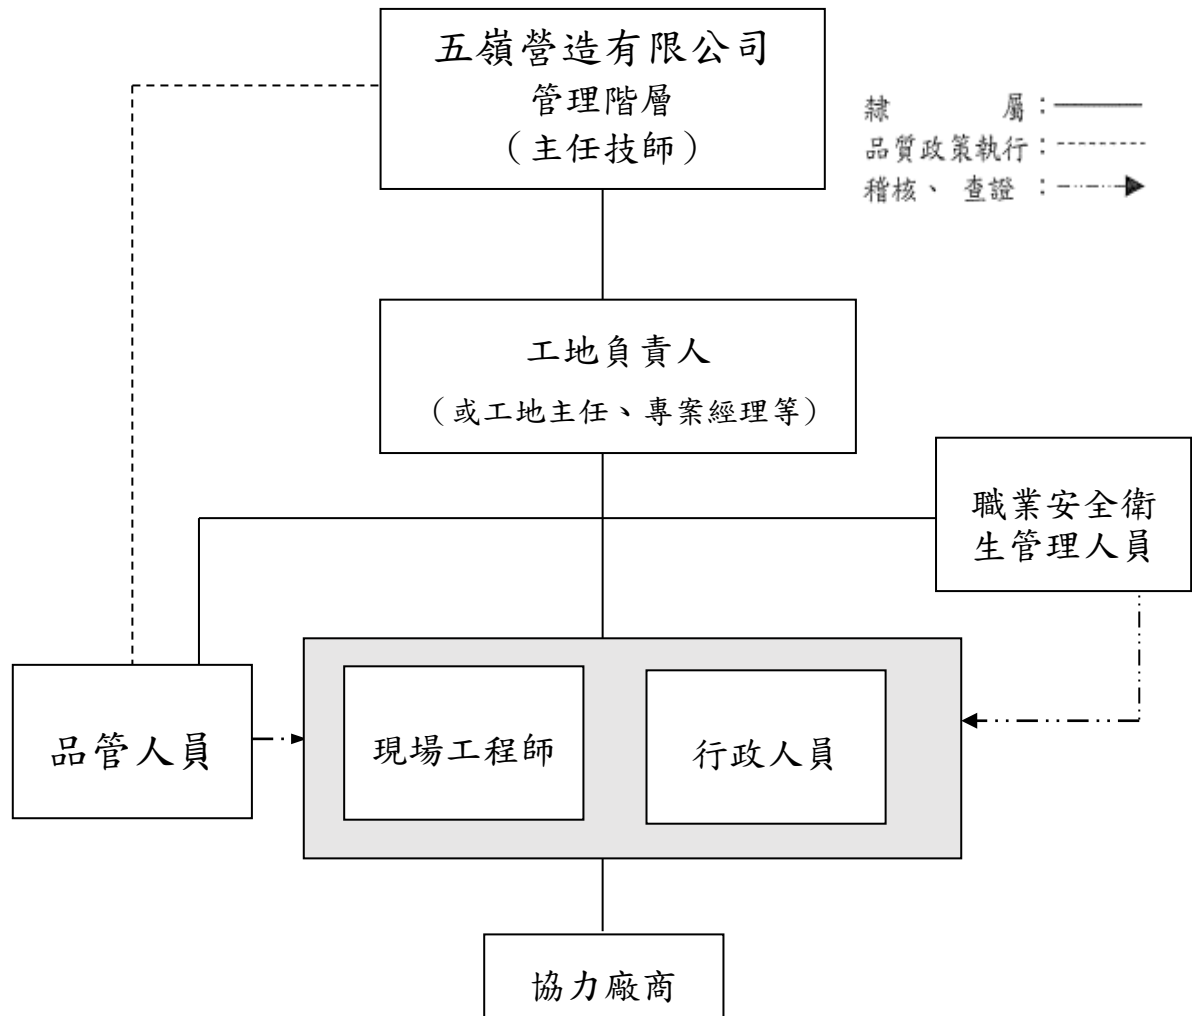


圖 二-1品管組織架構圖

二、工作職掌

依據工程契約及「公共工程施工品質管理作業要點」之規定，指派經訓練合格且具工程實務經驗之人員從事工程品質管理。又依「營造業法」及「職業安全衛生管理辦法」之規定，指派本工程除專任工程人員外，配置工地主任一人、品管人員一人、職業安全衛生業務主管(營造業)一人；工作職掌如下表二-1：

表 二-1 工作職掌表

職稱	工作職掌及依據
管理階層	1.統籌契約管理。 2.分包商、供應商施工品質成效之稽查。
專任工程人員(主任技師)	1.督查品管人員及現場施工人員，落實執行品質計畫，並填寫督察紀錄(表 3.1)。 2.依營造業法第 35 條規定，辦理相關工作，如督察按圖施工、解決施工技術問題，並於查驗文件簽名或蓋章。 3.依本府工程施工查核小組設置要點規定於工程查核時，到場說明。 4.新臺幣六百萬元以上之工程採購，專任工程人員應於估驗計價申請單、施工照片及錄影光碟片上簽署。 5.其他提升工程品質事宜。
工地負責人(工地主任)	(一)工地管理事項 工地範圍內之部署及配置。 工人、材料、機具、設備、門禁及施工裝備之管理。 已施工完成定作物之管理。 公共安全之維護。 工地突發事故之處理。 (二)工程推動事項 開工之準備。 交通維持計畫之研擬、申報。 材料、機具、設備檢(試)驗之申請、協調。 施工計畫及預定進度表之研擬、申報。 施工前之準備及施工完成後之查驗。 機關提出施工動態(開工、停工、復工、竣工)書面報告。 向機關填送施工日誌及定期工程進度表。 協調相關廠商研商施工配合事項。 會同監造單位/工程司勘研契約變更計畫。 依照監造單位/工程司之指示提出施工大樣圖資料。 施工品管有關事項。

	施工瑕疵之改正、改善。 天然災害之防範。 施工棄土之處理。 工地災害或災變發生後之善後處理。 其他施工作業屬廠商應辦事項者。 (三)工地環境維護事項： 施工場地及受施工影響地區排水系統設施之維護及改善。 工地圍籬之設置及維護。 工地內外環境清潔及污染防治。 工地施工噪音之防治。 工地週邊地區交通之維護及疏導事項。 其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。 (四)工地週邊協調事項： 加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。 與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。 定時提供施工進度及有關之資訊。 其他應辦事項。
品管人員	1. 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施。 2. 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。 3. 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。 4. 品質文件、紀錄之管理。 5. 其他提升工程品質事宜。
職業安全衛生管理人員	1. 執行工地安全衛生管理與環境保護事項。 2. 工地安全衛生緊急狀況之處置。 3. 編製安全衛生管理相關事宜。 4. 其他臨時交辦安全及衛生事項。
現場工程師	1. 施工順序與施工界面之協調。 2. 各項工程材料、設備之檢驗與試驗。 3. 協辦施工計畫之編製。 4. 其他臨時交辦事項。
行政人員	1. 文件繕打、文件管控、收發文、會計等一般行政工作 2. 其他臨時交辦事項。

三、人員輪值及請休假事項

原則上，工地人員依照勞基法施行細則第 23 條之 1 規定：「本法第 37 條所定休假遇本法第 36 條所定例假及休息日者，應予補假。但不包括本法第 37 條指定應放假之日。前項補假期日，由勞雇雙方協商排定之。」，遇有趕工必要時，工地人員會輪派留守。若工地人員請休假無法駐守工地時，會事先覓妥本公司合格人員代理。

四、管理審查

依每季審查品質管理系統以確保其持續適切、正確及有效性。審查內容包括前次審查紀錄執行情形、內部品質稽核、矯正措施、預防措施、外部驗證及工程評鑑結果。

五、應用表單

表 二-2 公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表

編號：EP-

一、工程名稱	桃園市第47期桃園區中平市地重劃工程				
二、工程主辦機關	桃園市政府地政局				
三、承攬廠商	五嶺營造有限公司				
四、填表日期	年 月 日 時				
五、工程進度概述				預定進度(%)	
				實際進度(%)	
六、督察按圖施工 (營造業法第35條第3款)	督察項目	督察結果		辦理情形	備註
		合格	缺失		
	(一) 放樣工程				
	(二) 地質改良工程				
	(三) 假設工程(含施工架)				
	(四) 基礎工程				
	(五) 模板工程				
	(六) 混凝土工程				
	(七) 鋼筋(鋼構)工程				
	(八) 基地環境雜項工程				
	(九) 主要設備工程				
	(十) 其他				
七、處理下列之一事項概述：(1) 施工技術指導及施工安全(2) 解決施工技術問題(3) 依工地主任之通報，處理工地緊急異常狀況(營造業法第3條第9款、第35條第3及4款)					
八、施工中發現顯有立即危險之虞，應即時為必要之措施之情形(營造業法第38條)					
九、向營造業負責人報告事項之記載(營造業法第37條)					
十、其他契約約定專任工程人員應辦事項辦理情形					
十一、督察簽章：【專任工程人員： ☐ 主任技師 ☐ 主任建築師】					
本次督察內容已會知工地主任(工地負責人)確認，嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 工地主任(工地負責人)：					

註：1.本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。

2.本表填報時機如下：(1)依營造業法第41條第1項規定辦理勘驗或查驗工程時。(2)公共工程施工日誌填表人提請專任工程人員解決施工技術問題。(3)專任工程人員依營造業法第35條第3款規定督察按圖施工時。(4)各機關於契約中約定。

3.有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。

4.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工中營造業專任工程人員督察紀錄表」填寫。

第三章施工要領

一、分項施工計畫提送時程與管制

表 三-1 各分項計畫管制表

項次	提送項目	預定送審日期	備註
1	步道鋪面工程(含底結構層及路緣石等，需提送排磚計畫)	施工前	
2	籃球場工程	施工前	
3	遊戲場彈性地坪工程	施工前	
4	遊具設備安裝工程	施工前	
5	塑木花架分項工程(含施工圖等)	施工前	
6	公園廁所工程(含施工圖等)	施工前	
7	公園排水工程	施工前	
8	植栽工程	施工前	
9	景觀照明工程	施工前	
10	停車場工程及圍籬工程(含施工圖等)	施工前	

二、分項施工計畫綱要

依工程需求，提送分項施工計畫，其內容包含：

- (一)、工項概述：包括工項概要、內容及數量等。
- (二)、人員組織：包括施工人員組織、協力廠商人力安排。
- (三)、施工方法與步驟：包括施作順序及介面整合。
- (四)、施工機具：包括使用機具及供電設備。
- (五)、使用材料：包括材料規格、材料數量、儲放及搬運。
- (六)、預定作業進度：包括施工規劃進度檢討、預定作業進度表。
- (七)、分項品質計畫：包括施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序及自主檢查表。
- (八)、分項作業安全衛生管理與設施設置措施：包含勞工安全衛生管理及勞工安全衛生設施設置。

三、施工要領訂定

表 三-2 各分項工程施工要領一覽表

項次	項 目 名 稱	編號
1	交通臨時安全措施施工要領	表三-3
2	土方管制施工要領	表三-4
3	道路土石方工程施工要領	表三-5
4	測量工程施工要領	表三-6
5	瀝青混凝土鋪築施工要領	表三-7
6	鋼筋工程施工要領	表三-8
7	模板工程施工要領	表三-9
8	混凝土工程施工要領	表三-10
9	照明工程施工要領	表三-11
10	鍍鋅鋼網圍籬施工要領	表三-12
11	植栽工程施工要領	表三-13
12	兒童遊戲場設備施工要領	表三-14
13	預鑄，路緣石施工要領	表三-15
14	鋪面磚(高壓)，警示磚、高壓混凝土磚施工要領	表三-16
15	磨石子工程施工要領	表三-17
16	抵石子工程施工要領	表三-18
17	彈性無縫鋪面施工要領	表三-19
18	地坪施工要領	表三 20
19	磁磚施工要領	表三-21
20	木作施工要領	表三-22
21	排水施工要領	表三-23
22	假設施工要領	表三-24
23	電力配線施工要領	表三-25
24	器具設備施工要領	表三-26
25	汛期工地防災準備施工要領	表三-27

表 三-3 交通臨時安全措施施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	安全圍籬、警告標誌、指示牌、公告牌、閃光紅燈等	吊卡車	依施工圖說。 支架設立位置依指示或是施工圖說。
2. 確認設置位置	噴漆		1. 依圖說規定確認點位位置及尺寸
4. 安裝完成			1. 完成面完整、穩固 2. 路面整潔

表 三-4 道路土石方工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			依施工圖說。 支架設立位置依指示或是施工圖說。
2. 確認設置位置	噴漆		1. 依圖說規定確認土方位置及尺寸 2. 雜草、樹木應先清除 3. 安全措施設置
4. 開挖		挖土機 運土車	1. 自上而下依序開挖 2. 應與不適用填方之廢土分開不得混合
5. 完成運離			1. 路面整潔

表 三-5 級配粒料底層工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	級配粒料	平路機 挖土機 振動輾壓機	1. 路面雜物須清除乾淨 2. 路面須整平壓實 3. 如有洞穴或不平須填平夯實 4. 按契約規格選擇材料
2. 碎石級配鋪設	碎石級配	卡車 刮路機 震動壓路機	1. 鋪設前完成碎石級配須符合圖說 2. 厚度控制須符合圖說規範 3. 鋪設後壓密度試驗須符合圖說規範 4. 平整度，厚度及坡度須符合圖說規範
3. 完成			1. 施工表面應均勻清潔 2. 周邊環境整理清掃

表 三-6 測量工程施工要領

施工步驟	使用材料	機具設備	注意事項
1. 施工前準備			1. 擬定測量計劃 2. 選擇適當的測量方式及工具
2. 控制樁測量	鋼釘或其他適合材料	經緯儀 水準儀 皮尺	1. 本工程部份若與其他工程相接，導線點須與其他施工單位相同
3. 縱橫斷面測量	木樁 鋼釘	經緯儀 水準儀 皮尺	1. 測定主要結構體橫斷面線 2. 橫斷面各樁號中心樁之高程應與縱斷面樁號高程一致
4. 結構物放樣	木樁	經緯儀	1. 位置、斜率及高程須符合圖說規定 2. 放樣誤差須符合圖說要求

表 三-7 瀝青混凝土鋪面工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 材料設備進場規格及顏色符合送審資料
2. 新舊底層相交處理	壓條	皮槌	1. 新舊底層相交處以壓條分割 2. 完成面須平整平乾淨
3. 面層施作	彩繪止滑塗料	高壓水槍 養生膠帶 噴槍 鋤刀	1. 表面使用高壓水清洗乾淨 2. 周圍需防護區施作養生膠帶 3. 底劑以 0.05L/m ² 均勻噴灑 4. 第一層面層噴塗厚度約 1mm 5. 第二層止滑層以噴點方式噴塗後用鋤刀鋤平以創造凹凸紋路及止滑效果，為求美觀不可以使用毛刷刷毛 6. 乾燥後將表面清理乾淨後塗佈 0.1L/m ² 之透明保護漆 5. 完成後須進行地坪養護，三日內不得行人，七日內不得行車
4. 標線	熱處理聚酯標線材	熱拌爐 標線車	1. 表面處理乾淨 2. 天候不良且明顯影響標線品質或地面潮濕時，均不得標繪標線 3. 施工時路面溫度限制，最低溫度 10℃，最高溫度 40℃ 4. 噴出之熱處理聚酯標線材料，其溫度應在 180~200℃ 之間 5. 標線寬度、厚度應符合圖說規定，並須均勻，不得有凹凸、龜裂、彎曲等缺陷 6. 鋪設最小厚度為 2mm
5. 完成			1. 表面平整無積水 2. 表面清潔 3. 設施穩固

表 三-8 鋼筋工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 依據設計圖，施工說明核算數量繪製結構體 每根鋼筋剪裁長度
2. 材料進場	鋼筋 鋼線網	裝卸用貨車 吊車	1. 幅射線檢驗報告，出場報告，取樣送驗 2. 材料須墊高儲放，加蓋帆布 3. 材料應維持清潔
3. 鋼筋加工	鋼筋	鋼筋加工機具	1. 裁切長度 2. 排列層次 3. 彎勾和錨定長度 4. 鋼筋架高，分類堆置
4. 鋼筋組立	鋼筋 鋼線網 鐵絲 墊塊	吊車	1. 鐵絲綁紮以防止鋼筋位移 2. 垂直鋼筋每點綁紮 3. 水平鋼筋小於 20cm 可跳隔綁紮 4. 保護層墊置妥善 5. 角隅補強筋妥善處理
5. 組立後檢查		皮尺	1. 號數及支數檢查 2. 確定排列層次，綁紮牢固 3. 間距與保護層須符合圖說規範 4. 錨定及彎勾長度，搭接位置及長度符合圖說 規定

表 三-9 模板工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 臨土側清水模、臨水側普通模。 2. 決定工法，模板應力分析及繪製施工圖送審核可據以施工。
2. 模板進場		裝卸用貨車 吊車	1. 注意板面結合間隙。 2. 角材尺寸、平直度及間距要符合規定。 3. 繫結器尺寸及種類要與圖說規範相符。 4. 各類材料分別堆放。
3. 放樣		經緯儀 水準儀 皮尺	1. 依施工放樣圖說。 2. 放樣尺寸高程及坡度須符合圖說規範。
4. 模板及支撐組立	鐵絲 墊塊	吊車	1. 構造物斷面尺寸須符合規定。 2. 牆模板之垂直精度與頂部水平精度要符合圖說規範。 3. 埋設物件及位置須符合規定。 4. 底部高程及平整度須符合圖說規範。 5. 模板內須維持清潔。 6. 支撐須為穩固狀態。 7. 繫結材料須符合規定(不可將不適合之材料埋入。 8. 須有脫模劑。
5. 拆模		L 型撬棒	1. 基礎牆版等各部份模板依規定期限拆除 2. 清理模板及塗油
6. 環境保護			1. 工地環境清潔檢查

表 三-10 混凝土工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 模板尺寸、高程、支撐及鋼筋組立須檢查 2. 接縫須妥善處理 3. 保護層應符合圖說規定 4. 施工機具及照明設備須備妥 5. 防護材料及安全措施須準備完善 6. 澆置前須清理及檢查
2. 拌合廠生產混凝土		拌合設備	1. 檢視配比設計資料 2. 供應量及運輸路況之規劃，避免供料中斷
3. 到場材料檢查	混凝土	預拌車 坍度測定儀 氯離子測定儀	1. 應進行坍度、氯離子試驗 2. 檢視出料單之出廠時間 3. 抗壓試體須製作
4. 混凝土澆置	混凝土	預拌車 洩槽 壓送車 振動棒	1. 澆置順序須妥善規劃及執行 2. 作業人員的分配及搗實須妥善 3. 澆置高度，厚度及水平控制須符合圖說規定 4. 施工縫妥善處理以維持接合面連結強度 5. 洩落高度超過 1.5m 須使用漏斗
5. 養護			1. 混凝土表面須保持濕潤 2. 視水泥強度調整養護時間
6. 拆模後混凝土表面修飾	水泥砂漿	砂磨機	1. 鐵線及繫結器須修剪或拆除 2. 保護層及蜂巢修補須用原配比修飾 3. 混凝土之平整度、垂直度及高程須依圖說進行修飾

表 三-11 照明工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	燈具設備 管材		1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 材料設備確認無受損
2. 放樣		噴漆	1. 依圖說規定確認各燈具位置
3. 開挖		挖土機	1. 確認開挖深度符合規範 2. 溝底不得有大土塊、石塊或浮土
4. 基座施作	基栓	搬運車	1. 確認施作完成高程 2. 確認接地線排涉及檢測。
4. 配管	PVC 電管材		1. 管道連線前要進行外觀檢查，發現有破損、裂痕、明顯變形、顏色不統一等異常現象的管道必須立即更換，並加以標記另行保管。 2. 各管連線塗膠之前管口內外管壁均應十分清潔、乾燥，連線管件亦同 3. 完成配管後埋設警示帶
5. 管溝回填		挖土機	1. 回填高度符合圖說規範 2. 如溝槽的土質較差，如：岩石結構或礫石較多等，需外運沙或細土回填
6. 燈具安裝	燈具設備		1. 安裝完成後確認穩固 2. 通電測試，是否有燈具故障未亮

表 三-12 鍍鋅鋼網圍籬工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	鍍鋅鋼網圍籬	吊卡車	形式、材料應依圖說。 支架設立依施工圖說。
2. 基座確認	水平儀 水準儀	噴漆	1. 依圖說規定確認點位位置及尺寸
4. 組立完成			1. 完成後完整、穩固

表 三-13 植栽工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 樹種須確認並檢視出廠報告 2. 土壤肥料等材料要求須符合圖說規範 3. 固定材料及水源須符合圖說
2. 現地整理	肥料，鐵件	挖土機	1. 排水坡度整理須符合圖說 2. 現地依圖說規範整平壓實
3. 植物搬運進場	契約內規定之植物	裝卸用貨車	1. 運輸保護措施 2. 裝卸保護措施
4. 植物種植	契約內規定之植物	裝卸用貨車	1. 種植的位置，尺寸，深度及密度需符合契約圖說規定。 2. 補植的時機與數量需符合契約圖說規定。
5. 養護與補植	肥料 防病蟲害之藥品 補植材料	灑水設備 割草機 農藥機具	1. 澆水養護並施追肥 2. 病蟲害防治 3. 清除雜草 4. 修剪

表 三-14 兒童遊戲場設備工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 依據設計圖、型錄，施工說明核算數量 2. 材料設備確認無受損
2. 基礎施作	鋼筋 混凝土 螺栓	運送車	1. 基礎面雜物須清除乾淨且整平壓實 2. 確認結構尺寸(±5%) 3. 預埋件穩固
3. 主結構施作	兒童遊戲場設備	貨車 電動螺絲起子	1. 基礎深度與範圍符合圖說 2. 注意設置方向、高度與垂直度 3. 烤漆與送審核定相同 4. 完成面無變形掉漆 5. 核對設計圖說 6. 完成面正直無歪斜、穩固無鬆動
4. 完成			1. 施作完成後，應立即清理鋪面表面 2. 完成面乾淨整潔，設施物穩固無鬆動 3. 辦理遊戲場檢驗

表 三-15 預鑄路緣石工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 材料設備確認無受損 3. 基準點與高程點確認
2. 底層/基礎施作		平路機 挖土機 振動輾壓機	1. 路面雜物須清除乾淨 2. 路面須整平壓實 3. 如有洞穴或不平須填平夯實
3. 緣石施作	緣石 收邊材	拖板車 木槌 橡皮榔頭	1. 基礎深度與範圍符合圖說 2. 應儘可能使用整塊界石之單元代替切割單元 3. 緣石鋪設時須先以木槌或橡皮榔頭輕擊表面，使磚與襯墊砂或水泥砂漿緊密接合，同時調整高度，若敲擊聲響有異時，即表示仍未緊密接合，須立即掀開重新鋪貼 4. 剛鋪設完成未乾漿之地面，應設置圍籬防止人車進入，維持鋪面完成面之平整 5. 收邊鋼板支撐鋼筋數量充足並穩固
4. 完成			1. 施作完成後，應立即清理鋪面表面 2. 已安裝完成之收邊材表面應保持清潔 3. 完成面正直無歪斜、穩固無鬆動

表 三-16 鋪面磚(高壓)，警示磚、高壓混凝土磚工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 基準點與高程點確認
2. 材料進場	磚材	裝卸用貨車 吊車	1. 規格、尺寸 2. 出廠或進口證明 3. 材料試驗證明
3. 鋪面磚鋪設	警示磚、高 壓 混 凝 土 磚	拖板車 木槌 橡皮榔頭	1. 應儘可能使用整塊高壓地磚之單元代替切割單元 2. 高壓地磚鋪設時須先以木槌或橡皮榔頭輕擊表面，使磚與襯墊砂層(乾式施工法)或水泥砂漿(濕式施工法)緊密接合(即滿砂漿)，同時調整高度，若敲擊聲響有異時，即表示仍未緊密接合，須立即掀開重新鋪貼 3. 由一端開始鋪設，磚縫不得大於 3mm，施工時並同時考量完成後洩水坡度 4. 面層鋪設後應以乾砂填縫，因人行道轉角鋪面變化，以致磚縫大於 6 mm以上者，則以砂漿填縫 5. 剛鋪設完成未乾漿之地面，應設置圍籬防止人車進入，維持鋪面完成面之平整
4. 完成			1. 施作完成後，應立即清理鋪面表面 2. 已安裝完成之混凝土磚表面應保持清潔，且不得有龜裂、碎片、破損、或其他缺陷

表 三-17 磨石子工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 將混凝土表面異物清除 2. 控制粉刷厚度 3. 減少粉刷料過量吸水 4. 依設計圖或工程司之指示設置工作縫及伸縮縫
2. 放樣	木樁	經緯儀 水準儀	1. 測定施工範圍 2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正
3. 水泥砂漿製作	水泥 石粒		1. 水泥與砂比例 1:3 與適量石粒、水拌合 2. 應於接合不漏水之容器內 3. 拌合時間不少於 3 分鐘
4. 底層處理		鏟刀 木尺	1. 下料需均勻、厚度一致 2. 鏟刀拍打鏟平施壓
5. 磨石子施工		鏟刀	1. 先以鏟刀用力均勻壓平泥料，並儘量避免產生鏟刀痕，並自高處向低處施工 2. 水泥碎石料內禁止摻雜其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料其用量為水泥量之 15%~20% 3. 磨石子面於磨光後，須用清水將表面洗掃潔淨，俟磨石子面乾透後打蠟 2 次至表面平整光滑
6. 面層	礫石	貨車	1. 礫石乾淨無雜質
7. 完成			1. 施作完成後，應立即清理鋪面表面 2. 完成面乾淨整潔，設施物穩固無鬆動 3. 辦理遊戲場檢驗

表 三-18 抵石子工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 將混凝土表面異物清除 2. 控制粉刷厚度 3. 減少粉刷料過量吸水 4. 依設計圖或工程司之指示設置工作縫及伸縮縫
2. 放樣	木樁	經緯儀 水準儀	1. 測定施工範圍 2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正
3. 水泥砂漿製作	水泥 石粒		1. 水泥與砂比例 1:3 與適量石粒、水拌合 2. 應於接合不漏水之容器內 3. 拌合時間不少於 3 分鐘
4. 底層處理		鏟刀 木尺	1. 下料需均勻、厚度一致 2. 鏟刀拍打鏟平施壓
5. 抵石子施工		鏟刀 抵石海绵塊	1. 底層乾透後，應先以鏟刀用力均勻壓平，並儘量避免產生鏟刀痕 2. 水泥初凝後，即以乾淨之海绵塊抵洗表面，完成面應洗刷清潔 3. 自高處向低處施工 4. 水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料 5. 抵石子之面積過大時，應分格施工，分格之大小應依工程司指示辦理 6. 牆面如須留置螺絲及其他洞孔時，應於施工前預先埋設，不得在抵石子完成後再行鑿補 7. 分格以 9mm 檜木條，先釘在已完成底度之牆面上
6. 後續工作			整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清

表 三-19 彈性無縫鋪面工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 材料進場	彈性地墊	裝卸用貨車	1. 材料進場需墊高至少 10cm。
2. 放樣及組裝	水平儀、水線 彈性地墊		1. 表面鏟平再均勻鋪貼過 2. 膠結需掌握時間放置，否則逾時後乾枯，無法膠結 3. 鋪貼後圈圍禁止入內，形成保護範圍
3. 完成			1. 施工表面應均勻清潔 2. 周邊環境整理清掃 3. 養護期間至少需 28 天才可開放使用

表 三-20 地坪工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 模板尺寸、高程、支撐及鋼筋組立須檢查 2. 接縫須妥善處理 3. 保護層應符合圖說規定 4. 施工機具及照明設備須備妥 5. 防護材料及安全措施須準備完善 6. 澆置前須清理及檢查
2. 拌合廠生產混凝土		拌合設備	1. 檢視配比設計資料 2. 供應量及運輸路況之規劃，避免供料中斷
3. 到場材料檢查	混凝土	預拌車 坍度測定儀 氯離子測定儀	1. 應進行坍度、氯離子試驗 2. 檢視出料單之出廠時間 3. 抗壓試體須製作
4. 混凝土澆置	混凝土	預拌車 洩槽 壓送車 振動棒	1. 澆置順序須妥善規劃及執行 2. 作業人員的分配及搗實須妥善 3. 澆置高度，厚度及水平控制須符合圖說規定 4. 施工縫妥善處理以維持接合面連結強度 5. 洩落高度超過 1.5m 須使用漏斗
5. 養護			1. 混凝土表面須保持濕潤 2. 視水泥強度調整養護時間
6. 拆模後混凝土表面修飾	水泥砂漿	砂磨機	1. 保護層及蜂巢修補須用原配比修飾 2. 混凝土之平整度、垂直度及高程須依圖說進行修飾

表 三-21 磁磚工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 基準點與高程點確認
2. 材料進場	磚材	裝卸用貨車 吊車	1. 規格、尺寸 2. 出廠或進口證明 3. 材料試驗證明
3. 磁磚鋪設	磚材	拖板車 木槌 橡皮榔頭	1. 鋪貼面須保持水平 3 米直尺份一方向容許誤差為 $\pm 3\text{mm}$ 2. 輕括磁磚，檢驗其是否中空 3. 施作完成 4. 粉刷平整度 5. 鋪貼前清潔及濕潤 6. 灰縫之處理需與製作之樣品相同 7. 表面須清潔光滑
4. 完成			1. 施作完成後，應立即清理鋪面表面 2. 已安裝完成之表面應保持清潔，且不得有龜裂、碎片、破損、或其他缺陷

表 三-22 木作工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 依圖面造型排列配置 2. 木料尺寸規格須符合圖說規範 3. 各五金配件計算 4. 現地須整理乾淨
2. 材料進場	木料 五金材料 繫結鐵件	裝卸用貨車	1. 木料堆置儲放須符合保護措施規定 2. 依規定施作防腐處理
3. 安裝	木料 五金材料 防腐塗料	木工機具 裁切組裝工具 角尺 水準器 吊車	1. 施工面清潔並乾燥 2. 依施工大樣圖施作 3. 須避免彎曲變形及接合不準確等問題 4. 若木製品與混凝土或污工面有直接接觸時，要先塗佈適當的防腐塗料 5. 高架作業人員的安全措施完善 6. 需注意水平與垂直度 7. 鐵件的繫結與材質需符合規定並依圖說規範要求 8. 須塗保護漆 9. 原有防腐但若遭破壞，須再做二次防腐

表 三-23 排水工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	管材		1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 材料設備確認無受損
2. 放樣	水平儀 RTK	噴漆	1. 依圖說規定確認各點位位置
3. 開挖		挖土機	1. 確認開挖深度符合規範 2. 溝底不得有大土塊、石塊或浮土
4. 涵管設置		挖土機 吊車	1. 確認高層符合排水需求 2. 底部鋪設墊層。
5. 配管	PVC 水管材		1. 管道連線前要進行外觀檢查，發現有破損、裂痕、明顯變形、顏色不統一等異常現象的管道必須立即更換，並加以標記另行保管。 2. 各管連線塗膠之前管口內外管壁均應十分清潔、乾燥，連線管件亦同 3. 完成配管後埋設警示帶 4. 管兩側回填高度應相同。管底下空隙應完全填滿，回填材料應壓實。 5. 管頂加築至[30cm]厚之路堤，並應於引進任何荷重通過管頂前充分壓實之。
5. 管溝回填		挖土機	1. 回填高度符合圖說規範 2. 如溝槽的土質較差，如：岩石結構或礫石較多等，需外運沙或細土回填

表 三-24 假設工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 依據 2. 材料設備確認無受損
2. 施工用臨時水電設施			1. 基礎面雜物須清除乾淨且整平壓實 2. 確認結構尺寸($\pm 5\%$) 3. 施工動線確認
3. 結構件裝設	工務所、施工圍籬、洗車設備	吊車	1. 注意設置方向、高度與垂直度 2. 完成面正直無變形歪斜、掉漆 3. 穩固無鬆動且乾淨
4. 完成	工程標示牌		1. 施作完成後，應立即清理鋪面表面

表 三-25 電力配線工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	設備管材		1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 材料設備確認無受損
2. 放樣		噴漆	1. 依圖說規定確認各設備位置
3. 開挖		挖土機	1. 確認開挖深度符合規範 2. 溝底不得有大土塊、石塊或浮土
4. 基座施作	基栓	搬運車	1. 確認施作完成高程
4. 配管	PVC 電管材		1. 管道連線前要進行外觀檢查，發現有破損、裂痕、明顯變形、顏色不統一等異常現象的管道必須立即更換，並加以標記另行保管。 2. 各管連線塗膠之前管口內外管壁均應十分清潔、乾燥，連線管件亦同 3. 完成配管後埋設警示帶
5. 管溝回填		挖土機	1. 回填高度符合圖說規範 2. 如溝槽的土質較差，如：岩石結構或礫石較多等，需外運沙或細土回填

表 三-26 器具設備工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
------	------	------	------

1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 依據設計圖、型錄，施工說明核算數量 2. 材料設備確認無受損
2. 基礎施作	鋼筋 混凝土 螺栓	運送車	1. 基礎面雜物須清除乾淨且整平壓實 2. 確認結構尺寸(±5%) 3. 預埋件穩固
3. 主結構施作	器具設備	貨車 吊卡	1. 基礎深度與範圍符合圖說 2. 注意設置方向、高度與垂直度 3. 完成面正直無歪斜、穩固無鬆動
4. 完成			1. 施作完成後，應立即清理鋪面表面 2. 完成面乾淨整潔，設施物穩固無鬆動 3. 辦理遊戲場檢驗

表 三-27 濕式壓花地坪工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 材料進場	底漆、面漆 紙模或模具	裝卸用貨車	1. 材料進場需墊高至少 10cm。 2. 樣式及數量確認是否與圖說相符
2. 放樣及地坪施工	水平儀、水線 底漆 面漆 紙模或模具	粉光機 鏟刀	1. 依圖說規定確認點位位置 2. 基礎面養護日數足夠無積水問題 3. 雨天時不得施作 4. 混凝土初凝前，表面鏟平再均勻撒佈彩色壓花料，壓花料能滲入混凝土層 5. 初凝後再撒佈彩色脫模劑，需掌握時間放置，否則逾時後混凝土乾枯，無法壓印 6. 壓印 7 天後以高壓水沖洗，噴上透明封面劑，形成保護層
3. 完成			1. 施工表面應均勻清潔 2. 周邊環境整理清掃

第四章品質管理標準

一、品質管理標準訂定

(一)品質管理標準訂定

品質管理標準訂定內容至少包括：

1. 作業流程：分項工程之施工順序。
2. 管理要項：針對各施工階段，列出管理項目、管理標準、檢查時機、檢查方法、檢查頻率與不符合之處理方式。
3. 管理紀錄：施工中所使用之表單。
4. 相關法規施工規範及圖說之標準。

(二)品質管理標準說明

1. 品質管理標準是將施工過程中之管理重點，作系統性之整理，使施工團隊成員，可依據各項工作之品質管理標準執行及管制。
2. 本章內應列出擬製作之品質管理標準項目，至於詳細品質管理標準內容訂定，得依契約規定或視工程需要，併入各分項施工計畫內，以使所有施工人員充分瞭解各項作業之品質規定。
3. 「管理標準」、「檢查頻率」之訂定，應依契約規定量化；「檢查時機」需清楚說明時間點，對於自主檢查時點與檢驗停留點，應清楚區分；「檢查方法」則需說明檢驗之工具；另在「管理紀錄」係執行該項檢驗所使用之品質管制文件或符合管理標準之相關證明文件，如施工圖、相片、試驗報告等。
4. 品質管理標準應避免下列情形：
 - (1) 「管理項目」欠具體，以致管理標準無法精確訂定。
 - (2) 「管理標準」未量化。
 - (3) 「檢查時機」與「頻率」混淆。
 - (4) 「不符合之處理」方式不切實際，或文字說明過於含糊。
 - (5) 管理標準未說明管理紀錄方式或符合管理標準之相關證明。
 - (6) 管理紀錄文件，與管理項目不符。

二、應用表單

本工程主要項目施工品質管理標準如表 4-1 所示：

(施工品質管理標準如有不足部分，施工期間提送分項計畫補充)

表 四-1 主要項目施工品質管理標準一覽表

項目	品質管理標準名稱	備註
一、	交通臨時安全措施施工品質管理標準表	表 4-2
二、	土方管制施工品質管理標準表(1/2)	表 4-3
三、	土方管制施工品質管理標準表(2/2)	表 4-4
四、	道路土石方工程施工品質管理標準表	表 4-5
五、	測量工程施工品質管理標準表	表 4-6
六、	瀝青混凝土鋪面工程施工品質管理標準表	表 4-7
七、	鋼筋工程施工品質管理標準表	表 4-8
八、	模板工程施工品質管理標準表(1/2)	表 4-9
九、	模板工程施工品質管理標準表(2/2)	表 4-10
十、	混凝土工程施工品質管理標準表	表 4-11
十一、	照明工程施工品質管理標準表	表 4-12
十二、	鍍鋅鋼網圍籬工程施工品質管理標準表	表 4-13
十三、	植栽工程施工品質管理標準表表	表 4-14
十四、	兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(一)	表 4-15
十五、	兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(二)	表 4-16
十六、	兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(三)	表 4-17
十七、	兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(四)	表 4-18
十八、	兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(五)	表 4-19
十九、	兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(六)	表 4-20
二十、	兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(七)	表 4-21
二十一、	預鑄路緣石工程施工品質管理標準表	表 4-22
二十二、	鋪面磚鋪設工程施工品質管理標準表	表 4-23
二十三、	磨石子工程施工品質管理標準表	表 4-24
二十四、	抵石子工程施工品質管理標準表	表 4-25
二十五、	彈性無縫鋪面工程施工品質管理標準表	表 4-26

二十六、	地坪工程施工品質管理標準表	表 4-27
二十七、	地(磁)磚工程施工品質管理標準表(1/2)	表 4-28
二十八、	地(磁)磚工程施工品質管理標準表(2/2)	表 4-29
二十九、	木作工程施工品質管理標準表表	表 4-30
三十、	排水工程施工品質管理標準表	表 4-31
三十一、	假設工程品質管理標準(1/2)	表 4-32
三十二、	假設工程品質管理標準(2/2)	表 4-33
三十三、	電力工程品質管理標準	表 4-34
三十四、	濕式壓花地坪工程品質管理標準	表 4-35
三十五、	汛期防災減災施工品質管理標準表(1/2)	表 4-36
三十六、	汛期防災減災施工品質管理標準表(2/2)	表 4-37

表 四-2 交通臨時安全措施工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施 工 前	設施及安裝	交通維持計畫	依現場路況調查繪製設置平面圖	施工前	依規定辦理	一次	審查合格文件或會勘紀錄	重新調查提報送審	
		安全圍籬、警告標誌、指示牌、公告牌、紅燈或閃光紅燈、紅旗等設備	依核定交通維持計畫實施	裝置時	目視	一次	照片 交通臨時安全措施自主檢查表	糾正改善	
施 工 中	維護	巡視維護	專人巡視遺失損壞修復補足	施設後	目視	隨時	交通臨時安全措施自主檢查表	修護補足	
	清潔	路面清潔	路面不得留有污泥砂石雜物	施工時 施工後	目視	隨時	照片 交通臨時安全措施自主檢查表	重新清理	

表 四-3 土方管制施工工程品質管理標準表(1/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施工前	測量與放樣	原地面線	是否與設計圖相符	施工前	縱、橫斷面水準測量	全面	測量資料	不合格改善	
		必要樁位與高程之檢測及保護	以混凝土樁或鋼釘施作保護						
		邊界樁放樣	依圖說規定	施工前	經緯儀測量	分區檢查	測量資料紀錄 拍照存證	不合格改善	
	交通安全維護	安全標誌號誌設置	依圖說規定佈設						
施工中	基礎開挖	地表雜物與草木清除與掘除	雜草、樹木先行清理乾淨	施工中	目視	分區檢查	施工日誌 土方自主檢查表	不合格改善	
		開挖順序	自上而下依序開挖						
施工後	邊界整理	地表清除	凡在原路面以上坍方，須一律清除	施設後	目視	分區檢查	施工日誌 土方自主檢查表	修護補足	
		邊界之修整	依圖說規定						

表 四-4 土方管制施工抽查標準(2/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施工前	材料	填方材料	應與不適用填方之廢土分開不得混合	施工時	目視	隨時	運土計畫	糾正改善	
施工中	餘土處理	不適用材料	依規範辦理	施工時	目視	隨時	運土計畫	違規棄土者將依契約規定扣帳，停止估驗，限期清除違規現場，回復原狀	
		餘方級配處理	依計畫暫行堆置 合法砂石商收受證明	施工時	目視	隨時	棄土計畫	除該部份挖土及運棄費用不予計價外另依契約有關規定懲處	
施工後	維護	巡視維護	專人巡視遺失損壞修復補足	施設後	目視	隨時	施工日誌	修護補足	

表 四-5 道路土石方工程施工工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前	滾壓	壓路機重量及滾壓方法	整形後以 10 公噸以上之三輪壓路機或 6 公噸以上之震動壓路機。	施工前	過地磅	進場前	自主檢查表	更換合格之滾壓機具	
	路床滾壓前	「障礙物拆遷」及「殘餘物處理」或「路床整理」。	路床範圍內之樹木、雜草、樹根全部予以清除，挖除深度至少達設計面 30 cm 以下，填高在 30 cm 以上者不必挖除。	施作時	目視 儀器測量	隨時	自主檢查表	再度挖除	
施工中	路床滾壓	挖填至設計標高及路拱	挖填方應用壓路機滾壓至規定密度。至少每 100 0m2 作密度試驗一次。	達到密度時	作現場密度試驗	每 1000 m2 一次	試驗報告	再行滾壓	
	填方分層壓實	每層厚度	鬆方厚不得超過 30 cm。	施作時	用尺量	隨時	自主檢查表	超過部份挖除再行滾壓。	
	填方地段及挖方	壓實密度	不得小於 AASHTO 標準壓實試驗法(錘重 5.5 磅，錘落高度 12 吋，層數三層)之最大密度 90 %，填方頂層 75 cm 深度範圍應達 95%。	達到密度時	作試驗	每 100 m2 一次	試驗報告	如第一次試驗不合格，而需再做試驗時所需試驗費用均由承包商負擔。	

表 四-6 測量工程施工工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施工前	現地測量及檢核	導線網佈設及檢測	精度 $\leq 1/10000$ 水準閉合差 $\leq \sqrt{k}$	施工前	水準儀 經緯儀	每兩個月	自主檢查表	修正	
	現地測量及檢核	構造物座標高程檢算	依合約圖說規範	施工前	計算	一次	自主檢查表	重新檢算	
施工中	現地測量及檢核	座標放樣	± 1 cm	施工時	全測站	各單元 (依施工計畫)	自主檢查表	修正	
	現地測量及檢核	高程放樣	± 1 cm	施工時	水準儀 經緯儀	各單元 (依施工計畫)	自主檢查表	修正	
施工後	現地測量及檢核	座標放樣	± 2 cm	施工後	全測站	各單元 (依施工計畫)	自主檢查表	改正	
	現地測量及檢核	高程放樣	± 1 cm。	施工後	水準儀 經緯儀	各單元 (依施工計畫)	自主檢查表	改正	

表 四-7 瀝青混凝土鋪面工程施工工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前	整理與清掃	路基面平整度、坡度及清潔度	路基面(級配)平整，一切浮鬆材料、塵土均應清除，坑洞填平滾壓	瀝青混凝土鋪設前	目視	必要時檢驗	自主檢查表	改正	
施工中	瀝青混合料	密度試驗	須執行馬歇爾密度試驗	鋪築前	取樣試驗	每批混合料	試驗報告	取樣進行試驗	
		鋪築時之溫度	不得低於 120℃	鋪築前	溫度計	必要時檢驗	自主檢查表	不得使用	
		滾壓機具	依圖說規定採用合格及合適之滾壓機具	施工中	目視	必要時檢驗	自主檢查表	更換合格之滾壓機具	
		滾壓次序	由車道外側邊緣開始逐漸向路中心滾壓	施工中	目視	必要時檢驗	自主檢查表	改正	
		壓路機與鋪築機之距離	壓路機應緊隨鋪築機之後，其距離不超過 60 m	施工中	目視	必要時檢驗	自主檢查表	改正	
		邊緣未壓到之處	以夯實機充分夯實	施工中	目視	必要時檢驗	自主檢查表	改正	
		瀝青含量和粒料級配	AASHTO T164 或 ASTM D6307 AASHTO T30	瀝青混凝土卸料時	取樣試驗	瀝青混凝土鋪於路面後滾壓前	試驗報告	依合約規定辦理	
施工後	檢驗	壓實度	CNS 12390	滾壓完成後	馬歇爾試驗	每 5,000 m ² 檢驗一點	依圖說規定處理	重新滾壓	
		平整度	標準差不大於 3.4 mm	滾壓完成後	3 m 直規或平坦儀	每 200 m 檢驗一點	自主檢查表	重新滾壓	

表 四-8 鋼筋工程施工品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施 工 前	材料進場	鋼筋輻射檢驗	無輻射證明書或試驗報告	卸貨前	證明書或報告	依圖說規定或每批	合格證明書或試驗報告	補提送合格證明書	
		進場鋼筋之材質	竹節鋼筋符合 CNS 560 A2006 熱軋鋼筋	卸貨時	確認廠牌標記，材質	依圖說規定或每批	出廠證明書材料試驗報告	不得進場	
		成品之堆置方法和狀態	以木條或鋼製品與土壤污染物墊高隔離並覆蓋避免污染	卸貨時堆置期間	目視	隨時檢查	自主檢查表	加強堆置場所保養	
	鋼筋裁切及加工	裁切長度	依圖說規定	開始加工時或組立前	以尺丈量，目視	必要時檢驗	自主檢查表	重新裁切	
施 工 中	鋼筋組立	鋼筋號數、保護層厚度、鋼筋排列及間距、搭接長度	如設計圖說	組立時	以尺丈量，目視	必要時檢驗	自主檢查表	進行缺失改善	
		鋼筋保護層墊塊、間隔器等	以相同強度之混凝土墊塊將鋼筋與模板間隔	混凝土澆置前	目視	隨時檢查			
混凝土澆置前檢驗		各部鋼筋組立狀態	確保鋼筋位置不得紊亂	混凝土澆置前	目視	必要時檢驗	自主檢查表	進行缺失改善	
		鋼筋表面清潔	鋼筋表面不得有汙染	混凝土澆置前	目視	隨時檢查	自主檢查表	進行缺失改善	

表 四-9 模板工程施工品質管理標準表(1/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施工前	材料進場	模板之規格、尺寸、數量	核對訂單內容，避免存放日光直射處	卸料時、儲存保管中	目視	依圖說規定或每批	自主檢查表	更換材料、護蓋帆布、蓆等	
		儲存方法	以木條或鋼製品與土壤污染物墊高隔離並覆蓋避免污染	卸貨時堆置期間	目視	隨時檢查	自主檢查表	加強堆置場所保養	
		鋼管支柱規格尺寸	依施工圖規定，符合CNS5644 規定	卸料時	目視	依圖說規定或每批	自主檢查表	更換材料	
		緊結器、繫結鐵絲、角材、鐵擋材、埋置物等五金配件	查對送貨單內容，剔除不良品	卸料時	目視	依圖說規定或每批	自主檢查表	更換材料	
施工中	加工及組立	放樣	與基準墨線校核	彈墨線時	經緯儀 水準儀 尺量	必要時檢驗	自主檢查表	重新校核放樣	
		斷面尺寸	依設計圖與施工圖	加工組立時	尺量、目視	必要時檢驗	自主檢查表	重新加工與組立	
		模板組立位置	相對與墨線符合	組立時	尺量，目視	必要時檢驗	自主檢查表	修正	
		模板內之清潔狀況	無木片、木屑等雜物	全部封模前	目視	必要時檢驗	自主檢查表	將雜物清潔掃除再封模	
		爆模或漏漿	無可目視之漏漿現象	澆置中	目視	必要時檢驗	自主檢查表	補救處置	

表 四-10 模板工程施工品質管理標準表(2/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施 工 中	支撐架設	木支撐搭接補強	檢視補強處合乎規定否	加工時	目視	必要時檢驗	自主檢查表	改正	
		支撐穩固狀態	底部須確實固定	組立時、組立後	目視、尺量	必要時檢驗	自主檢查表	加強	
	預埋構件及開口	埋設構件	依設計圖說規定埋設	組立時	目視	必要時檢驗	自主檢查表	修正	
		開口位置及尺寸	依設計圖與施工圖	加工組立時	目視、尺量	必要時檢驗	自主檢查表	重新加工與組立	
	拆模作業	模板拆模時間	依施工規範	模板拆除前	查對澆置日期	必要時檢驗	自主檢查表	延長支撐拆除時間	
混凝土澆置前檢驗		各部模板組立狀態	確保模板位置穩固	混凝土澆置前	目視	必要時檢驗	自主檢查表	進行缺失改善	
		模板表面清潔	模板表面不得有汙染	混凝土澆置前	目視	隨時檢查	自主檢查表	進行缺失改善	

表 四-11 混凝土工程施工工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施工前	材料	粗細骨材	承包商應提出產地比重磨耗率篩分析飽和表面乾重及每立方公尺所用之重量	施工前	送 TAF 認證合格試驗機構試驗	進場時	試驗報告	運離更換	
		摻料	如須加摻料必須說明摻料種別明稱及摻合量	施工前	送 TAF 認證合格試驗機構試驗	一次	試驗報告	運離更換	
施工中	澆置	輸送	不得以無攪拌設備之車輛輸送途中不得加水自出廠至澆置完成不得超過 90 分鐘	澆置前	目視發車單	一次	證明憑單	運離工地不予澆置	
	取樣檢驗	傾卸	每次澆置間隔不超過 20 分鐘為原則，並依工地工程司指示做塌度試驗	施工前	查核證明坍度筒	傾卸前一次	證明憑單、照片	運離工地	
		取樣	依照 CNS 1174 A 3038 並製作標準試體每種混凝土每 100 m ³ 至少試驗一次並每天至少試驗一次	澆置時	標準試體模	規定次數	自主檢查表	進行缺失改善	
施工後	養治	濕養	依 CNS 1231 A 3044 製作，試樣之濕養由承包商負責	養護時	目視	隨時	自主檢查表	進行缺失改善	

表 四-12 照明工程施工品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施 工 前	材料進場	廣場照明設備，矮柱燈 燈具 投光燈 路燈燈桿	依設計圖規範	進場前	依施工說明書及設計圖	每 100 盞一次	自主檢查表	退貨	
施 工 中	施工方法	管溝開挖及回填 配管導線穿線及連接基礎 燈桿及燈具安裝線路絕緣	依設計圖規範	施工時	依施工說明書及設計圖	各單元 (配電箱迴路)	自主檢查表	修正	
施 工 後	照明測試	連續性 接地測試 高阻計絕緣電阻試驗 照明迴路妥適性 功能測試	結合相通良好 電阻不得大於 50Ω 500 V 測試絕緣電阻不得小於 10 MΩ 符合圖說	施工後	依施工說明書第 16256 章	逐一測試	自主檢查表	更新	

表 四-13 鍍鋅鋼網圍籬工程施工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
施 工 前	材料進場	1)5mm ϕ *50*150 鍍鋅 鋼網(含外 2)2 1/2" 層靜 電粉體烤漆) (76mm)*2m m 鍍鋅鋼管	施工說明: 一.本項工程採用金屬製品(除另有標示 外)使用鍍鋅材質. 二.五金部分:管材接合處為螺栓固定且 須加華司.其材質為鍍鋅材質. 三. 鍍鋅材切割處須平整,不得有破裂毀 損,危及結構安全. 四.施工前.廠商應須先提送樣品及材料 測試報告.經甲方確認後.材料方可進場 施作. 五.材料到達現場應與樣品相符.經甲方. 監造及設計單位認可後方可施作. 六.圖說及補充及施工說明不明處.由監 造工程司指示施工之. 七.形式由監造工程司指定.	進場前	依施工規範	每批一次	自主檢查表	退貨	
施 工 中	施工方法	1)2 1/2" 層靜 電粉體烤漆) (76mm)*2m m 鍍鋅鋼管	1.立柱鍍鋅鋼管安裝(間距)	施工中	施工中量測	每單元 (依圖說規範)	自主檢查表	重作	
施 工 後	安裝及固 定	整體	穩固堅實符合圖說規範	施工後	施工後量測	每單元 (依圖說規範)	自主檢查表	重作	

表 四-14 植栽工程施工品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
種植前	材料確認	樹徑寬度	依圖說契約規定	進場前	送審資料、目視、尺量	目視、必要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
		樹種高度	依圖說契約規定	進場前	送審資料、目視、尺量	目視、必要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
		樹冠寬度	依圖說契約規定	進場前	送審資料、目視、尺量	目視、必要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
		樹根高度	依圖說契約規定	進場前	送審資料、目視、尺量	目視、必要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
		幅寬、品種、規格	依圖說契約規定	進場前	送審資料、目視、尺量	目視、必要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
種植中	樹種確認	數量位置確認	需符合設計圖	植樹前	送審資料、目視、尺量	目視、必要時丈量	退貨	檢查紀錄表	
		植穴確認	【挖鬆表土無雜物】需符合設計圖 【有機與土壤比例】1:3	植樹中	送審資料、目視、尺量	目視、必要時丈量	退貨	檢查紀錄表	
		基肥材料確認	需符合設計圖	植樹中	目視	全面	改善	檢查紀錄表	
種植完成	養護及補植	支撐架確認	需符合設計圖	植樹中	目視	全面	改善	檢查紀錄表	
		灑水養生	全面澆灌	植樹後	現場檢查	全面	改善	檢查紀錄表	
		追肥及除草	穩固不動搖依契約圖說養護期間天	植樹後	目視、手搖	每處全面	重新固定改善	檢查紀錄表	
		病蟲害防治	發現病蟲害時立即採用經政府許可之農藥進行	植樹後	目視	隨時	改善	檢查紀錄表	
		補植	補植未存活之植栽	植樹後養護中	養護中	全面	補植	檢查紀錄表	

表 四-15 兒童遊戲場設備工程施工工程品質管理標準表(一)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施 工 前		划船器 <u>1 座</u>	材料送審施否已核定 依設計圖說 有無彎曲變形。 塑膠保護膜。	施工前	送審資料、 目視、尺量	目視、必要 時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
		雙人浪板器 <u>1 座</u>							
		雙人漫步機 <u>1 座</u>							
施 工 中		金屬支柱	鍍鋅鋼管 (表面鍍鋅、烤漆處理)	施工中	游標卡尺、 目視	每座施工 中/後	自主檢查 表	要求改正	
		躺板、椅板	線形低密度聚乙烯 LLDPE						
		210kgf/cm ² 混凝土	表面清理						
施 工 後		結構穩固	堅固	施工後	目視	隨時	自主檢查 表	進行缺失改善	

表 四-16 兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(二)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前		高中低單槓 230-200-170 cm <u>1座</u>	材料送審施否已核定 依設計圖說 有無彎曲變形。 塑膠保護膜。	施工前	送審資料、目視、尺量	目視、必要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
施工中		單槓	φ3.3cm 鍍鋅鋼管 表面粉體塗裝	施工中	鋼捲尺、游標卡尺	每座施工中/後	自主檢查表	要求改正	
		支柱	φ5"鋁合金鋼管 表面粉體塗裝						
		210kgf/cm ² 混凝土	表面清理						
施工後		結構穩固	堅固	施工後	目視	隨時	自主檢查表	進行缺失改善	

表 四-17 兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(三)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前		複合式鞦韆	材料送審施否已核定 依設計圖說 有無彎曲變形。 塑膠保護膜。	施工前	送審資料、 目視、尺量	目視、必要 時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
施工中		鞦韆座椅	鳥巢式、皮帶式	施工中	鋼捲尺	每座施工中 /後	自主檢查表	要求改正	
		支樑 橫樑	φ12.7cm 鋁合金管、鍍鋅鋼管 表面粉體塗裝處理						
		夾環 T型管夾 鍊條 鋼索	鑄鐵(電鍍防鏽) 鑄鐵(電鍍防鏽)表面粉體塗裝 度鋅鍊條、表面披覆PVC φ16mmPA 六股鋼索						
		210kgf/cm ² 混凝土	表面清理						
施工後		結構穩固	堅固	施工後	目視	隨時	自主檢查表	進行缺失改善	

表 四-18 兒童遊戲場設備工程施工程品質管理標準表(四)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前		彈跳床 L150*W150cm 1座	材料送審施否已核定 依設計圖說 有無彎曲變形。 塑膠保護膜。	施工前	送審資 料、目 視、尺量	目視、必 要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
施工中		彈跳模	6mm 厚 EP(乙烯-丙烯) 傳輸帶 聚酯聚醯胺織物製成	施工中	鋼捲尺、 目視、游 標卡尺	每座施工 中/後	自主檢查 表	要求改正	
		彈簧	φ3mm 不鏽鋼製品						
		邊框護線條	內芯 3mm 熱浸鍍鋅鋼板						
		底部框架	3mm 厚度碳鋼 S235						
		210kgf/cm ² 混 凝土	表面清理						
施工後		結構穩固	堅固	施工後	目視	隨時	自主檢查 表	進行缺失改善	

表 四-19 兒童遊戲場設備工程施工程品質管理標準表(五)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前		極限旋轉飛輪 1 座	材料送審施否已核定 依設計圖說 有無彎曲變形。 塑膠保護膜。	施工前	送 審 資 料 、 目 視 、 尺 量	目視、必 要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
施工中		轉盤	外環 $\phi 208\text{mm}$ 傾斜 10° 低密度聚乙烯	施工中	目視、尺 量	每座施工 中/後	自主檢查 表	要求改正	
		支柱	熱浸鍍鋅鋼管						
		轉軸	垂直與水平之滾軸 系統完全關閉 橡膠配件密封						
		210kgf/cm ² 混 凝土	表面清理						
施工後		結構穩固	堅固	施工後	目視	隨時	自主檢查 表	進行缺失改善	

表 四-20 兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(六)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前		擺盪大索 1 座	材料送審施否已核定 依設計圖說 有無彎曲變形。 塑膠保護膜。	施工前	送 審 資 料 、 目 視 、 尺 量	目視、必 要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
施工中		支撐柱	鍍鋅鋼圓管 $\phi 133\text{mm}$ (表面鍍鋅、粉體塗裝處理)	施工中	鋼捲尺 游標卡尺	每座施工 中/後	自主檢查 表	要求改正	
		鍊條	不鏽鋼						
		繩索 座面	六股繩索 $\phi 16\text{mm}$ 麻繩材質 $\phi 140\text{mm}$						
		210kgf/cm ² 混 凝土	表面清理						
施工後		結構穩固	堅固	施工後	目視	隨時	自主檢查 表	進行缺失改善	

表 四-21 兒童遊戲場設備工程施工品質管理標準表(七)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前		攀爬繩網 <u>1</u> 座	材料送審施否已核定 依設計圖說 有無彎曲變形。 塑膠保護膜。	施工前	送 審 資 料 、 目 視 、 尺 量	目視、必 要時丈量	不得使用	檢查紀錄表	
施工中		遊具支柱	鍍鋅鋼管 $\phi 114\text{mm}$ (表面鍍鋅、烤漆處理)	施工中	鋼捲尺 游標卡尺	每座施工 中/後	自主檢查 表	要求改正	
		六股繩索	繩索 $\phi 16\text{mm}$ 鋁合金束投 圓形十字結						
		210kgf/cm ² 混凝土	表面清理						
施工後		結構穩固	堅固	施工後	目視	隨時	自主檢查 表	進行缺失改善	

表 四-22 預鑄路緣石工程施工品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備 註
計畫階段	鋪面計畫審查	地坪分割規劃	應盡可能使用整塊混凝土磚之單元代替切割單元	施工前一個月	審查	1 次	審查表	重新提送	
	工程介面之配合工作	按契約相關規定辦理	-	施工前一個月	-	-	紀錄表	再協調	
	緣石及磚材送審	材料審查	尺度、抗壓強度及抗彎強度等符合契約圖說規定	施工前一個月	審查	1 次	送審管制總表及審查表	重新提送	
施工前	測量放樣	放樣成果	依設計圖編號 LA-003 規定	*放樣完成後	檢視放樣成果	全區放樣完成後檢測一次	測量成果表	調整或重新放樣	
	物料整備	材料堆置安排	無影響交通安全	材料進場前	目視	1 次	檢查紀錄	重新安排	
底土層施工	底土層整地及夯實	高程檢測	符合設計圖說編號 LA-003 規定	*夯實完成	水準儀	1 次	高程檢測紀錄	修整高程	
		壓實度	壓實度≥90%	夯實完成	CNS11777-1 CNS14733	每 1000m ² 1 次	抽驗紀錄表及試驗報告	重新夯實	
	施工面檢視	底土層表面	表面已夯實檢驗合格，且無對鋪面有不良影響之情況	*安裝前	目視	每次安裝 1 次	檢查紀錄	重新整地	

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工後	緣石底部 PC 打設	坍度	配比坍度 $\pm 4.0\text{cm}$	澆置時	CNS1176 現場檢驗	不得少於抗壓強度試驗組數	抽驗紀錄表及試驗報告	退貨	第 03310 章-結 構用混 凝土
		氯離子	一般: $\leq 0.15 \text{ kg/m}^3$	澆置時	CNS13465 氯離子含量測定器(現場查證)	不得少於抗壓強度試驗組數	抽驗紀錄表及試驗報告	退貨	
		210kgf/ cm^2 混 凝土抗 壓強度	1.任一試體 $\geq f_c' - 35$ kgf/cm^2 2.連續 3 組平均抗壓強度需 $\geq f_c'$	混凝土材齡達 28 天時	CNS1232(委外 試驗)	a.每組試體 3 個(其中一個供 7 天齡期試驗用) b.每天至少取 1 組試驗 1 次 c.每 120m^3 之澆置混凝土至少取樣 1 組試驗 1 次	檢查紀錄	拆除重作	
		厚度	5cm	*澆置後	尺規	每次澆置一次	打除重做	檢查紀錄	

表 四-23 鋪面磚鋪設工程施工品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前		掌握設計圖內容	訂定磚起始、收頭、切割	施工前	捲尺、目視	每次進場	檢討修正 檢討修正 退貨 修正	檢查紀錄表	
		資料彙整 抽樣檢驗 堆置存放 刨除廢泥渣及垃圾 清理 完成面高程及洩水 坡度設定 牆面四週及重點部位 查核基準 堆放配置	位置計劃(施工大樣圖) 廠商樣本提供,轉角使用 轉角磚或磨角 檢視尺寸、色澤、數量、 批號 堆放位置之配置及保護 徹底清除乾淨 洩水坡度1/100 依施工計劃 依施工計劃 配合施工順序						
施工中	鋪面磚鋪設	底層底土夯實		施工中	鋼捲尺	每座施工中/後	自主檢查表	要求改正 檢查紀錄表	
		鋪面磚	鋪面磚($T \geq 4\text{cm}$)						
		1:3 水泥砂漿	鋪面磚縫隙填補 ($T=2\sim 4\text{cm}$)						
		導角處理	2cm						
施工後		結構穩固	堅固	施工後	目視	隨時	自主檢查表	進行缺失改善	

表 四-24 磨石子工程施工工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前	放樣	原地面線	是否與設計圖相符	施工前	縱、橫斷面水準測量	分區檢查	資料彙整報請甲方處理	測量資料	
		必要樁位之檢測及保護	依圖說規定	施工前	經緯儀測量	分區檢查	資料彙整報請甲方處理	測量資料	
		邊坡樁放樣	依圖說規定	施工前	經緯儀測量	分區檢查	校正	檢查紀錄表	
	材料選擇	粉刷料	依設計圖或工程司之指示	施工前	目視	隨時	再設置	紀錄及拍照存證	
		水泥	使用同一廠牌，以求色澤一致	施工前	目視	全面	要求改正	檢查紀錄表	
	清潔整理	混凝土表面	異物清除	施工前	目視	全面	再清除	檢查紀錄表	
施工中	水泥砂漿製作	配合比例	1.採用一份水泥及三份砂與適量之水 2.另有規定，採用 1 份水泥、1.5 份碎石及 1/4 份礦物填縫料	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	
		拌和方式及表面打磨處理	1.應置於一接合嚴密不漏水之容器內拌和 2.加水拌和時間不得少於 3 分鐘	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	
施工後	清潔汙泥處理	汙泥處理清運	異物清除及清運	施工後	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	
		表面清潔							

表 四-25 抵石子工程施工工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前	放樣	原地面線	是否與設計圖相符	施工前	縱、橫斷面水準測量	分區檢查	資料彙整報請甲方處理	測量資料	
		必要樁位之檢測及保護	依圖說規定	施工前	經緯儀測量	分區檢查	資料彙整報請甲方處理	測量資料	
		邊坡樁放樣	依圖說規定	施工前	經緯儀測量	分區檢查	校正	檢查紀錄表	
	材料選擇	粉刷料	依設計圖或工程司之指示	施工前	目視	隨時	再設置	紀錄及拍照存證	
		水泥	使用同一廠牌，以求色澤一致	施工前	目視	全面	要求改正	檢查紀錄表	
	清潔整理	混凝土表面	異物清除	施工前	目視	全面	再清除	檢查紀錄表	
施工階段	水泥砂漿製作	配合比例	1.採用一份水泥及三份砂與適量之水 2.另有規定，採用 1 份水泥、1.5 份碎石及 1/4 份礦物填縫料	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	
		拌和方式	1.應置於一接合嚴密不漏水之容器內拌和 2.加水拌和時間不得少於 3 分鐘	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	
	底層	粉刷	1.將水泥砂漿壓鏟塗刷，使水泥砂漿固黏於表面 2.依準條用木尺將粉刷面刮平	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	

施工流程	管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
抵石子施工	表面整理	用噴霧器噴洗表面，應洗刷清潔	施工中	目視	分區檢查	要求改正	檢查紀錄表	
	開挖順序	自高處向低處施工	施工中	目視	分區檢查	要求改正	檢查紀錄表	
施工中	材料處理	1.顏色及碎石種類由工程司另行指定之 2.水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料，其用量為水泥量之 15%~20%	施工中	目視	分區檢查	要求改正	檢查紀錄表	
	分格	分格之大小應依工程司指示辦理 以 9mm 檜木條，先釘在已完成底度之牆面上，抵石子工作完成乾透後，再起出木條	施工中	目視	分區檢查	要求改正	檢查紀錄表	
施工後	清除整理	地表清除	抵石子完成後，整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清	施工後	目視	分區檢查	再清除	檢查紀錄表

表 四-26 彈性無縫鋪面工程檢查管理標準表

施工流程	管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率		管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前階段	測量與放樣	施工範圍	1.是否與設計圖相符 2.排水方向及坡度按設計圖規劃	施工前	縱、橫斷面水準測量	分區檢查	要求改正	測量資料	
	材料選擇	混凝土彈性無縫鋪面	1.材料送審及鋪貼切割計畫 2.無異常狀態	卸料時	目視	每批檢查	鋪貼切割資料再彙整報請	檢查紀錄表	
施工階段	混凝土澆置	混凝土工作	如混凝土工程檢查管理標準	如混凝土工程檢查管理標準	如混凝土工程檢查管理標準	如混凝土工程檢查管理標準	如混凝土工程檢查管理標準	如混凝土工程檢查管理標準	
	施工過程	鏟平粉光	混凝土表面鏟平再均勻，清除表面落葉，積水及碎石雜物	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	
		清理表面	1.初凝後再，需掌握時間放置，否則逾時後混凝土、7 天後以高壓水沖洗待乾燥 2.有排水系統或適當的洩水坡度以利排水	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	

施工後階段		塗布膠水	1.用膠水黏貼，需確實讓地墊與接著之基礎確實黏貼牢固 2.均質彈性地墊	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	
		檢視	排水方向及坡度	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄表	
		管制出入	圈圍保護	施工中	目視	隨時	要求改正	工程檢查管理標準	
	保養	保養方式	並放置6-8小時等候至完全乾燥方始開放使用	施工後	目視	分區檢查	要求改正	檢查紀錄表	

表 四-27 地坪工程檢查管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻 率	管理紀錄	不符合標準 之處置方法	備註
施工 前 段	測量與放 樣	施工範圍	1.是否與設計圖相符 2.排水方向及坡度按設計圖 規劃	施工前	縱、橫斷面水 準測量	分區檢 查	資料彙整報請甲 方處理	測量資料	
	材料選擇	混凝土	無異常狀態	卸料時	目視	每批檢 查	通置預拌場改善	檢查紀錄 表	
施工 階段	混凝土澆 置	混 凝 土 工 作	如混凝土工程檢查管理標準	如混凝土工程 檢查標準	如混凝土工程 檢查標準	如混凝土工程 檢查標準	如混凝土工程檢 查標準	如混凝土工程 檢查標準	
	壓製過程	鏟平粉光	混凝土初凝前，表面鏟平再 均勻撒佈彩色壓花料	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄 表	
			初凝後再，需掌握時間否則 逾時後混凝土乾枯，無法整 平	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄 表	
		沖洗，	7 天後以高壓水	施工中	目視	隨時	要求改正	檢查紀錄 表	
		混 凝 土 工 作	如混凝土工程檢查管理標準	如混凝土工程 檢查標準	如混凝土工程 檢查標準	如混凝土工程 檢查標準	如混凝土工程檢 查標準	如混凝土工程 檢查標準	
	混凝土澆 置	保養方式	養護達 28 天，始開放使用	施工後	目視	分區檢 查	要求改正	檢查紀錄 表	
施工 後 段	保養	保養方式	澆水養護	施工後	目視	分區檢 查	要求改正	檢查紀錄 表	

表 四-28 地(磁)磚工程檢查管理標準表(1/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前	事前規劃	掌握設計圖內容	訂定磁磚起始、收頭、切割位置計劃(施工大樣圖)	施工前	—	—	檢討修正	—	
	磁磚訂定	資料彙整	廠商樣本提供,轉角使用轉角磚或磨角	進場前	目視	—	檢討修正	—	
	材料進場	抽樣檢驗	檢視尺寸、色澤、數量、批號	進場時	捲尺、目視	每次進場	退貨	檢查紀錄表	
		堆置存放	堆放位置之配置及保護	進場時	目視	每次進場	修正	檢查紀錄表	
	施工表面	刨除廢泥渣及垃圾清理	徹底清除乾淨	施工前	目視	每次清理後	立即改正	檢查紀錄表	
	基準線放樣	完成面高程及洩水坡度設定	洩水坡度 1/100	施工前	水平尺、水平儀	每次放樣時	立即改正	檢查紀錄表	
	灰誌貼設	牆面四週及重點部位	依施工計劃	施工前	目視、水平儀	每次貼設時	立即改正	檢查紀錄表	
	放樣檢驗	查核基準	依施工計劃	施工前	目視、水平儀	每次放樣後	立即改正	檢查紀錄表	
	材料吊運	堆放配置	配合施工順序	進場時	目視	每次吊運	立即改正	檢查紀錄表	
施工前	放樣檢驗	查核基準	依施工計劃	施工前	目視、水平儀	每次放樣後	檢討修正	—	
	材料吊運	堆放配置	配合施工順序	進場時	目視	每次吊運	檢討修正	—	
		材料查核	查對規格數量批號及是否有受損	進場時	目視	每次吊運	退貨	檢查紀錄表	
	潤濕	施工前一天表面以清洗潤濕	表面無雜質面乾內飽和	施工前	目視	每次施工前	修正	檢查紀錄表	

表 四-29 地(磁)磚工程檢查管理標準表(2/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工中	打底	水泥少漿拌合平 配比鋪設刮平	依施工計劃攪拌均勻 外牆需用 1:2 水泥砂漿加防水劑 打底	施工中	目視	2 次	立即改正	檢查紀錄表	
		十字分割線及 輔助基準線 設置	依施工計劃攪拌均勻、鋪平	施工中	目視	每次攪拌鋪設	立即改正	檢查紀錄表	
		表面平整度	每 m 誤差 $\leq 2\text{mm}$	施工中	水平尺、捲尺	全面	立即改正	檢查紀錄表	
		壓貼敲實縫隙 調整對齊	依施工計劃	施工中	目視	全面	立即改正	檢查紀錄表	
		收頭及切割位 置	配合施工順序	施工中	目視	全面	立即改正	檢查紀錄表	
		洩水坡度方向	依施工計劃(大樣圖)	施工中	水平尺	全面	立即改正	檢查紀錄表	
	填抹 縫	填縫處處理乾 淨	磁磚計劃規範	施工中	目視	每次填縫	立即改正	檢查紀錄表	
		填抹縫確實滿 漿	不得有氣泡產生	施工中	目視	每次填縫	立即改正	檢查紀錄表	
施工後	清潔 及維 護	鋪貼完成面情 形	餘漿清潔乾布擦拭	鋪貼後	目視	每次放樣後	立即改正	檢查紀錄表	
		堆放配置	配合施工順序	進場時	目視	全面	立即改正	檢查紀錄表	
		施工場所	牆面污染處清洗乾淨 垃圾廢料清運	施工後	目視	全面	立即改正	檢查紀錄表	
		禁止荷重	水泥砂漿未凝結前(三天內)禁 止荷載	施工後	目視	全面	立即改正	檢查紀錄表	

表 四-30 木作工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
計畫階段	了解設計圖說	掌握設計圖內容	確認施工要領	施工要領及施工圖製作前	施工計畫書之施工要領之內容		再檢討修正	檢查紀錄表	
	決定施工要領	施工要領之內容	確認施工要領檢查標準	加工圖繪製前			再檢討修正	檢查紀錄表	
	製作骨灰箱鋼模圖	加工圖內容	確認標準圖及重要加工要件	加工前			再檢討修正	檢查紀錄表	
施工前	材料進場	材料材質	外觀無異常狀態	卸料時	確認材質	材料每次進場時	退回	檢查紀錄表	
		堆置方法和狀態	防止材料髒污	堆置期間	目視	材料每次堆置時	加強堆置場所之保養	檢查紀錄表	
施工階段	施作	組立固定	1.樣式依客戶指定樣品為準 2.實際尺寸配合現場施工 $\pm 5\%$ 略作調整 3.高度為基準並依現場實際配合施工 4.結構需為立向、橫向相互交錯十字結合。	隨時	測量儀器測量	依次施作時	重新施作	檢查紀錄表	
	施作	施作	1.上方以指定固定結構固定於樓底板及箱體本結構 2.單側型箱體作法如同雙側	隨時	目視	施作時	重新施作	檢查紀錄表	
	裝修	整體結構裝修	1.頂層蓋板採用骨材裝修	施工中	材料試驗單位之專業檢測儀器	材料進場後	重新送驗	試驗報告	

表 四-31 排水工程施工品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前	瞭解工程設計圖說	瞭解設計圖說之內容	確認施工要點	計劃、施工圖作成前	與圖說及相關規範核對	提出送審前檢查一次	檢討修正	施工圖送審管制表	
	製作施工計劃及施工圖	施工計劃、施工圖之內容	施工條件檢查標準值之核定	施工要領決定前	由業主或監造單位審查	提出送審前檢查一次	再檢討修正	計劃書送審管制表 施工圖送審明細表 施工圖發行管制表	
	決定施工要領	施工要領之內容	掌握施工要點，檢查標準值之確認	施工前	與圖說及相關規範核對	提出送審前檢查一次	再檢討修正	查核表	
	材料搬入	排水之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法	核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損	卸貨時保管時	核對訂貨單，目視、以尺丈量	每次運入工地時檢查 1 次	更換材料 標籤「尚未檢測禁止使用」 標籤「檢測不合格禁止使用」	進場出廠證明、試驗報告	
		管之接頭、配件、另件、另架等之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法	核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損	卸貨時保管時	核對訂貨單，目視、以尺丈量	每次運入工地時檢查 1 次	更換材料 標籤「尚未檢測禁止使用」 標籤「檢測不合格禁止使用」	檢查紀錄表	
	施工中	設備配管	依施工圖、設計圖說核對材質、規格、尺寸、間距、施工圖	配管時	目視、捲尺丈量	配管時檢查 1 次	拆除，重新施作	檢查紀錄表	
		閥件銜接安裝	依施工圖、設計圖說核對材質、規格、尺寸、間距、施工圖	配管時	目視、捲尺丈量	配管時檢查 1 次	拆除，重新施作	檢查紀錄表	
		穿牆配管	查對部份之施工外管，注意防漏	配管時	目視及核對	配管時檢查 1 次	拆除，重新施作	檢查紀錄表	
		管路試水壓	依圖說規定	配管後	儀器測試	測試後檢查	修正	檢查紀錄表	

表 四-32 假設工程品質管理標準表(1/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前	假設工程規劃	工務所、洗車池、守衛室、臨時廁所、抽排水及臨時水電等之配置規劃。	依據工程標單及規範之要求及數量配置。	施工前	圖面及現場檢討	施工前	檢討修正	審查紀錄	
		設置位置是否合宜	設置位置不可影像後續工程施工	施工前	圖面及現場檢討	施工前	檢討修正	審查紀錄	
施工中	工程告示牌	規格尺寸應符合巨額採購之標準	長 500 公分，寬 320 公分	材料進場	捲尺量度	材料進場時	退回重新備料	檢查紀錄表	
		內容應符合巨額採購之標準	內容應包括：工程名稱、主辦機關、設計監造單位、施工廠商、專任工程人員、工地主任(負責人)、品質管理人員、勞工安全衛生人員姓名及電話、工程透視圖、施工起迄時間、重要公告事項、全民督工電話及網址及工程概要及工程效益等。	材料進場	目視	材料進場時	退回重新備料	檢查紀錄表	
	工務所	面積大小及樓層	工務所面積 198m ² ，二層	材料進場	目視及捲尺量度	材料進場時	退回重新備料	檢查紀錄表	
		內部設備	依據標單數量及契約規定	布置完成	目視清點	設備裝置完成	修改或增補	檢查紀錄表	

表 四-33 假設工程品質管理標準表(2/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工中	洗車池	規格、尺寸	車道淨寬 4.0M、長度 10.0M	開挖後	捲尺量度	開挖完成一次	修正至尺寸符合	檢查紀錄表	
		沖洗設備	應包含高壓沖洗設備	施工中	目視	設備安裝完成	修正	檢查紀錄表	
		沉澱池	容量是否足夠	施工中	目視	施工時	修正沉澱池尺寸	檢查紀錄表	
		排水	是否經沉澱後再排入鄰近排水設施	施工中	目視	施工時	修正	檢查紀錄表	
	臨時水電	工程用水	是否採用自來水、非為自來水時，應先檢驗水質	施工中	水質檢驗	正式動工前	不准使用	檢驗報告	
		工程用電	契約容量是否足夠	施工前	圖面及現場檢討	施工前	增加契約容量或增加備用電源	用電需求評估表	
			臨時電箱是否依據職安衛相關法規設置	配置完成時	目視	每處臨時用電設置完成時	禁止使用至修正完成	檢查紀錄表	

表 四-34 電力工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
計劃階段	瞭解工程設計圖說	瞭解設計圖說之內容	確認施工要點	計劃、施工圖作成前	與圖說及相關規範核對	提出送審前檢查一次	檢討修正	施工圖送審管制表	
	製作施工計劃及施工圖	施工計劃、施工圖之內容	施工條件檢查標準值之核定	施工要領決定前	由業主或監造單位審查	提出送審前檢查一次	再檢討修正	計劃書送審管制表 施工圖送審明細表 施工圖發行管制表	
	決定施工要領	施工要領之內容	掌握施工要點，檢查標準值之確認	施工前	與圖說及相關規範核對	提出送審前檢查一次	再檢討修正	檢查紀錄表	
施工前	材料搬入	管材之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法	核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損	卸貨時保管時	核對訂貨單，目視、以尺丈量	每次運入工地時檢查 1 次	更換材料標籤「尚未檢測禁止使用」 標籤「檢測不合格禁止使用」	檢查紀錄表	
		管材之接頭、配件、另架等之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法	核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損	卸貨時保管時	核對訂貨單，目視、以尺丈量	每次運入工地時檢查 1 次	更換材料標籤「尚未檢測禁止使用」 標籤「檢測不合格禁止使用」	檢查紀錄表	

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施 工 中	配管 線理 設	BOX 放樣	核對材質、規格、尺寸、 間距	配管線 BOX 施工 時	目視、以尺寸 量	施工時檢查 1 次	修正	檢查紀錄表	
		管、管件之材質、 尺寸、接法及位置	依施工圖、設計圖說	配管線暗 管施工時	目視、以尺寸 量	施工時檢查 1 次	修正	檢查紀錄表	
		穿牆配管線	查對穿牆部份之施工及通 至屋外管，特別注意防漏	配管線施 工時	目視、以尺寸 量	施工時檢查 1 次	修正	檢查紀錄表	
		管路出口保護	依圖說規定	配管線系 統配管完 成	目視及核對	施工時檢查	管路修正，重新保護	檢查紀錄表	

表 四-35 濕式壓花地坪工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工前	瞭解工程設計圖說	計畫、設計圖說色樣是否已確認	確認要點	計畫、施工圖作成前	與圖說及相關規範核對	提出送審前檢查一次	檢討修正	計畫、施工圖送審核備	
	材料進場	彩色硬化劑、保護劑、止滑劑	施工條件檢查標準值之核定	施工要領決定前	由業主或監造單位審查	進場檢查一次	再檢討修正	計畫書、施工圖核備文	
	模具、色樣	模具選樣，具特定硬度 顏色	掌握施工要點，檢查標準值之確認	施工前	與圖說及相關規範核對	進場檢查一次	退場	檢查紀錄表	
施工中	施工澆置面	地坪清理	表面無異物、預置物件已埋設完成	混凝土澆置前	核對訂貨單，目視、以尺丈量	施工時檢查 1 次	立即清理完成	檢查紀錄表	
	混凝土澆置	確保厚度（通常 10cm），表面收光平整	濕度、風速、雨天等影響品質的天候條件下不得施工	混凝土澆置中	目視、以尺丈量	施工時檢查 1 次	適時調整高程	檢查紀錄表	
	撒播硬化劑	區塊分次均勻	撒播，確實拍漿結合	混凝土初凝前	目視、以尺丈量	施工時檢查 1 次	修正	檢查紀錄表	
	壓花、封面劑	模具放置確實	壓印均勻，紋理清晰噴上透明封面劑，形成保護層、壓花後 2-3 天切割，深度至少 1/3 混凝土厚度	壓印前	目視、以尺丈量	施工時檢查 1 次	修正	檢查紀錄表	
施工後	脫膜環境整理	脫膜環境整理	乾燥後塗刷保護劑和止滑劑	施工後	目視、以尺丈量	施工時檢查 1 次	修正	檢查紀錄表	
		養護達 28 天，始開放使用	持續灑水或覆蓋養護，確保足夠時間	施工後	目視、以尺丈量	施工時檢查 1 次	修正	檢查紀錄表	
		成品檢驗	圖案一致、無色差、無裂縫、表面平整	施工後	目視、以尺丈量	施工時檢查 1 次	修正	檢查紀錄表	

表 四-36 汛期防災減災施工品質管理標準表(1/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
開始	準備期	防災減災計畫	依分項施工計畫執行	開工後一個月內	計畫內容審查	每次提送	計畫審查	重新擬定	
			合理安排施工順序及進度，並妥擬緊急應變及防災措施						
			訂定汛期工地防災自主檢查表						
施工中	汛期前	1.辦理各級施工人員之防災宣導、講習或教育，依相關災害防救計畫及防汛應變計畫進行演練及整備 2.有受汛期影響施工作業及安全之工作項目，應力求於汛期前完成	(1).檢討調整工地應變、搶險及搶修之組織規模及運作能量；必要時簽訂開口契約，或與鄰近工地協調互相支援救助 (2).全面清查工地防汛缺口，預為準備及置放封堵材料及機具 (3).建立工地防救災資源清冊，並對防救災相關器材進行檢修及維護 (4).妥善規劃及佈設適當之排水、截水、滯洪及山坡地水土保持等設施 (5).於工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施 (6).依施工現況檢討修正施工計畫有關汛期防災內容、防汛應變計畫	施工中	自主檢查表	每月一次	自主檢查表	補正	
			修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容，必要時應檢討修正災害防救計畫						

表 四-37 汛期防災減災施工工程品質管理標準表(2/2)

施工流程		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	管理紀錄	不符合標準之處置方法	備註
施工中	汛期間	颱風、豪雨來襲前	立即檢查工地臨時構造物、排水設施、大型機械設備、開挖及土石挖填方、水文及邊坡變化、防汛缺口、垃圾、雜物及廢棄物、施工器材、電力系統、房舍、辦公室及倉庫等現場防災工作之辦理情形，並由廠商填報汛期工地防災自主檢查表送監造單位及機關據以檢查	施工中	自主檢查表	每一次颱風、豪雨來襲前	自主檢查表	修改	
		颱風、豪雨侵襲過程	(1).應變、搶險及搶修等組織及相關材料、機具立即到位並正常運作 (2).隨時掌控工地及週遭之受災情形，予以緊急處置，並通報災情及請求協助 (3).對於可能受工地災情影響之鄰近地區民眾，提早預警及通知疏散	施工中	自主檢查表	每一次颱風、豪雨期間	自主檢查表	修改	
	汛期後	颱風、豪雨侵襲過後	檢討工地汛期施工防災機制之整體運作成效，並就缺失改進 修正施工計畫、防汛應變計畫等相關內容，必要時應檢討修正災害防救計畫	施工中	自主檢查表	每一次颱風、豪雨來襲後	自主檢查表	修正	

第五章 材料及施工檢驗程序

為有效達到品質管制之目標，確認材料品質符合採購契約規定，制訂工程檢驗之執行要點，藉檢查、量測、計量或監測等方式，確保工程進度進行順暢或已完成之作業品質能符合相關規定，開工時訂定「材料設備送審管制總表」、「材料設備檢（試）驗管制總表」。

一、材料設備檢驗程序

（一）材料設備送審管制訂定

工程使用之材料設備，除契約明文規定不須送審外，應包括有送審資料項目、送審時間、進料時間、是否取樣試驗等之檢討，且需提送型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商產能暨相關證明文件…等資料，待文件審查合格後方可進場。本工程材料設備送審管制總表如表 5-1。

（二）材料設備檢試驗單位之核備程序

依契約編列之品質檢驗項目遴選具有 CNS 17025（ISO/IEC 17025）規定之試驗單位，以及出具檢驗或抽驗報告應印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌，並提報多家試驗單位認證項目暨相關證明文件…等資料，待文件審查合格後方可送驗。

（三）材料設備於進場後之管理

材料與設備進場時，辦理自主檢查並以書面向監造單位申請檢驗程序，於檢驗完成或取得試驗報告後，依檢驗結果判定合格方可使用，不合格者配合辦理複驗或運離工地，並與第八章不合格品管制及第九章矯正與預防措施連結。

（四）材料設備檢驗流程

分材料取樣及現場檢驗之作業程序及向監造單位申請檢驗程序

1. 材料取樣之作業程序：

材料與設備進場時，依品質管理標準表內所訂內容（管理標準、檢查時機、檢查頻率…）辦理填寫「材料設備品質自主檢查表」（詳表 5-3）完成自主檢查後，向監造單位提出「工程材料檢驗申請表」，內容敘明材料數量、生產廠商、試驗代表數量及取樣數量，並檢附

「材料設備品質自主檢查表」、製造批號及出廠檢驗報告等文件，其檢驗結果，應納入材料設備檢、試驗管制總表管制(管制表詳表 5-2)

(五)對材料設備檢、試驗管制訂定

工程使用之材料設備，除契約明文規定不須送審外，依品質管理標準表內所訂辦理檢試驗管制，包括有進場數量、進場時間、進場數量、取樣日期、取樣數量、取樣頻率、累積進場數量、累積取樣數量、試驗結果及取樣人員等事項。本工程材料設備檢(試)驗管制總表如表 5-1。

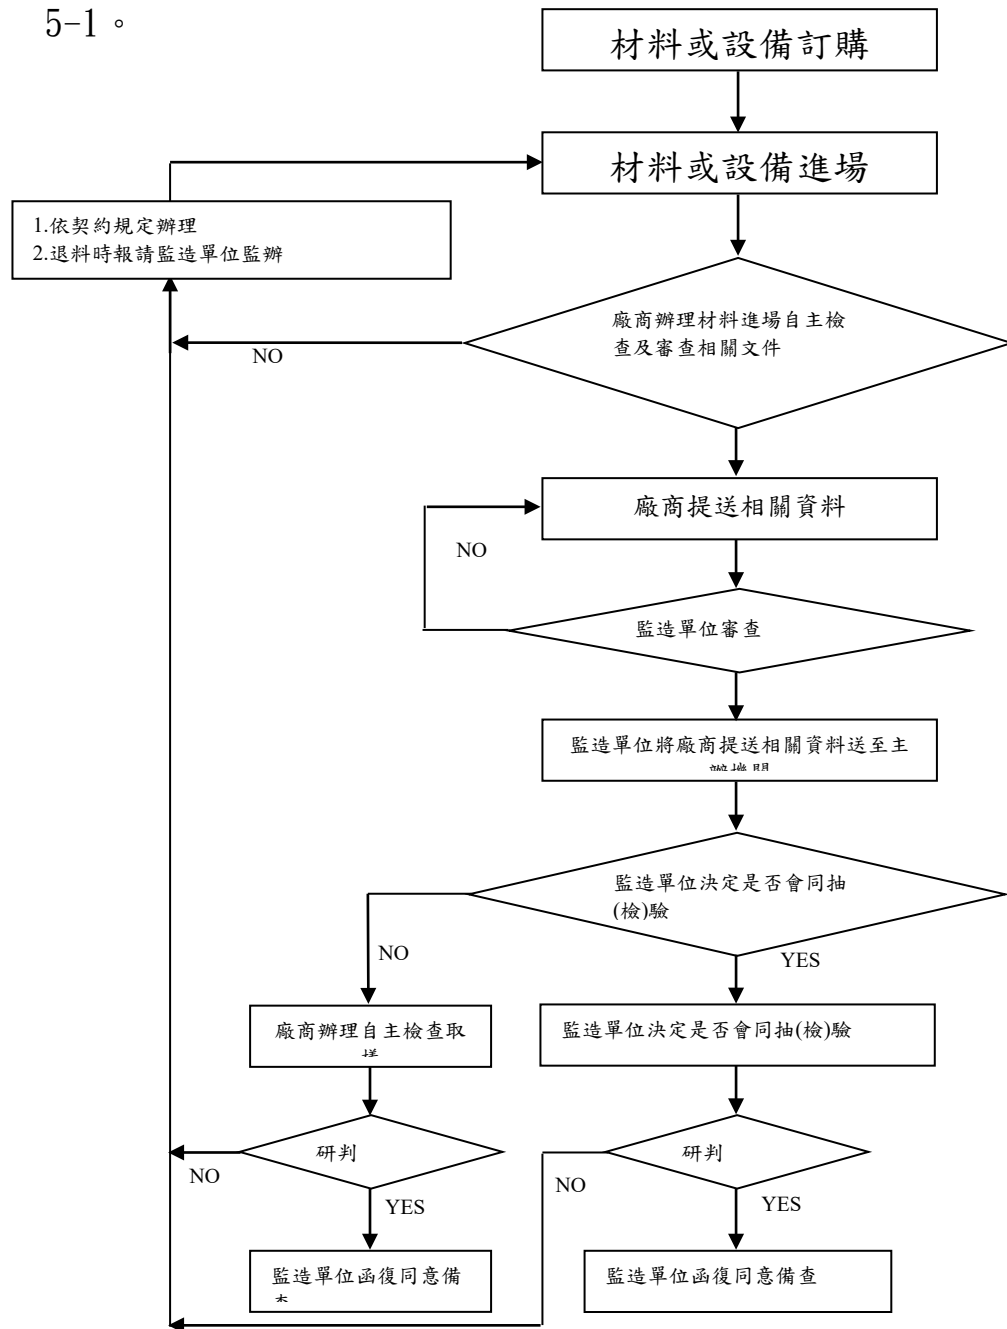


圖 五-1 材料設備檢驗流程圖

二、施工檢驗程序

(一) 施工檢驗流程

於施工過程依品質管理標準表內所訂檢查時機（自主檢查表訂定詳第七章）辦理自主檢查，另配合監造單位所訂定之檢驗停留點，向監造單位提出「工程施工查驗申請表」辦理檢驗，檢驗合格後方得繼續下一階段施工。

(二) 對檢驗不符合之處理

依上述檢驗結果判定合格方可使用，不合格者配合辦理複驗或運離工地，並與第八章不合格品管制及第九章矯正與預防措施連結。

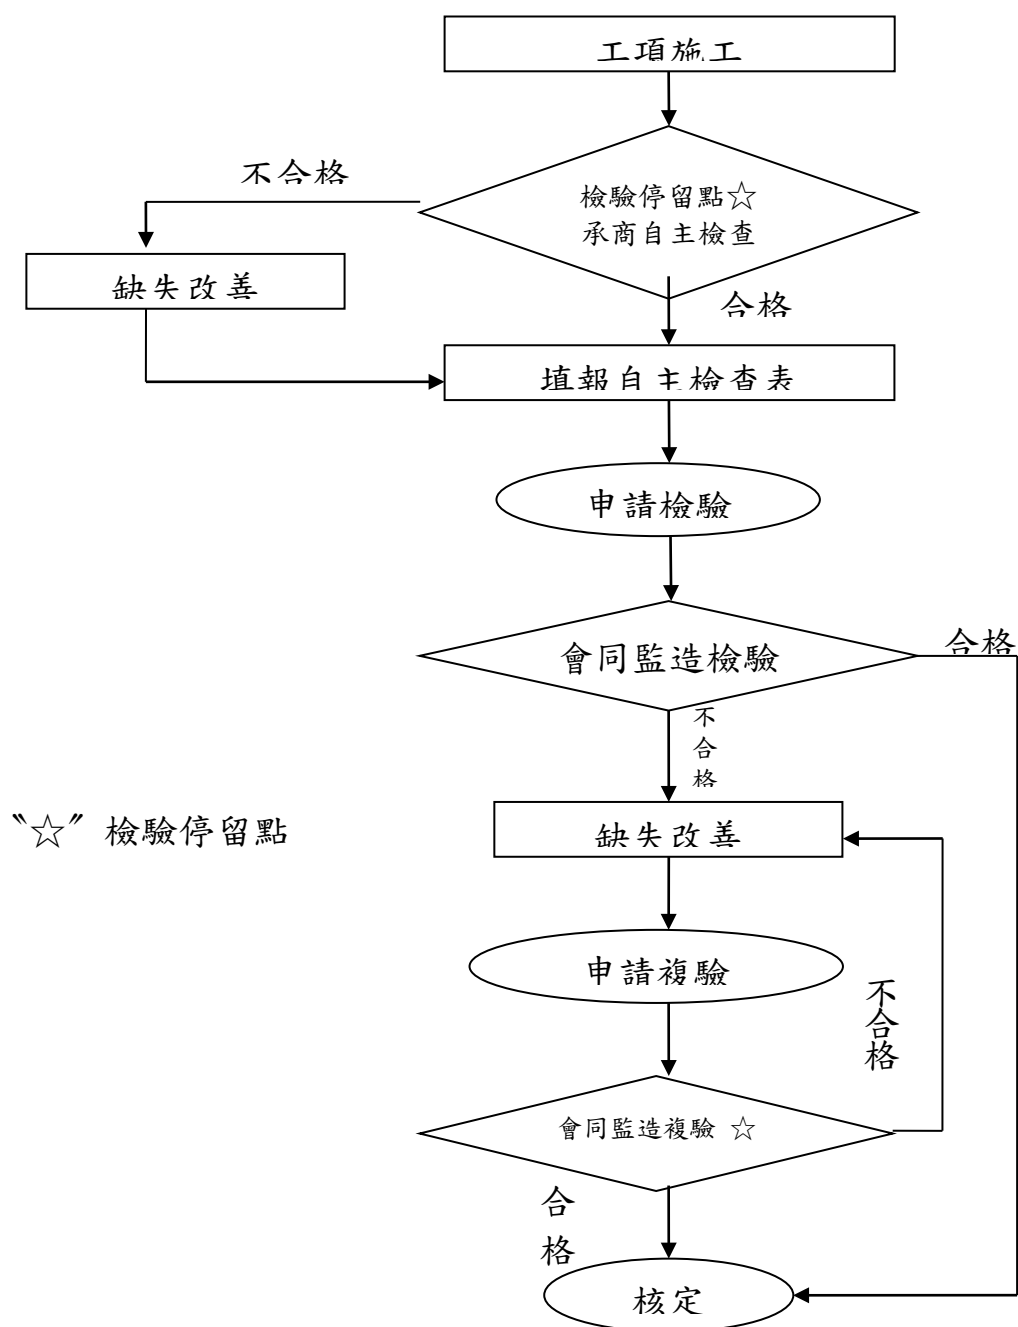


圖 五-2 施工檢驗流程圖

表 五-1 各分項工程施工檢驗程序一覽表

項次	項 目 名 稱	編號
1	交通臨時安全措工程施工檢驗程序	表五-2
2	道路土石方工程施工檢驗程序	表五-3
3	級配粒料底層工程施工檢驗程序	表五-4
4	測量工程施工檢驗程序	表五-5
5	瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序	表五-6
6	鋼筋工程施工檢驗程序	表五-7
7	模板工程施工檢驗程序	表五-8
8	混凝土工程施工檢驗程序	表五-9
9	照明工程施工檢驗程序	表五-10
10	鍍鋅鋼網圍籬工程施工檢驗程序	表五-11
11	植栽工程施工檢驗程序表	表五-12
12	兒童遊戲場設備工程施工檢驗程序	表五-13
13	預鑄路緣石工程施工檢驗程序	表五-14
14	鋪面磚(高壓)鋪設鋪設工程施工檢驗程序	表五-15
15	磨石子工程施工檢驗程序	表五-16
16	抵石子工程施工檢驗程序	表五-17
17	彈性橡膠鋪面工程施工檢驗程序	表五-18
18	地坪工程施工檢驗程序	表五-19
19	磁磚工程施工檢驗程序	表五-20
20	木作工程施工檢驗程序表	表五-21
21	排水工程施工檢驗程序	表五-22
22	假設工程工程施工檢驗程序	表五-23
23	電力工程工程施工檢驗程序	表五-24
24	器具設備工程施工檢驗程序	表五-25
25	濕式壓花地坪工程施工檢驗程序	表五-26
26	汛期防災減災工程施工檢驗程序	表五-27

表 五-2 交通臨時安全措工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[設施及安裝] B --> C{設施及安裝查核} C -- 重新施設 --> B C --> D[巡視維護路面清潔] D --> E{查驗} E -- 再次清潔 --> D E --> F([完成施作]) </pre>	1.進場數量、規格、檢核 2.分類堆置	自主檢查表
	1.設施位置、間距確認 2. 占用道路作業時，依規定訂定並執行交通布設、引導人員及安全防護。	
	1.設置後路面整潔。	自主檢查表

表 五-3 道路土石方工程施工檢驗程序

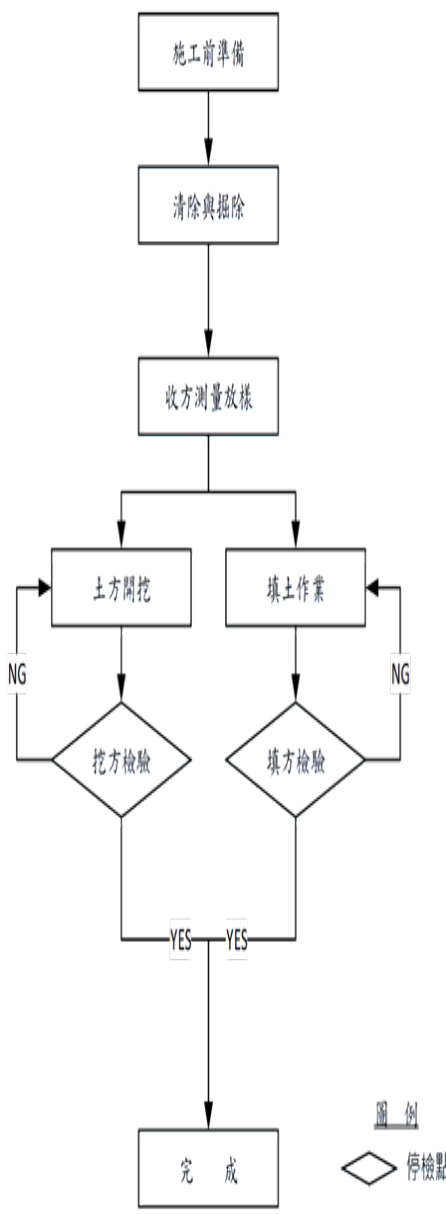
作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
 <pre> graph TD A[施工前準備] --> B[清除與掘除] B --> C[收方測量放樣] C --> D[土方開挖] C --> E[填土作業] D --> F{挖方檢驗} E --> G{填方檢驗} F -- NG --> D F -- YES --> H[完成] G -- NG --> E G -- YES --> H </pre> 圖例 ◇ 停檢點	1.土方堆置場確認 2.開挖及填土收方量測	自主檢查表
	1.雜草、樹木先行清理乾淨 2.路床遇有流水須排除	自主檢查表
	1.原地高程測量 2.必要樁位檢測及保護 3.邊坡樁放樣	自主檢查表
	1.路基材料須符合圖說規定 2.自上而下開挖	自主檢查表
	1.坡面高程及邊坡修整依圖說規定	自主檢查表 檢查紀錄
	1.回填時坡面高程及厚度檢測 2.回填壓密試驗 3.回填之路堤頂 30 公分範圍內填土材料須符合圖說規定	自主檢查表

表 五-4 級配粒料底層工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[材料進場管制與堆置] B --> C{材料查驗} C -- NG --> B C -- YES --> D[材料鋪設] D --> E[測量與放樣] E --> F{施工查驗} F -- NG --> D F -- YES --> G[表面修整作業] G --> H[級配面層滾壓養護] H --> I{級配厚度查驗 壓密度試驗} I -- NG --> H I -- YES --> J[運輸鋪設] J --> K[下一層施設] K --> D </pre> 圖例 ◊ 停檢點	1.材料料原之選擇 2.粒料管制資料建立 3.運送設備	送審資料
	1.料源管制 2.堆置高度與範圍 3.臨時移排水設施	自主檢查資料
	1.放樣	土方開挖工程

表 五-5 測量工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[測量前準備] --> B[控制樁測量] B --> C{施工檢驗*} C -- NO --> B C -- YES --> D[施工測量] D --> E{施工檢驗*} E -- NO --> D E -- YES --> F[結構物放樣] F --> G{施工檢驗*} G -- NO --> F G -- YES --> H[完成] </pre>	1.定期儀器檢驗校對 2.擬定測量計劃 3.選擇適當的測量方式及工具	自主檢查資料
	1.控制樁導線點的選取 2.中心線各 IP 點間應以木樁釘牢,或以鋼釘釘於岩盤或大石等穩固處,並漆以顯目顏色加註點號	自主檢查資料
	1.檢驗高程 2.閉合精度需符合圖說規定 3.三角點檢測精度與水平角誤差要符合圖書規定	自主檢查資料
	1.縱斷面測量 水準測量施測視距以八十公尺以內為原則 2.橫斷面測量 中心樁之高程應與縱斷面樁號高程一致 3.內業成果計算	自主檢查資料
	1.縱斷面水準誤差要符合圖說規定 2.橫斷面水準誤差要符合圖說規定	自主檢查資料
	放樣誤差符合圖說規定	自主檢查資料
	1.結構物位置檢驗 2.結構物高程檢驗 3.結構物斜率檢驗	自主檢查資料

表 五-6 瀝青混凝土鋪面工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[拌合廠生產瀝青混凝土] B --> C[運送] C --> D{材料檢驗} D -- NG --> C D -- YES --> E[瀝青混凝土鋪設] E --> F[滾壓] F --> G{路面檢驗} G -- NG --> F G -- YES --> H[完成] </pre>	1. 配比設計、規格審核 2. 儲存量充沛	材質檢驗報告 進貨單及檢驗資料 廠商基本資料
	1. 運送路程規劃 2. 生產線良好	
	1. 基層平整度路床及路基級配 滾壓密度及厚度 2. 表面清潔無雜物 3. 機具狀況良好 4. 雨天不得施工且氣溫應高於 10℃ 以上	自主檢查表 檢查紀錄
	※1. 噴灑量 (1) 中凝油溶瀝青，MC-70 噴灑量 0.9~1.4L/m ² (2) 瀝青黏層表面需保持良好之潔淨狀態且使用量 0.11~0.35L/m ² 2. 油量過多之處理	自主檢查表 檢查紀錄
	1. 鋪築厚度量測各層每約 5000 m ² 為一批，每批應作厚度檢驗 5 點 2. 接縫處處理 3. 整修高程及平順度鐵輪壓路機 4. 現場溫度量測：瀝青混合料倒入鋪築機鋪築時之溫度，不得低於 120℃ 5. 路基面或級配粒料底層面平整，一切浮鬆材料、塵土，無積水	自主檢查表 檢驗報告

表 五-7 鋼筋工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[鋼筋進場] B --> C{鋼筋檢驗} C -- NO --> B C -- YES --> D[鋼筋加工] D --> E{加工檢驗} E -- NO --> D E -- YES --> F[鋼筋組立] F --> G{組立檢驗} G -- NO --> F G -- YES --> H[澆置混凝土] H --> I[完 成] </pre>	3.進場數量、規格、輻射量檢核 4.分類堆置 取樣試驗(按合約規定)	鋼筋輻射檢驗報告 材質檢驗報告 抽樣試驗報告 進貨單及檢驗資料
	施工詳圖送審	送審申請表
	2.按施工詳圖(尺寸、錨定)加工堆置(分類)、保管	審查核可施工詳圖
	1.規格、位置、間距、放樣 2.搭接長度、位置 3.箍筋規格、間距、尺寸 4.預留筋及開口位置、長度、間距 5.錨定配筋及補強 6.綁紮鐵絲情形 7.垂直精度、保護層	自主檢查表 鋼筋檢查紀錄
	雜物清理 模板檢核 鋼筋尺寸檢核 保護層綁紮情形 預埋配管	混凝土施工作業檢查表 材料試驗送驗單 實驗室試體試驗

表 五-8 模板工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[模板進場] B --> C{模板檢驗} C -- NO --> B C -- YES --> D[測量放樣] D --> E[模板組立及支撐] E --> F{組立及支撐檢驗} F -- NO --> E F -- YES --> G[澆置混凝土] G --> H[拆模] H --> I[完成] </pre>	1.模板面板厚度及整理堪用程度 2.模板材質、寸及整理堪用程度 3.支柱材質、尺寸及整理堪用程度 度繫結器、五金、鐵件規格	
	1.模板內面無木片、土屑等雜物 2.模板面脫模劑之均勻塗佈	
	1.模板斷面尺寸與組立位置符合圖說 2.開口位置及尺寸依設計圖說施工 3.模板間隙是否修補妥善 4.繫材螺栓是否注意間距，繫結牢固 5.支撐穩固狀態垂直固立於堅實之基腳上 6.支撐水平繫材依設計圖說位置及材料 7.預埋構件依設計圖說規定埋設 8.鋼筋保護層 9.伸縮縫為 2cm 厚填縫版	自主檢查表 模板檢查紀錄
	1.支撐檢查 2.防止爆模倒塌措施 3.應急補強措施 澆置水平高程標示(收邊壓條)	自主檢查表 檢查紀錄

表 五-9 混凝土工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[拌合廠生產混凝土] B --> C{路面檢驗} C -- NG --> B C -- YES --> D[混凝土澆置] D --> E[養護] E --> F[拆模] F --> G[表面修飾] G --> H{路面檢驗} H -- NG --> G H -- YES --> I[完成] </pre>	1.廠商資料及技術文件 2.施工機具及器材 3. 配比設計、規格審核	送審資料
	1.運送路程規劃拌合廠至工地時間 60 分鐘為上限 2.生產線良好	
	1.基層平整度路床及路基級配滾壓密度及厚度 2.表面清潔無雜物 3.機具狀況良好	自主檢查表 檢查紀錄
	1.混凝土坍度設計坍度：18 cm 許可差為±4cm 2.出料單強度如圖說規定強度 氯離子抽查<0.15kg/m ³	自主檢查表
	1.上、下層澆置之澆置時間間距不超過 45 分鐘 2.施工縫初凝前鏟成稍粗糙面 3.澆置之高度落差不得高於 1.5 公尺 4.震動棒之使用插入下層混凝土深度約為 10cm	自主檢查表
	現場清理、養護	自主檢查表

表 五-10 照明工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[基座施工、導管埋設] B --> C[材料配電箱進場] C --> D{材料進場檢驗} D -- NG --> C D -- YES --> E[燈桿、變電箱、燈具、組立及安裝] E --> F{功能測試} F -- NG --> E F -- YES --> G[維護] </pre>	1.預埋螺栓已設置 2.基座及導管埋設完成	
	1.接地極材質、數量、位置、安裝符合規定 2.燈泡材質數量、位置、安裝符合規定	自主檢查表 檢查紀錄
	1.配管位置符合規定 2.配電箱安裝符合規定 3.接地線徑符合規定	自主檢查表 檢查紀錄
	1.管道連線前要進行外觀檢查，發現有破損、裂痕、明顯變形、顏色不統一等異常現象的管道必須立即更換，並加以標記另行保管。 2.完成配管後埋設警示帶	自主檢查表
	1. 安裝完成後確認穩固 2. 通電測試，是否有燈具故障未亮	自主檢查表

表 五-11 鍍鋅鋼網圍籬工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[測量放樣] B --> C[材料進場] B --> D[基座施工] C --> E{材料檢驗} D --> F{基座檢驗} E -- NG --> C F -- NG --> D E -- YES --> G[欄桿組立] F -- YES --> G G --> H{施工檢驗} H -- NG --> E H -- NG --> F H -- YES --> I[維護] </pre>	1. 材料樣品、材質、型式確認	送貨單
	1. 測量放樣	廠商測量放樣紀錄表
	1. 材料進場抽驗 2. 本項工程採用金屬製品	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 基座設置施工埋件確認	
	1. 欄杆組立尺寸 2. 符合圖說及規範	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-12 植栽工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A([開挖施基肥]) --> B[選種] B --> C{檢驗} C -- NO --> D[補植] D --> B C -- OK --> E[種植] E --> F[養護] F --> G{檢驗} G -- NO --> D G -- OK --> H([完成]) </pre>	1.植栽移植現況調查 2.繪製施工詳圖 3.檢視圖面、現場核對 植栽施工計劃送審	施工說明書
	1.修枝不超過樹冠 1/3 2.除葉持完整樹型 3.斷根次數及切口	自主檢查表
	1. 移植樹木挖掘:挖掘範圍比原斷根範圍略大，遇粗根時鋸斷，並保持切口平整 2. 土球包紮防止水分蒸發，土球包裹(土球大小為樹幹直徑之 3~5 倍)，吊運繩索網綁處以較厚的軟性物質包裹、保護，長距離運輸使用黑色遮光網覆蓋， 3.植穴:樹穴尺寸 $\geq$ 土球球徑 2 倍寬；1.3 倍深，有礙生長物質是否清除完成，底部是否加鋪適量客沃土 4 根部土球: 包裹無法腐爛及影響根系生長之捆繩及包裹物是否拆除完成 5. 種植: 支柱深度埋入土壤 $>$ 50cm，植穴深度球直徑加 20cm	自主檢查表
	1.是否設置穩固樹木用之支架 2.周遭環境是否清潔完成並復原 3.澆水均勻浸透，定期除草	自主檢查表

表 五-13 兒童遊戲場設備工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[材料進場] B --> C{材料查驗*} C -- No --> B C -- Yes --> D[組件安裝] D --> E[檢視構件位置 安裝正確性] E --> F{施工查驗*} F -- No --> E F -- Yes --> G[完成] </pre>	1.材料生產或型錄及材料規格提 送文件 2.器具設備規格確認	材料文件送審 材料品質檢驗報告
	1. 位置確認整理安裝配置	檢查紀錄 自主檢查表
	1.無危險物品，擺盪空間光線明亮、通風、無視覺死角。 2.室內環境者，應備有效期內之急救用品。 3.遊戲設施基礎穩固，地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。 4.各項結構組件組裝固定，沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、鏽蝕等現象。 5.具有軸承組件之遊戲設施應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。 6.遊戲設施材料外觀沒有脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露等現象。 7.遊戲設施地面上之鋪面材料平坦不致造成絆倒，且地面無積水、濕滑、青苔等現象。 遊戲設施內不得積水，堆積髒亂之物。	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-14 預鑄路緣石工程施工流程及檢驗點

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[材料進場] B --> C{材料查驗*} C -- No --> B C -- Yes --> D[組件安裝] D --> E[檢視構件位置] E --> F{施工查驗*} F -- No --> E F -- Yes --> G[完成] </pre>	1. 計畫書提送審查 2. 型錄及材料規格提送工廠登記證	材料文件送審 材料品質檢驗報告
	1. 先廠抽樣 2. 必要時辦理鑽心取樣檢驗	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 鋪設緣石等之前，施工單位必須檢查水溝牆平整度，洩水方向及坡度以確保鋪置後之平穩性及安全性。	檢查紀錄 自主檢查表
	1 鋪設完畢，若有不平整時，需用水泥砂漿徹底填補與溝造物接觸面，以免造成安全問題。 2 施作時落實落實檢驗停留點，以免日後產生品管問題。	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-15 鋪面磚(高壓)鋪設工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[材料進場] B --> C{材料查驗*} C -- No --> B C -- Yes --> D[組件安裝] D --> E[調整修改長寬高] E --> F{施工查驗*} F -- No --> E F -- Yes --> G[完成] </pre>	1. 計畫書提送審查 2. 型錄及材料規格	施工說明書
	1. 磚鋪面 ($T \geq 4\text{cm}$) 2. 1:3 水泥砂	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 位置確認整理	
	1. 【1:3 水泥砂漿】 2. 磚鋪面($T \geq 4\text{cm}$) 3. 磚以下縫隙以 1:3 水泥砂漿填補 4. 緣石 2cm 導角處理 5. 安裝尺寸位置及數量	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-16 磨石子工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[收方測量放樣] B --> C[水泥砂漿製作] C --> D[底層粉刷] D --> E[磨石子工作] E --> F{磨石子抽查} F -- NO --> E F -- YES --> G[現場整理] G --> H[完成] </pre>	1. 將混凝土表面異物清除 2. 安排工作動線 3. 依指示設置工作縫及伸縮縫 4. 埋設螺絲及其他洞孔	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 確認施工位置 2. 必要樁位之檢測及保護	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 水泥與砂比例 1：3 與適量之水拌和 2. 應於接合不漏水之容器內 3. 拌和時間不少於 3 分鐘	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 將水泥砂漿固黏於表面 2. 用木尺將粉刷面刮平	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 磨石子面 2. 自高處向低處施工 3. 水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合物 4. 礦物填縫料，其用量為水泥量之 15%~20% 5. 分格之大小應依工程司指示辦理 6. 分格以條，先釘在已完成底度之牆面上	檢查紀錄 自主檢查表
	施工面應均勻清淨，不得混濁不清	

表 五-17 抵石子工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[收方測量放樣] B --> C[水泥砂漿製作] C --> D[底層粉刷] D --> E[抵石子工作] E -- * --> F{抵石子抽查} F -- NO --> E F -- YES --> G[現場整理] G --> H[完成] </pre>	1. 將混凝土表面異物清除 2. 安排工作動線 3. 依指示設置工作縫及伸縮縫 1.4. 埋設螺絲及其他洞孔	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 確認施工位置 2. 必要樁位之檢測及保護	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 水泥與砂比例 1：3 與適量之水拌和 2. 應於接合不漏水之容器內 3. 拌和時間不少於 3 分鐘	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 將水泥砂漿固黏於表面 2. 用木尺將粉刷面刮平	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 抵洗表面 2. 自高處向低處施工 3. 水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合物 4. 礦物填縫料，其用量為水泥量之 15%~20% 5. 分格之大小應依工程司指示辦理 6. 分格以 9mm 檜木條，先釘在已完成底度之牆面上	檢查紀錄 自主檢查表
	施工面應均勻清淨，不得混濁不清	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-18 彈性橡膠地墊工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[測量放樣] B --> C[底層處理] C --> D[混凝土澆置] D --> E{整區基地抽查} E -- NO --> D E -- YES --> F[橡膠地坪鋪貼過程] F --> G{橡膠地坪抽查} G -- NO --> F G -- YES --> H[保養] H --> I[完成] </pre>	1. 確認施工地點 2. 按設計圖規劃 3. 安排工作動線	圖說
	1. 測定施工範圍 2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 澆置順序須妥善規劃及執行 2. 作業人員的分配及搗實須妥善 3. 澆置高度，厚度及水平須符合圖說規定 4. 施工縫妥善處理以維持接合面連結強度 5. 洩落高度超過 1.5m 須使用漏斗	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 表面鏟平再均勻鋪貼過 2. 膠結需掌握時間放置，否則逾時後乾枯，無法膠結 3. 鋪貼後圍圍禁止入內，形成保護範圍	檢查紀錄 自主檢查表
	養護達 28 天，始開放使用	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-19 地坪工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[拌合廠生產混凝土] B --> C{路面檢驗} C -- NG --> B C -- YES --> D[混凝土澆置] D --> E[養護] E --> F[拆模] F --> G[表面修飾] G --> H{路面檢驗} H -- NG --> G H -- YES --> I[完成] </pre>	1. 粉刷位置及範圍是否正確 2. 牆面是否整修及清理 3. 粉刷基準線是否設置	自主檢查表
	1. 凸出之牆面是否打石處理 2. 基準面灰誌是否按規定製定	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 牆面於粉刷前是否有塗佈純 2. 水泥漿做為粘結層 3. 粉刷前牆面是否予以灑水濕潤 4. 打底完成後是否以刮尺刮平至灰誌基準面 5. 打底完成之牆面是否平整，陰角是否垂直 6. 水泥砂漿之拌合比例是否依照規定 7. 粉刷時水泥砂漿是否流入排水管内 8. 面層粉刷時垂直及水平是否平整 9. 面層粉刷時是否有鏟刀痕跡	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 粉刷層是否有空心現象 2. 殘料及垃圾是否清理乾淨	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-20 磁磚工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A{施工圖} --> B[底面檢查] B --> C[放樣] C --★--> D{材料檢驗} D --> E[鋪貼磁磚] E --> F[間隙調整] F --> G[填縫] G --★--> H{施工檢驗} H --> I[清潔完成] </pre>	1.磁磚分割不得小於半塊。	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 施工位置與圖面確認	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 放樣基準線確認 2. 水平垂直分割確認	檢查紀錄 自主檢查表
	1.外觀、包裝、廠牌、尺寸檢查 2.吸水率、彎曲破壞載重、耐磨耗、耐熱衝擊、耐釉裂、耐污染、耐藥品、鉛及鎘之溶出性 3.數量未達 1000M2 提出檢試驗報告，無需抽驗 4.數量超過 1000M2，每 1000M2 內檢驗一次 5.相關試驗方法依據 CNS9737、CNS3299-1~13	檢查紀錄 自主檢查表
	1.鋪貼面須保持水平 3 米直尺份一方向容許誤差為±3mm 2.輕括磁磚，檢驗其是否中空 3.施作完成 4.粉刷平整度 5.鋪貼前清潔及濕潤 6.灰縫之處理需與製作之樣品相同 7.窗邊需留 0.8~1cm 塞水路。 8.磁磚面不得有破損缺角	檢查紀錄 自主檢查表
	1.表面須清潔光滑	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-21 木作工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[材料進場] B --> C{材料抽查*} C -- NO --> B C -- YES --> D[安裝] D --> E{施工抽查*} E -- NO --> D E -- YES --> F[完成] </pre>	1. 依圖面造型排列配置數量計算 2. 各五金配件計算	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 木料規格尺寸符合圖說規定 2. 木料防腐處理符合 CNS3000	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 防腐、防蟻及防焰處理 2. 木料堆置儲放是否符合保護措施	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 鐵件為不銹鋼材或防銹處理 2. 結構料栓緊牢固	檢查紀錄 自主檢查表
	1. 木料之結合須準確平直 2. 木製品直接與泥土或污工面接觸須先塗滿適當防腐塗料 3. 水平、垂直度自主檢查 4. 樓地板之接續與板之寬度的檢查 5. 木料若因加工、接合等而破壞原有之防腐處理時，應行有效之二次防腐處理	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-22 排水工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B{涵管抽驗} B -- NO --> A B -- YES --> C[進場儲放] C --> D[放樣及管溝開挖] D --> E[埋設管涵] E --> F{安裝抽查} F -- NO --> E F -- YES --> G[回填夯填] G --> H{密度試驗} H -- NO --> G H -- YES --> I[完成] </pre>	1. 依據圖說核算涵管種類及數量辦理採購。	檢查紀錄 自主檢查表
	1.管徑及厚度。 2.是否有裂痕、裂縫。 3.相關試驗報告。	檢查紀錄 自主檢查表
	1.吊放避免碰撞毀損。 2.儲放場地不得影響施工。	檢查紀錄 自主檢查表
	1.依據圖說放樣開挖，訂樣板，拉水線控制坡高。 2.底層土方整平夯實。	檢查紀錄 自主檢查表
	1.底部鋪設墊層。 2.吊放安裝	檢查紀錄 自主檢查表
	1.拉水線校正。 2.有孔管之開孔朝上。 3.白塞管之白塞端置於上游。 4.管內部雜物清除。	檢查紀錄 自主檢查表
	1.管兩側回填高度應相同。管底下空隙應完全填滿，回填材料應壓實。 2.管頂加築至[30cm]厚之路堤，並應於引進任何荷重通過管頂前充分壓實之。	檢查紀錄 自主檢查表
	1.現地密度試驗需符號契約規定	檢查紀錄 自主檢查表

表 五-23 假設工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[現場測量與放樣] --> B[現場規劃與機具進場] B --> C{整地} C -- NO --> B C -- YES --> D[施工用臨時水電設施及維護] D --> E[工務所及施工圍籬及辦公設備] E --> F[洗車沖洗設備] F --> G[工程標示牌] </pre>	1.圍籬型式、高度、大門寬度 是否符合規範	自主檢查表
	1.工務所是否設置 2.工務所設備是否設置完備	自主檢查表
	1.臨時電源是否設置完備 2.臨時用水源是否設置完備 3.工程告示牌是否依工程會 規定格式設置	自主檢查表

表 五-24 電力設備工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[作業開始] --> B[施工計畫] B --> C[材料選定] C --> D{進料檢驗} D -- 不合格 --> E[退貨運離工地] D -- 合格 --> F[設備定位 管路配置 佈線施做] F --> G{施工檢驗} G -- 不合格 --> F G -- 合格 --> H[完成] </pre>	1.配電盤規格、數量是否合於設計圖面 2.盤面是否平齊	自主檢查表
	1.盤面固定及箱體固定是否符合規定 2.CABLE 是否整線、固定、標示 3.內部器具是否清潔 4.門鎖是否完好操作是否正常 5.旋鈕開關是否動作正常接地是否良好	檢驗報告
	1.現場易燃物有無清理 2.配電箱與配管交接處是否形成光滑面	自主檢查表 檢查紀錄

表 五-25 器具設備施工檢驗程序

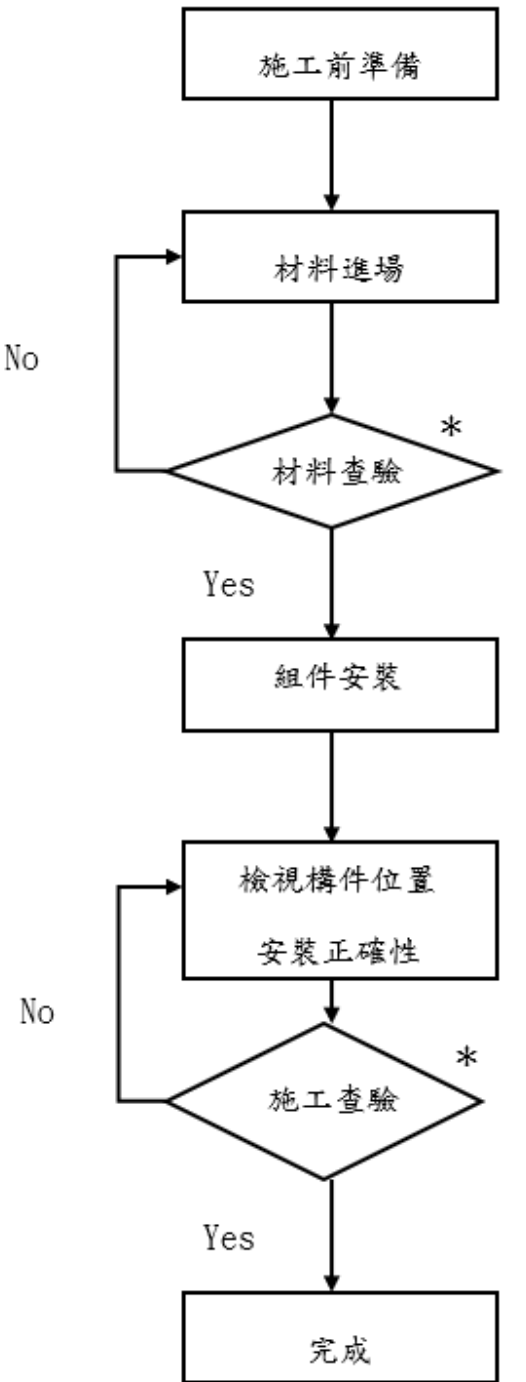
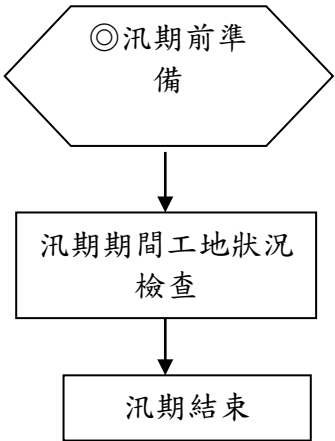
作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
 <pre> graph TD A[施工前準備] --> B[材料進場] B --> C{材料查驗*} C -- No --> B C -- Yes --> D[組件安裝] D --> E[檢視構件位置 安裝正確性] E --> F{施工查驗*} F -- No --> E F -- Yes --> G[完成] </pre> The flowchart illustrates the construction inspection process for equipment installation. It begins with '施工前準備' (Preparation before construction), followed by '材料進場' (Material arrival). A decision point '材料查驗*' (Material inspection*) follows; if 'No', it loops back to '材料進場'; if 'Yes', it proceeds to '組件安裝' (Component installation). This is followed by '檢視構件位置 安裝正確性' (Check component position, correct installation). Another decision point '施工查驗*' (Construction inspection*) follows; if 'No', it loops back to '檢視構件位置 安裝正確性'; if 'Yes', it proceeds to '完成' (Completion).	1. 確認施工位置 2. 按設計圖施作	自主檢查表

表 五-26 濕式壓花地坪工程施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[測量放樣] B --> C[底層處理] C --> D[混凝土澆置] D --> E{整區基地抽查} E -- NO --> D E -- YES --> F[壓製過程] F --> G{壓花地坪抽查} G -- NO --> F G -- YES --> H[保養] H --> I[完成] </pre>	1. 確認施工地點 2. 按設計圖施作	自主檢查表
	1. 測定施工範圍 2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正	檢驗報告
	1. 澆置順序須妥善規劃及執行 2. 作業人員的分配及搗實須妥善 3. 澆置高度，厚度及水平須符合圖說規定 4. 施工縫妥善處理以維持接合面連結強度 5. 洩落高度超過 1.5m 須使用漏斗	自主檢查表 檢查紀錄
	1. 混凝土初凝前，表面鏟平再均勻撒佈彩色壓花料，壓花料能滲入混凝土層 2. 初凝後再撒佈彩色脫模劑，需掌握時間放置，否則逾時後混凝土乾枯，無法壓印 3. 壓印 7 天後以高壓水沖洗，噴上透明封面劑，形成保護層	
	養護達 28 天，始開放使用	

表 五-27 汛期防災施工檢驗程序

作業流程圖	檢查要點	相關記錄/文件
 <pre> graph TD A{{◎汛期前準備}} --> B[汛期期間工地狀況檢查] B --> C[汛期結束] </pre>	1.防救災文件資料 2.防救災措施應變準備	自主檢查表
	1.工地臨時構造物 2.工地排水設施 3.工地大型機械設備 4.工地開挖及土石挖填方 5.工地水文及邊坡變化 6.工地防汛缺口 7.工地垃圾、雜物及廢棄物 8.工地施工器材 9.工地電力系統 10 工地房舍、辦公室及倉庫	自主檢查表

三、應用表單

表 五-28 材料設備送審管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.一.5	M3	是	本工項施工前 提送	否	經 TAF 認證實驗室			V	V	土壤夯實試驗		
	基地及路堤填築	1,295											
2	壹.一.7	M	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證 測驗報告型錄	V	V	V		品質保證		
	PVC 披覆鐵絲網柵欄 鍍鋅鋼管支柱	624M											
3	壹.一.7、壹.一.7R.3 壹. 二.4.3 壹.二.4.4 貳.一.5 貳. 一.6	m3	是	本工項施工前 提送	否	經 TAF 認證實驗室	預拌 混凝土 廠	V	V		配比		
	結構用混凝土，預拌， 140kgf/cm2												
4	壹.二.1.3.4 壹.二.1.4 壹. 二.1.7 壹.二.1.5 壹.二.1.7 壹.二.1.8 壹.二.1.9 壹. 二.1.16 壹.二.1.21 壹. 二.1.22 壹.二.1.33 壹. 二.2.3 壹.二.2.7 壹.二.2.8 壹.二.2.9 壹.二.4.3 壹. 二.4.4 壹.二.4.7 壹.二.4.8 壹.二.4.9 壹.二.4.12 貳.三.5 貳.四.1	m3	是	本工項施工前 提送	否	經 TAF 認證實驗室	預拌混 凝土廠	V	V		配比		
	結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm2												

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
5	壹.二.1.14、壹.二.1.15 壹.二.1.14R.2 壹.二.1.16、壹.二.2.3 壹.二.2.7、壹.二.2.8 壹.二.2.9、壹.二.4.12 貳.三.5、貳.四.1	T	是	本工項施工前 提送	否	經 TAF 認證實驗室	V		V		品質保證/無輻射證明		
	鋼筋，SD280/420 連工帶料												
6	壹.二.1.11	m3	否	本工項施工前 提送	否	經 TAF 認證實驗室	V	V	V		品質保證		
	瀝青混凝土												
7	壹.二.1.3、壹.二.1.3R.3 壹.二.1.4、壹.二.1.5	M2	是	本工項施工前 提送	否	經 TAF 認證實驗室	V	V	V		品質保證/無輻射證明		
	銲接鋼線網，D=6.00mm，20x20cm												
8	壹.二.1.7~9	M	是	本工項施工前 提送	否	經 TAF 認證實驗室 廠商資格登記 證測驗報告、型錄	V	V	V		品質保證		
	預鑄路緣石 A 型 路緣石 B 型 路緣石 C 型	572M 568M 1290M											
9	壹.二.1.10	M	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記 證、測驗報告、型錄	V	V	V		品質保證		
	緣石，鋼板緣石	24M											
10	壹.二.1.12~13		否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記 證、測驗報告、型錄	V	V	V		品質保證		

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	鍍鋅鋼網圍籬 H=3.08m 鍍鋅鋼網圍籬雙開門												
11	壹.二.1.21~27	式	否	本工項施工前 提送	是	廠商資格登記證 測驗報告 型錄	V	V	V		品質保證		
	兒童遊戲場設備: 彈性橡膠地墊 t=9cm 彈性橡膠地墊 t=4.5cm 鋪面收邊 2.5cm 人工草皮 樹皮塊地坪 礫石地坪黑色隔草板	5 M2 93 M2 34M 83M2 130M2 3495M 1M2											
12	壹.二.3.1~9	座	否	本工項施工前 提送	是	廠商資格登記證 測驗報告 型錄	V	V	V		品質保證		
	兒童遊戲場設備: 划船器、雙人浪板器 雙人漫步機 高中低單槓 230-200-170cm 彈跳床、150*W150cm 極限旋轉飛輪 擺盪大索、攀爬繩網	各一座											
13	壹.二.2..1~13	座	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證 測驗報告 型錄	V	V	V		品質保證		

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	粗木作: 砂坑塑木花架座 1 座 砂坑塑木花架雨 1 座 砂坑塑木木平台 1 座 塑木花廊架鋼構 1 座 塑木花廊架 1 座 塑木花廊架雙面椅 5 座 塑木靠背座椅 5 座 塑木座椅 A 10 座 塑木座椅 B 1 座 洗手台塑木踏板 1 座 攀爬架 A 1 座 攀爬架 B 1 座 圓柱攀爬架 1 座	1 座 1 座 1 座 1 座 1 座 5 座 5 座 10 座 1 座 1 座 1 座 1 座 1 座											
14	壹.二.4.6	M	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證 測驗報告型錄	V	V	V		品質保證		
	排水管溝 HDPE 水網管	842M											
15	壹.二.4.7~9	M	否	本工項施工前 提送	否	商資格登記證 測驗報告型錄	V	V	V		品質保證		
	排水管溝 3"PVC 管 2"PVC 管 4"污水用 PVC77M 管	81M 117M											
16	壹.二.4.13	組	否	本工項施工前 提送	否	商資格登記證 測驗報告型錄	V	V	V		品質保證		
	鍍鋅隔柵 (w=50cm)	24 組											

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
17	壹.三.1~18	株	否	本工項施工前 提送	是	廠商資格登記 證，型錄	V	V	V				
	植樹杜英 24 株、樟樹 56 株、烏白 13 株、青剛櫟 11 株、洋紅風鈴木 5 株、黃花風鈴木 9 株、台灣欖木 7 株、茄苳 32 株、青楓 6 株、光臘樹 20 株、雀榕 3 株、台灣欖樹 6 株、流蘇 5 株、藍花楹 11 株、羅漢松 38 株、月橘 361 株、厚葉石斑木 40 株	24 株、 56 株、 13 株、 11 株、 5 株、 9 株、 7 株、 32 株、 6 株、 20 株、 3 株、 6 株、 5 株、 11 株、 38 株、 361 株、 40 株									品質保證(保活)		
18	壹.三.18~19	株	否	本工項施工前 提送	是	廠商資格登記 證，型錄	V	V	V		品質保證(保活)		
	植樹月橘 361 株 厚葉石斑木 400 株	361 株 400 株											
19	壹.三.20	M2	否	本工項施工前 提送	是	廠商資格登記 證，型錄	V	V	V		品質保證(保活)		
	植草假儉草	11107											
20	壹.四.2~7	組	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記 證，型錄	V	V	V		品質保證(保		

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
											活)		
	照明燈具，停車場單燈照明燈具，景觀高燈照明燈具，景觀柱燈照明燈具，籃球場投光燈照明燈具，多向性投光燈照明燈具，投光燈	8 組 27 組 30 組 6 組 8 組 9 組											
21	壹.四.8~11	M	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證，型錄	V	V	V		品質保證(保活)		
	XLPE 電纜線 5.5mm2*2C 600V PVC WIRE 接地線 3.5mm2 600V PVC PIPE φ 41mm PVC 電纜線 3.5mm2* 3/C 開關箱至 TPC 管線	1,834M 1,834M 1,834M 461M 2 處											
22	貳.一.1	面	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證	V	V	V		品質保證(保活)		
	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，長 300x 寬 170cm，基礎及現場裝拆(含維護)	2											
23	貳.一.3	式	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證	V	V	V		廠商資格登記證		
	工地臨時建築設施，工地辦公室及設備	1											
24	貳.一.4	式	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證	V	V	V		廠商資格登記		

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否廠驗	預定試驗單位	送審資料					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	廠驗日期		協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	工地臨時建築設施，守衛亭，鋁製										證		
25	貳.一.5	M	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證	V	V	V		廠商資格登記證		
	施工圍籬，全阻隔式固定(第一級營建工程)，含(頂部)警告燈，折舊	966											
26	貳.一.6	M	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證	V	V	V		廠商資格登記證		
	施工圍籬，半阻隔式固定(第一級營建工程)，含(頂部)警告燈，折舊	257											
27	貳.一.13	式	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證	V	V	V		廠商資格登記證		
	工地即時監控系統	1											
28	貳.三.1~6	式	否	本工項施工前 提送	否	廠商資格登記證	V	V	V		廠商資格登記證		
	活動型拒馬(含警示燈) 施工標誌(附掛式) 施工警告標示牌(含基礎) 施工警告燈號(租用) 紐澤西護欄，預鑄混凝土 交通錐(含連桿)	20 座 20 座 10 座 30 個 5 座 50 個											

註：本表單於開工後依預定送審及預定進場日期，會同監造機關定期檢討辦理情形。

表 五-29 材料設備檢(試)驗管制總表

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽(取)樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
1	壹.一.5	M3			4 次				
	基地及路堤填築 工地密度試驗 土壤夯實試驗	1,295							
2	壹.一.7、 壹.一.7R.3 壹.二.4.3 壹.二.4.4、貳.一.5 貳.一.6	組			1.同一日澆置之混凝土，每一種配比以[100 m3]，每批至少應進行一組強度試驗，若每一種配比有餘數超過[40 m3][100 m2]時應增加一組試體，每天每種規格混凝土至少進行強度試驗一次。同一工程之同一種配比混凝土的總數量在[40m3]以下，且有資料可供參考者，得於事先徵得工程司之書面同意下，免作強度試驗 2.坍度試驗頻率不得少於抗壓強度試驗組數。				
	結構用混凝土，預拌， 140kgf/cm2	6							

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽（取）樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
3	壹.二.1.3R.4 壹.二.1.4、壹.二.1.7 壹.二.1.5、壹.二.1.7 壹.二.1.8、壹.二.1.9 壹.二.1.16、壹.二.1.21 壹.二.1.22、壹.二.1.33 壹.二.2.3、壹.二.2.7 壹.二.2.8、壹.二.2.9 壹.二.4.3、壹.二.4.4 壹.二.4.7、壹.二.4.8 壹.二.4.9、壹.二.4.12 貳.三.5、貳.四.1	組			1.同一日澆置之混凝土，每一種配比以[100 m3]，每批至少應進行一組強度試驗，若每一種配比有餘數超過[40 m3][100 m2]時應增加一組試體，每天每種規格混凝土至少進行強度試驗一次。同一工程之同一種配比混凝土的總數量在[40m3]以下，且有資料可供參考者，得於事先徵得工程司之書面同意				
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	12			下，免作強度試驗 2.坍度試驗頻率不得少於抗壓強度試驗組數。				
4	貳.二.5	件			500M2 一組				
	瀝青混凝土黏滯度試驗	2							

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽（取）樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
5	壹.二.1.14、壹.二.1.15 壹.二.1.14R.2 壹.二.1.16、壹.二.2.3 壹.二.2.7、壹.二.2.8 壹.二.2.9、壹.二.4.12 貳.三.5、貳.四.1	支			同一形狀尺度之鋼筋，每25T(不足 25T，以 25T計)，取樣 1 支。				
	竹節鋼筋拉伸試驗	3							
6	貳.二.6	件							
	木業類檢驗，比重試驗 CNS 13333-1(2015)	1							
1	貳.二.7	件							
	銲接鋼線網， D=6.00mm，20x20cm	6							
8	貳.二.8	組							
	CNS12642 公共兒童遊戲場設備	5							
9	貳.二.9	組							
	CNS12643-2 遊戲場鋪面材料	5							
10	貳.二.10	組							
	高壓混凝土磚-抗壓試驗	3							

項次	契約詳細表項次	契約數量	進場日期	抽樣日期	規定抽（取）樣頻率	累積進場數量	檢(試)驗結果	檢(試)驗及會同人員	備註
	材料(設備)名稱		進場數量	抽樣數量		累積抽樣數量			(歸檔編號)
11	貳.二.11	片							
	木紋版-抗壓強度試驗	3							
12	貳.二.12	片							
	木紋版-抗彎強度試驗	3							
13	貳.二.13	片							
	木紋版-防滑係數試驗	3							
	其它材料設備檢驗及抽驗費	1							

註：本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情

表 五-30 材料/檢驗申請單

編號：EM-

工程名稱	桃園市第47期桃園區中平市地重劃工程		送審 次數	
承包商				
材料名稱	☐ 樣品 ☐ 試驗 ☐ 其他：			
申請日期	年 月 日 午 時			
檢驗地點	☐ 試驗室： ☐ 現場檢驗：			
施工位置				
預定施工日期	年 月 日 午 時			
依據	☐ 圖說編號：		☐ 合約：	
	☐ 施工說明書：		☐ 其他：	
說明	材料名稱及數量			
	材料名稱：			
	單 位：			
	數 量：			
檢驗結果	☐ 合格 ☐ 不合格，須再送審 ☐ 免檢驗 ☐ 不合格，不合格報告書編號			
備註				
承包商			監造單位	

表 五-31 材料/設備品質自主檢查表

編號：EM-

工程名稱	桃園市第47 期桃園區中平市地重劃工程			
材料/設備名稱			檢驗日期	年 月 日
檢驗 項目	品質管理標準	檢驗數量	檢驗值	檢驗結果
說 明	1『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較，填寫『合格』、『不合格』、『符合』、『不符合』..等。 2檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第 項進行追蹤改善。			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 五-33 施工抽查(驗)申請單

申請日期： 年 月 日 表單編號： _____

工程名稱		桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程			
承包廠商		五嶺營造有限公司			
申請日期/時間		年 月 日 午 時 分			
預定檢驗日期/時間		年 月 日 午 時 分			
檢驗項目					
檢驗地點					
檢驗次數	☐ 初次申請				
	☐ 申請複驗	上次申請單編號：			
	☐ 列管追蹤項目	異常(不符合)通知暨改善表編號：			
承包商自主檢查	檢查時間	年 月 日 午 時 分			
	自主檢查表編號	(自主檢查表附於本單後)			
	現場工程師				
監造單位 檢驗紀錄	檢查時間	年 月 日 午 時 分			
	檢 查 結 果	☐ 合格 ☐ 不合格(請參閱自主檢查表內容)			
	依工程項目申請	☐ 准予施工 ☐ 不准施工，請重新申請檢查			
	監造現場人員				
備 註					
承包商：		監造單位：			

本表乙式二份：一份監造單位、一份承包商。
經監造單位檢查合格後，承包商即得進行後續作業。

表 五-34 混凝土澆置申請單

申請日期： 年 月 日 表單編號： _____

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
結構物/位置		結構部位	
拌合廠		設計強度	kg/cm ²
申請編號			
1.澆注數量 立方公尺(m ³) 2.攪拌車數： 部 3.預定澆注時間： 4.混凝土配比 配比編號 添加劑： ☐ 是 ☐ 否 種類： 配比設計強度 kg/cm ² 坍度 cm 5.本申請依 年 月 日 編號 檢驗合格記錄表提出			
結果： ☐ 同意 ☐ 改善後再申請			
說明： 主體工程混凝土澆注前，承包商應注意下列事項： 1.澆注程序 2.機具作業(含備用量) 3.人力配置 4.拌合廠作業能量，含水泥、粒料存量及輸送車 5.故障應變處理 6.照明設備 7.安全檢查等項目。 8.其他等項目			
承包商：		監造單位：	

1.本項申請應於澆注前一日提出。

2.本申請單乙式二份由承包商填具提送監造單位，核准後，監造單位留存一份，另一份退還承包商自存。

表 五-35 材料及設備品質管理標準表

項次	材料名稱	檢驗項目	檢驗總次數	依據規範及要求	檢驗頻率	不合格處理方式
1	基地及路堤填築 (第 02331 章)	材料	1	ASTM D2487—最大粒徑不得大於10 cm。	每500m ³ 1次	挖除
		壓實度	道路 (每層 30cm)	AASHTO T191	每一層面積每100m ² 檢驗一次。	再行滾壓
			其他用地 (每層 50cm)	AASHTO T180試驗所得最大乾密度之90%以上		再行滾壓
2	碎石級配料底層 (第 02726 章)	級配	2 每一層填方 共計 7.5 m ³	CNS 486(級配規格表) 應符合設計圖說及本章之規定。	每600m ³ 檢驗1次。	挖除
		材料品質	1	磨損率不得大於50%，通過試驗篩孔寬0.425mm之部分，液限指數不得大於25%，塑性指數不的大於6%。	每一料源至少一次	挖除
		壓實度	每一層填方 共計 15m ³	CNS 11777-1最大乾密度之95%以上(若含有粗粒料則以CNS 14732修正)。	每一層填方數量至少應每1,000m ² 做密度試驗一次。	再行滾壓
		厚度	15cm	個別值與設計厚度偏差≤1.0cm 平均值≥設計厚度		再行滾壓
		頂面平整度	1	任一點之高低差≤1.5cm。	全面目視檢視，懷疑處以3m直規檢測。	再行滾壓

項次	材料名稱	檢驗項目	檢驗總次數	依據規範及要求	檢驗頻率	不合格處理方式
3	瀝青混凝土 鋪面 (第 02742 章)	厚度	每次鋪築後	任一點厚度不得少於設計厚度10%	同一種規格完成後 每 1000 m ² 或一批鑽取 一件樣品	重新滾壓
		平整度	每次鋪築後	以3m長之直規或高低平坦儀量測道路平整度時，應沿平行於，或垂直於路中心線之方向檢測時，其任何一點高低差，底層或結合層不得超過±0.6cm，平整度標準差(S)不得大於0.26cm；一般公路之面層不得超過±0.6cm，平整度標準差(S)不得大於0.26cm	鋪築後之路面	重新滾壓
		壓實度	每次鋪築後	瀝青混凝土應滾壓至設計圖說所規定之壓實度。如無明確規定時，應依美國瀝青學會AI SS-1第3.17節1992年版之規定，用馬歇爾夯壓方法每天在室內做6個試體之夯壓試驗求其平均密度，然後做5處工地密度試驗求其平均值，該平均值應達到室內平均密度之96%以上，且任一工地密度不得低於室內平均密度之94%	鋪築後之路面	重新滾壓
4	鋼筋 (第 03210 章)	抗拉強度 抗彎強度 伸長率	共計 17T 每 25T 及 每批一次	1. 須符合CNS560 A2006及 CNS479 A3002規定。 2. 廠商資料、鋼筋之檢驗報告、出廠證明及由原子能委員會所發之「鋼鐵業輻射偵檢作業合格證明書」。	每 25T 若不足 25T 則 每批一次。	不得進場

項次	材料名稱	檢驗項目	檢驗總次數	依據規範及要求	檢驗頻率	不合格處理方式
5	預拌混凝土 (第 03050 章)(第 03310 章)	水溶性氯離子含量	每次澆置時或各部位結構水泥澆置時	CNS 3090 鋼筋混凝土：最大 0.15 kg/m ³ 。	每批次。	運離工地不予澆置
		塌度試驗	每次澆置時或各部位結構水泥澆置時	CNS 1176 依設計圖說及施工規範要求。	不得少於抗壓強度試驗組數。	運離工地不予澆置
		抗壓強度	各部位結構水泥澆置時所製作之試體	CNS 1174、CNS 1231 依設計圖說及施工規範要求。	連續澆置之混凝土，每一種配比每 120 m ³ 或 450 m ³ 至少取樣一組。每組取樣至少製作 3 個試體。	進行缺失改善
6	電線 (第 16120 章)	材質	XLPE 電纜線 5.5mm ² *2C 600V(含損耗) PVC WIRE 接地線 3.5mm ² 600V(含損耗) PVC PIPE ϕ 41mm(含損耗)各 1834 /M	符合設計圖說規定	免抽驗(應檢附檢驗合格證明文件)。	退貨
		材質	PVC 電纜線 3.5mm ² * 3/C×電纜共 461M	符合設計圖說規定	免抽驗(應檢附檢驗合格證明文件)。	退貨
7	照明設備 (第 16526 章)	型式試驗	停車場單燈 8 組 景觀高燈 27 組 景觀柱燈 30 組 籃球場投光燈 6 組 多向性投光燈 8 組 投光燈 9 組	符合設計圖說規定	免抽驗(應檢附檢驗合格證明文件)。	退貨
		保護等級		符合設計圖說規定		退貨
8	鍍鋅格柵板 (設計圖號 57)	材料	共 24 組	鐵／鋼料：應依據契約圖說，並符合 CNS 2473 及相關之規定 鍍鋅量：500g/m ²	免抽驗(應檢附檢驗合格證明文件)。	退貨
		鍍鋅量				不予使用

項次	材料名稱	檢驗項目	檢驗總次數	依據規範及要求	檢驗頻率	不合格處理方式
9	透水性鋪面，	材質	鋪面磚(高壓)，警 示磚 29 m2 鋪面磚(高壓)，高 壓混凝土磚 4,144	一般面符合設計圖說規定	免抽驗(應檢附檢驗 合格證明文件)。	進行缺失改善

第六章 設備功能運轉測試程序及標準

一、設備功能運轉測試檢測程序

設備運達工地安裝後須加以檢測測試，工地檢驗測試分為單機設備檢測、系統運轉檢測、整體功能試運轉檢測。

(一)單機設備檢測

1. 設備進場前檢查：包括製造圖之核可、各項材料規格審查及是否廠驗或公證程序等。
2. 設備進場及施工（安裝）過程之檢查：相關出廠證明、測試報告、施工圖說等。
3. 功能檢測：試壓及試漏、機械性能測試、電器性能測試、儀控測試、各設備安全防護功能測試等。

(二)系統運轉檢測

所有設備經單機設備檢測符合後，加入系統後，須再經系統運轉檢測，以驗證各系統均能符合契約文件所要求之功能，其主要內容如下：

1. 個別系統之獨立功能測試。
2. 系統組合測試。
3. 系統清理及排放測試。
4. 系統及單機設備協合運作狀況。
5. 各系統及單機設備故障或異常時對系統之影響及隔離能力。
6. 系統運作之故障回復能力。

(三)整體功能試運轉檢測

於工地施行單機設備檢測及系統運轉檢測通過後，即可進行整體功能試運轉檢測，實施整體系統連結整合檢測前，應依工程設備之性質，檢討訂定相關測試計畫及所應提交監造單位之測試紀錄、報告：

1. 全程操作及調整紀錄。

2. 功能異常時之檢測報告書。
3. 完整之試運轉報告書。
4. 各種不同操作模式，包括最佳之操作模式。
5. 試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫。

整體功能試運轉測試主要檢驗系統各功能模組組合後之軟、硬體，能否符合契約文件所要求之功能，其主要內容如下：

1. 各系統及單機設備協合運作狀況。
2. 各系統及單機設備故障或異常時對系統之影響及隔離能力。
3. 系統運作之故障回復能力。
4. 系統整合運作之反應時間驗證。
5. 系統使用者的便利性。

(四)設備運轉檢測流程

本工程之設備功能運轉測試流程如圖 6-1，其重點說明如下：

1. 辦理單機運轉檢測，依檢測結果合格接續進行系統運轉檢測。
2. 辦理系統運轉檢測，依檢測結果合格接續進行整體功能運轉檢測。
3. 於整體功能試運轉檢測前提出設備試運轉計畫送監造機關審查。
4. 試運轉計畫書經監造機關審查並經業主核備後，方得進行設備測試及試運轉工作。
5. 運轉測試期間會同監造機關依設備功能運轉測試抽驗流程及抽驗點辦理抽驗。
6. 運轉測試或抽驗結果，如有不符規範者，提出改善計畫，並於審查認可後據以實施。
7. 完成改善後，應再進行運轉測試。
8. 運轉測試及抽驗結果均符合需求後，將運轉測試相關紀錄及測試報告提送監造機關報工程主辦機關備查。

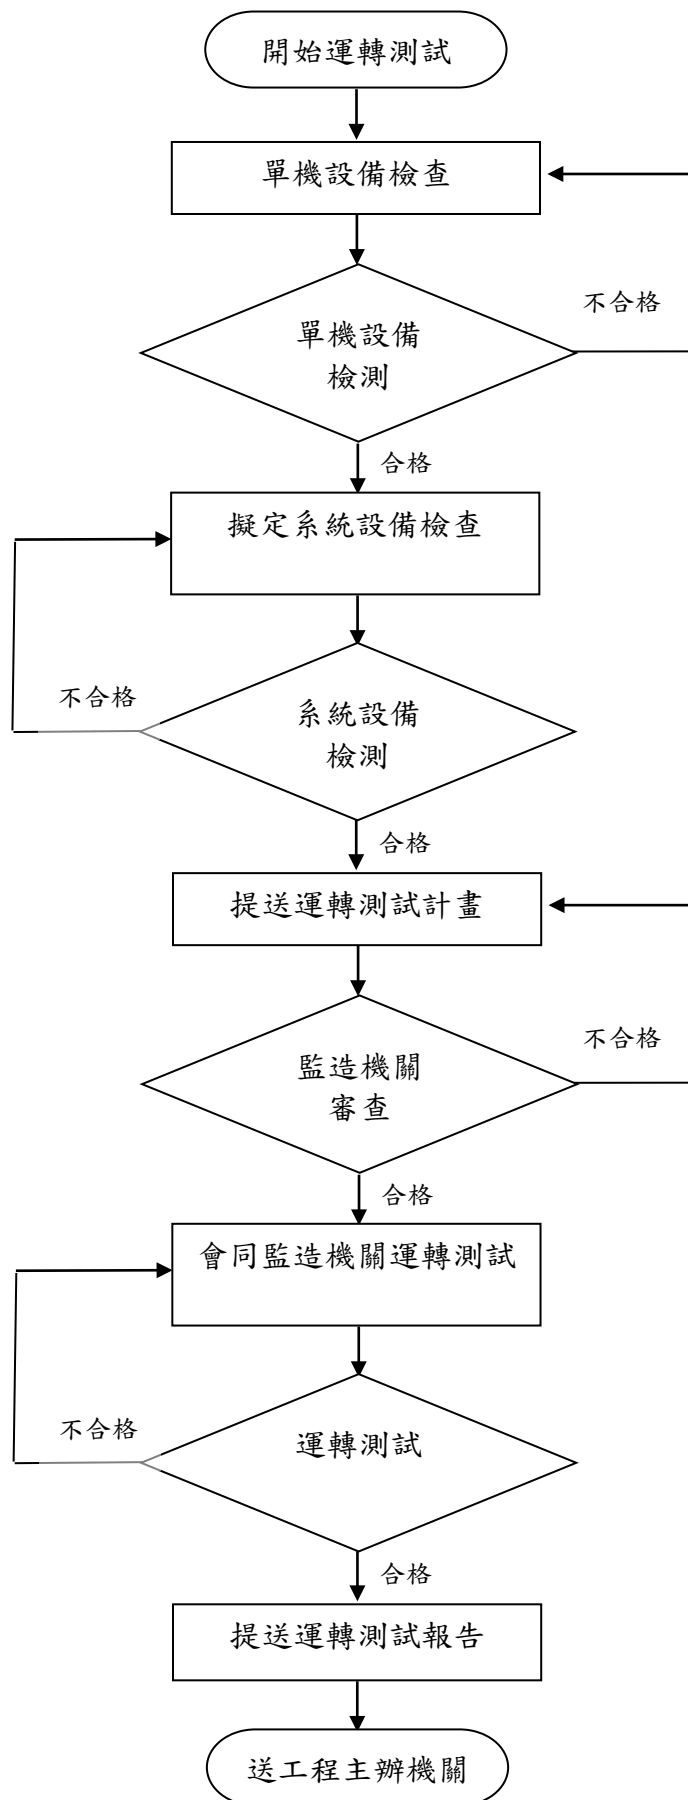


圖 六-1 設備功能運轉檢測流程圖

二、設備功能運轉測試檢驗標準

各項設備之單機、系統、整體功能運轉測試及抽驗結果，應符合工程契約規定詳表 6-1，並將測試及檢驗結果填報「設備功能運轉自主檢測測試紀錄表」（如表六-2）。

表 六-1 設備功能運轉檢驗標準表

測試流程	管理項目	管理標準	檢驗時機	檢驗方法	檢驗頻率	不符合之處理	管理紀錄	備註
	滅火器設備	有效期限內	施工前	目視	不定期	更換新設備	-	
單體測試	亮燈情形	路燈正常點亮	施工後	目視	1/10	立即改善	單體測試紀錄表	
	漏電反應測試	測試漏電斷路器是否正常運作	施工後	操作測試	1/10	立即改善	單體測試紀錄表	
整體檢視	亮燈情形	路燈正常點亮	台電送電後	目視	每一處	立即改善	整體測試記錄表	
	炫光、閃爍	無炫光、閃爍之情形	台電送電後	目視	每一處	立即改善	單體測試紀錄表	
	絕緣電阻	10 mΩ	施工後	操作測試	1/10	立即改善	自主檢查表	
	接地電阻	50 Ω	施工後	操作測試	1/10	立即改善	自主檢查表	
	漏電斷路器	30 mA	施工中	目視	每一處	立即改善	自主檢查表	
	配電盤	20AF/20AT	施工後	操作測試	每一處	立即改善	自主檢查表	

三、應用表單

表 六-2 照明設備功能運轉抽驗標準表

工項	測試流程	管理項目	管理標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不合格之處理	管理紀錄	備註
照明設備	單機測試	燈具	道路平均照度不得小於15勒克斯(Lux)	施工後	照度計	每款/支	改正	測試表	
	系統測試 (手動運轉)	燈具	是否運轉穩定且手動迴路供電是否正常及燈號顯示	施工後	目視	全 面 檢 查	改善	測試表	
	系統測試 (自動運轉)	燈具	連續性試驗:24 小時檢查迴路施工後是否結合相通良好	施工後	計時器	全 面 檢 查	改善	測試表	
	系統測試 (手動運轉)	燈具	點滅系統測試：以點燈3小時，熄燈 1 小時之週期，持續進行 6 次，且所有元件不得有裂痕、任一個 LED 燈不得有不亮或閃爍之失效狀況	施工後	計時器	全 面 檢 查	改善	測試表	

表 六-3 設備功能運轉檢測自主檢查表

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
檢查位置		檢查日期	
施工流程	☐ 單機測試 ☐ 系統測試 ☐ 整體功能運轉測試		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	檢查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
燈具	道路平均照度不得小於 15 勒克斯(Lux)		
燈具(手動運轉)	是否運轉穩定且手動迴路供電是否正常及燈號顯示		
燈具(自動運轉)	連續性試驗：24 小時檢查，迴路施工後是否結合相通良好		
燈具	點滅系統測試：以點燈 3 小時，熄燈 1 小時之週期，持續進行 6 次，且所有元件不得有裂痕、任一個 LED 燈不得有不亮或閃爍之失效狀況		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任：

檢查人員：

第七章 自主檢查表

一、自主檢查表之訂定

為達成工程品質目標，本公司建立各項施工品質系統，針對各項作業訂定自主檢查表，由品管人員及現場工程師按表列逐項進行檢查，俾能及時發現缺失，並予以矯正，以確保工程品質。訂定之自主檢查表項目，如「各分項工程自主檢查一覽表」(表 7-1)所列。

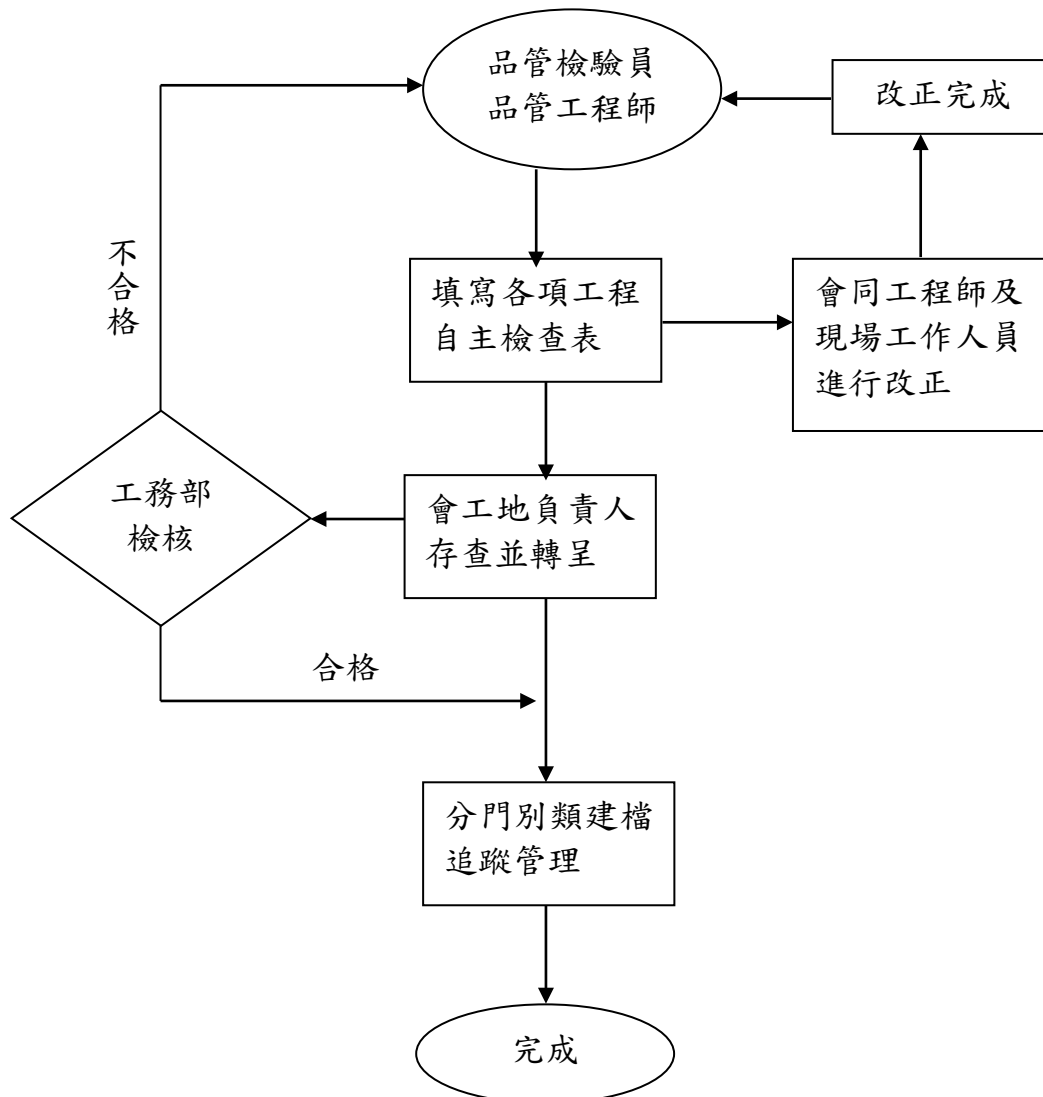


圖 七-1 工程施工品質自主檢查流程圖

二、自主檢查表之執行

(一)執行人員及時機：

為落實各施工及監工人員確實掌控施工過程及各項工作之品質狀況，由施工專業分包商及現場工程師按表逐項確實進行自我檢查，自行檢驗管制可能發生之缺失，以為施工缺失改善之依據，且便於保存及查閱。表格如有新增或修改需報業主代表同意後方可使用新版，並將舊版依程序作廢。

(二)不符合情形處置及管制方式：

依自主檢查表檢查時，如有不符合情形，需執行改善，對於可立即改正之缺失，應立即改正，並紀錄於自主檢查表內。若有屬重大異常之缺失，應依第八章之「不合格品之管制」章節之規定辦理。進行改正補救或拆除重作，並依第九章「矯正與預防措施執行改善」，經統計分析結果，對於不合格頻率高之作業項目，需依第九章矯正與預防措施執行改善，並追蹤管理，使工程施工順利提高施工效率及效能。

三、應用表單

表 七-1 主要施工項目施工自主檢查一覽表

項目	自主檢查名稱	備註
一、	交通臨時安全措施工程施工自主檢查表	表 7-2
二、	土方開挖工程施工自主檢查表	表 7-3
三、	道路工程工程施工自主檢查表	表 7-4
四、	測量工程工程施工自主檢查表	表 7-5
五、	瀝青混凝土鋪築工程施工自主檢查表	表 7-6
六、	測量工程工程施工自主檢查表	表 7-7
七、	鋼筋工程工程施工自主檢查表	表 7-8
八、	模板工程工程施工自主檢查表	表 7-9
九、	混凝土澆注工程施工自主檢查表	表 7-10
十、	照明工程工程施工自主檢查表	表 7-11
十一、	鍍鋅鋼網圍籬工程施工自主檢查表	表 7-12
十二、	植栽工程工程施工自主檢查表	表 7-13
十三、	兒童遊戲場設備工程施工自主檢查表	表 7-14
十四、	預鑄路緣石工程施工自主檢查表	表 7-15
十五、	鋪面磚(高壓)，警示磚、高壓混凝土磚 工程施工自主檢查表	表 7-16
十六、	磨石子工程工程施工自主檢查表	表 7-17
十七、	抵石子工程工程施工自主檢查表	表 7-18
十八、	彈性無縫鋪面工程工程施工自主檢查表	表 7-19
十九、	地坪工程工程施工自主檢查表	表 7-20
二十、	磁磚工程工程施工自主檢查表	表 7-21
二十一、	木作工程工程施工自主檢查表	表 7-22
二十二、	排水工程工程工程施工自主檢查表	表 7-23
二十三、	假設工程工程施工自主檢查表	表 7-24
二十四、	電力配線工程工程施工自主檢查表	表 7-25
二十五、	器具設備工程施工自主檢查表	表 7-26
二十六、	汛期工地防災減災自主檢查表	表 7-27

表 七-2 施工中交通維持工程施工自主檢查表

編號：EW-01

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱	施工中交通維持	協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準（定量定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果
活動型拒馬(含警示燈)	20 座		
施工標誌(附掛式)	20 座		
施工警告標示牌(含基礎)	10 座		
施工警告燈號(租用)	30 個		
紐澤西護欄，預鑄混凝土	5 座		
交通錐(含連桿)	50 個		
人工旗手(含服裝、指揮棒等)	30 工		
義交(日間，含指揮棒等)	20 時		
活動型拒馬(含警示燈)	1 式		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-3 土方開挖工程施工自主檢查表

編號：EW-02

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
測量與放樣	高程		
交通安全維護	安全措施設置		
基礎開挖	雜草、樹木應先清除		
開挖順序	自上而下依序開挖		
開挖斷面			
填方材料	應與不適用填方之廢土 分開不得混合		
不適用材料	應運離		
餘方處理	暫時堆置或運至合法土 資廠		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

編號：EW-03

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-5 測量工程施工自主檢查表

編號：EW-04

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
位置	N : (±1cm) E : (±1cm)	N : E :	
高程	設計 (±1.5cm)	實測	
高程	設計 (±1.5cm)	實測	
高程	設計 (±1.5cm)	實測	
高程	設計 (±1.5cm)	實測	
高程	設計 (±1.5cm)	實測	
高程	設計 (±1.5cm)	實測	
高程	設計 (±1.5cm)	實測	
厚度/高度	設計	實測	
寬度	設計	實測	
長度	設計	實測	
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-6 瀝青混凝土鋪築工程施工自主檢查表

編號：EW-05

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
瀝青透層	表面需保持良好之潔淨狀態		
瀝青透層	中凝油溶瀝青(MC-70)使用量 0.9~2.3 L/m ²		
瀝青黏層	表面需保持良好之潔淨狀態		
瀝青黏層	使用量 0.11~0.35L/m ²		
瀝青混凝土施工天氣	施工應於晴天且氣溫應高於 10°C 以上		
路基面平整度、坡度及清潔度	路基面或級配粒料底層面平整，一切浮鬆材料、塵土，無積水		
滾壓機具	自走式鐵輪壓路機 膠輪壓路機		
滾壓速度	鐵輪壓路機：初壓 ≤ 3 km/hr 其餘 ≤ 5 km/hr 膠輪壓路機：≤ 5 km/hr。與初壓壓路機之距離為 60m		
分層鋪築	縱向接縫 ≥ 15cm 橫向接縫 ≥ 60cm		
鋪築時之溫度	瀝青混合料倒入鋪築機不得低於 120°C		
滾壓次序	由車道外側邊緣開始逐漸向路中心滾壓		
壓路機與鋪築機距離	壓路機緊隨鋪築機後，距離不超過 60 m		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-7 鋼筋工程施工自主檢查表

編號：EW-06

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
彎曲	必須以樣板或彎筋機冷彎		
鋼筋潔淨、無銹	無銹蝕、浮銹、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞		
鋼筋尺寸、綁紮間	施作前須標準值化		
各部鋼筋組立狀態	確保鋼筋位置正確、組立須牢固。		
搭接位置	搭接位置不可全數在同一位置，應予交錯排列並避免在結構產生最大拉力或壓力處		
搭接長度	長度： cm		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-8 模板工程施工自主檢查表

編號：EW-07

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
模板型式是否符合	☐ 鋼模 ☐ 清水模 ☐ 普通模		
放樣	應予墨線吻合		
模板內面	無木片、土屑等雜物		
模板面脫模劑之塗佈	合格脫模劑適量均勻塗佈		
垂直度	板面平整保持平直		
模板斷面尺寸與組立位置	寬度 cm、厚度 cm		
開口位置及尺寸	依設計圖說施工		
模板間隙是否修補妥善	以適當方式修補		
繫材螺栓是否妥善	注意間距，繫結牢固		
支撐穩固狀態	垂直固立於堅實之基腳上		
支撐水平繫材	依設計圖說位置及材料		
預埋構件	依設計圖說規定埋設		
鋼筋保護層	☐ 7.5cm 許可差+1.25cm ☐ 5cm 許可差+0.6cm ☐ 2.5cm 許可差+0.3cm		
伸縮縫	2cm 厚填縫版		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-9 混凝土澆注工程施工自主檢查表

編號：EW-08

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
混凝土坍度	設計坍度：18 cm 許可差為±4cm		
試體取樣	100m ³ ~1 組 (含以下)		
出料單強度	如圖說規定強度 kgf/cm ²		
氯離子抽查	<0.15kg/m ³		
使用機具	澆置方式： ☐ 泵送 ☐ 特密管 ☐ 滑槽 ☐ 推車 ☐ 其他		
上、下層澆置之時間 限制	澆置間距不超過 45 分鐘		
拌合廠至工地時間 限制	60 分鐘為上限		
施工縫	初凝前鏟成稍粗糙面		
澆置之高度落差	不得高於[1.5]公尺		
震動棒之使用	插入下層混凝土深度約為 10cm		
完成面處理	☐ 抹平(初凝後加強) ☐ 整體 粉光 ☐ 掃痕		
拒絕使用情形	拒絕原因： ☐ 異常坍度 ☐ 出廠 逾時 ☐ 其他		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-10 照明施工自主檢查表

編號：EW-09

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
施工前	接地極材質、數量、位置、安裝 符合規定否		
	燈泡材質數量、位置、安裝符合 規定否		
	配管位置		
	配電箱安裝		
	接地線徑		
施工中	接地線徑 $R < \underline{\hspace{1cm}} \Omega$		
	管溝配管		
	導線穿線及連接(連續性不得破 損)		
	景觀安裝		
	投射燈安裝		
	線路絕緣 $R < \underline{\hspace{1cm}} \Omega$		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-11 鍍鋅鋼網圍籬施工自主檢查表

編號：EW-10

工程名稱		桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程	
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程		☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查	
檢查結果		○檢查合格 ✕有缺失需改正 ／無此檢查項目	
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
鍍鋅網圍籬	寬 200cm*高度 220cm		
立柱	§ 3"鍍鋅鐵管；h=220cm		
橫桿	§ 2"鍍鋅鐵管		
菱形鐵絲網	1.#12 鍍鋅鐵線 2.PE 塑膠包線 3.網眼 63mm		
底板	PL400*400*10mm		
膨脹螺栓	§ 4-3/8"		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-12 植栽工程施工自主檢查表

編號：EW-11

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
修枝及除葉	1.不超過樹冠 1/3 2.維持完整樹型		
斷根次數及切口	切口需平整 免斷根直徑<10cm 直徑<30cm 斷根 1 次 直徑>30cm 斷根 2 次		
土球包紮及大小	幹基頭部直徑 3-5 倍，完全包覆		
樹穴挖掘	寬度：土球直徑 2 倍 深度：土球直徑 1.3 倍		
吊搬運送	運輸與裝卸過程，應有明顯警示		
客沃土回填	有機砂質土，無石塊等外來物質，無泥濘；客沃土數量依實際		
支架架設	埋入深度 30cm (或契約規定) 彈性材質保護墊、綁紮帶(棉、布、麻繩)	1.支架埋入深度： 2.□設置保護墊、綁紮帶 (□棉、□布、□麻繩)	
施工後現場環境整潔	施工完成後周邊雜物、垃圾清除，廢棄物當日運棄		
支架架設	支架支數 3 支(竹類) 彈性材質保護墊、綁紮帶(棉、布、麻繩)	1.支架支數： 2.綁紮帶 (□棉、□布、□麻繩)	
喬木生長情形	無枯枝，生長情況良好		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-13 兒童遊戲場設備工程施工自主檢查表

編號：EW-12

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
告示牌上內容	應有使用須知及年齡，並訂有發生事故傷害緊急聯絡方式，且無損壞，文字或圖案內容清晰可見。		
光線明亮、通風、無視覺死角	無危險物品，擺盪空間無障礙物。		
室內環境者，	應備有效期內之急救用品。		
遊戲設施基礎穩固	地樁未外露，沒有鬆動、晃動，產生異音或變形等現象。		
各項結構組件組裝固定，扣件完整	沒有鬆動、晃動、位移、遺漏、銹蝕等現象。		
具有軸承組件之遊戲設施（鞦韆、旋轉、擺盪設施等）	應功能正常，且有做適當潤滑，無異音。		
遊戲設施材料外觀沒有	脫漆、過度磨耗、鏽蝕、脆化、龜裂、變形、破損、斷裂、尖銳物外露（如輪胎沒有鋼絲或鋼片外露）等現象。		
遊戲設施地面上之鋪面材料	平坦不致造成絆倒（如明顯坑洞、過大縫隙、高低不平），且地面無積水、濕滑、青苔等現象。		
遊戲設施內	不得積水，堆積髒亂之物（如輪胎內槽、溜滑梯、鬆填式鋪面不得積水）。		
一體化鋪面	（如橡膠地墊）應定期清潔、消毒與維護。		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-14 預鑄路緣石工程施工自主檢查表

編號：EW-13

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
材料送審	型式是否符合		
施工位置放樣	位置：_____		
高 程： _____	位置：_____		
高程：			
基礎開挖	深度：_____		
長 度： _____			
寬 度： _____	深度：_____		
長 度： _____			
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-15 鋪面磚(高壓)、警示磚、高壓混凝土磚工程施工自主檢查表

編號：EW-14

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
材料送審	型式是否符合		
材料尺寸	磚 透水砂層填築，襯墊砂 水泥砂漿，1:3		
基礎	底層底土夯實		
休憩鋪面 (木片磚鋪設)	1:3 水泥砂漿(T=2~4cm) 磚鋪面(T $\geq$ 4cm) 磚產生之縫隙 以 1:3 水泥砂漿填補 緣石兩側 2cm 導角處理(表 面抵石處理)		
整體	穩固堅實符合圖說規範		
材料尺寸	透水砂層填築，襯墊砂 水泥砂漿，1:3		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-16 磨石子工程施工自主檢查表

編號：EW-15

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
混凝土表面	異物清除		
邊坡樁放樣	依圖說規定位置放樣		
必要樁位之檢測及保護	依圖說規定辦理		
施工順序	自高處向低處施工		
水泥砂漿之配合比例	採用一份水泥及三份砂與適量之水拌和(均以容積比例計算)		
水泥砂漿之拌和	加水後之拌和時間不得少於[3 分鐘]		
面層之水泥碎石料	禁止摻雜海菜或其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料，其用量為水泥量之[15%~20%]		
分格	大小應依工程司指示辦理。分格以 9mm[檜木]方條		
水泥砂漿拌和另外規定	1 份水泥、1.5 份碎石及 1/4 份礦物填縫料		
規定使用符合要求之石材?	不得使用人造宜蘭石		
汙工廢水是否集中處理	異物清除		
研磨時是否之職安衛要求	依圖說規定		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-17 抵石子工程施工自主檢查表

編號：EW-16

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
混凝土表面	異物清除		
邊坡樁放樣	依圖說規定位置放樣		
必要樁位之檢測及保護	依圖說規定辦理		
施工順序	自高處向低處施工		
水泥砂漿之配合比例	採用一份水泥及三份砂與適量之水拌和(均以容積比例計算)		
水泥砂漿之拌和	加水後之拌和時間不得少於[3 分鐘]		
面層之水泥碎石料	禁止摻雜海菜或其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料，其用量為水泥量之[15%~20%]		
分格	大小應依工程司指示辦理。分格以 9mm[檜木]方條		
水泥砂漿拌和另外規定	1 份水泥、1.5 份碎石及 1/4 份礦物填縫料		
如規定使用宜蘭石	不得使用人造宜蘭石		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-18 彈性無縫鋪面工程施工自主檢查表

編號：EW-17

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
材料送審	是否已核定		
化學性安全	地墊化性元素遷移值應符合最大容許		
必要樁位之檢測及保護	依圖說規定辦理		
施工順序	自高處向低處施工		
抽樣檢驗	檢視尺寸、色澤、數量、批號		
堆置存放	堆放位置之配置及保護		
刨除廢泥渣及垃圾清理	徹底清除乾淨		
澆置面清潔度	是否清潔無雜物或派員清理		
底層平整	底層是否平整且派員整平		
澆置面清潔度	是否清潔無雜物或派員清理		
底油塗布	是否均勻		
完成面情形	有無龜裂等情形		
控制通行	是否待表面乾硬後再開放通行		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-19 泥作工程施工自主檢查表

編號：EW-18

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程			
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查			
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
	檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準（定量定性）	實際檢查情形（敘述檢查值）	檢查結果
施工前	粉刷位置及範圍是否正確告知協力廠商及施工人員？	確實告知		
	牆面是否整修及清理？	目視平整		
	粉刷基準線是否設置？凸出之牆面是否打石處理？	設置、凸出打石處理		
施工中	基準面灰誌是否按規定製定？	1.5 m		
	牆面於粉刷前是否有塗佈純水泥漿做為粘結層？	同左		
	粉刷前牆面是否予以灑水濕潤？	灑水濕潤		
	打底完成後是否以刮尺刮平至灰誌基準面？	±0.3 公分		
	打底完成之牆面是否平整，陰角是否垂直？	±0.2 公分/ 1.8 m		
	水泥砂漿之拌合比例是否依照規定？	1：2 或 1：3		
	粉刷時水泥砂漿是否流入排水管内？	於排水孔塞紙		
	面層粉刷時垂直及水平是否平整？	±0.2 公分/180 公分		
施工後	面層粉刷時是否有鏟刀痕跡？	無痕跡		
	粉刷層是否有空心現象？	無空心		
	殘料及垃圾是否清理乾淨？	無殘料及垃圾		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認				

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-20 磁磚工程施工自主檢查表

編號：EW-19

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
抽樣檢驗	檢視尺寸、色澤、數量、批號		
堆置存放	堆放位置之配置及保護		
刨除廢泥渣及垃圾清理	徹底清除乾淨		
完成面高程及洩水坡度設定	洩水坡度1/100		
牆面四週及重點部位	依施工計劃		
查核基準	依施工計劃		
堆放配置	配合施工順序		
材料查核	查對規格數量批號及是否有受損		
施工前一天表面以清洗潤濕	表面無雜質面乾內飽和		
抽樣檢驗	查對規格數量批號及是否有受損		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-21 地(磁)磚工程施工自主檢查表

編號：EW-20

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程			
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查			
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目			
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
施 工 中	水泥少漿拌合配比 鋪設刮平	依施工計劃攪拌均勻 外牆需用 1:2 水泥砂漿加防水劑打底		
	十字分割線及輔助 基準線設置	依施工計劃攪拌均勻、鋪平		
	表面平整度	每 m 誤差 $\leq$ 2mm		
	壓貼敲實縫隙調整 對齊	依施工計劃		
	收頭及切割位置	配合施工順序		
	洩水坡度方向	依施工計劃(大樣圖)		
	填縫處處理乾淨	磁磚計劃規範		
	填抹縫確實滿漿	不得有氣泡產生		
施 工 後	鋪貼完成面情形	餘漿清潔乾布擦拭		
	堆放配置	配合施工順序		
	施工場所	牆面污染處清洗乾淨 垃圾廢料清運		
	禁止荷重	水泥砂漿未凝結前(三天內)禁止荷載		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢(試)驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認				

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員(檢查人員)簽名：

表 七-22 木作工程施工自主檢查表

編號：EW-21

工程名稱		桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期	年 月 日	
施工流程		☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)		實際檢查情形 (敘述檢查值)
施工前	垂直度	以水平尺丈量氣泡區中		
	骨架尺寸及間距	詳施工圖說:A8-04 Tape : C 型鋼- x x mm @ cm		
	填充材	填充材以 2"60K 岩棉滿塞，目視檢查不可有未填塞或填塞不實情形		
	補強件	是否依照施工圖說:A8-06 施作		
施工中	板材螺絲固定間距檢查	以尺丈量絞花自攻螺絲間距@_____cm		
	板材接縫及螺絲孔處理	1.板縫間隙 3~5 mm彈性土填縫 2.接縫面自黏性玻纖網+彈性泥黏 貼 5 cm 3.接縫面第二道彈性批土整平，寬 10 cm 4.第三道批土寬度 20~25 cm 5.板材接縫及螺絲孔處批土		
	接縫處理	1.牆面陽角使用金屬護角，並批土 2.牆面交接處陰角，採用纖帶處理。 3.RC 交接處陰角留 5~10cm 細縫填水性矽利康處理		
施工後	完成面	須平整無污染		
		垂直度偏差需小於 1cm		
		板面凹凸:60cm不得大於3cm		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認				

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-23 排水工程工程施工自主檢查表

編號：EW-22

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
廠牌是否符合規定?	依核准型錄		
外觀是否無破損?	目視		
支撐架安裝是否確實?	依施工規範		
安裝位置是否與圖面相符?	依核准施工圖		
搭接是否確實?	依施工規範		
之電氣接地連續性是否良好?	依施工規範		
是否面漆剝落部份是否已塗漆?	依施工規範		
作業是否良好?	依施工規範		
電氣接地測試值是否合格	依核准施工圖		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-24 假設工程施工自主檢查表

編號：EW-23

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商	
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
圍籬型式？高度？大門 寬度？是否符合規範	圍籬_____種 高度_____M 大門寬_____M		
工務所是否設置	_____K*_____K _F		
工務所設備是否設置完 備？	桌椅、掛表、電腦等設備		
臨時電源是否設置完 備？	KV 以下		
臨時用水源是否設置完 備？	依設計圖面		
工程告示牌是否依工程 會規定格式設置？	位置、數量、材質符合工程會要求		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認			

工地主任(工地負責人)簽名：

：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

編號：EW-24

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-26 器具設備施工自主檢查表

編號：EW-25

工程名稱		桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱			協力廠商	
檢查位置			檢查日期	年 月 日
施工流程		☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
施 工 前	放樣	依設計圖號		
	材料尺寸			
施 工 中				
施 工 後				
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認				

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-27 濕式壓花地坪工程施工自主檢查表

編號：EW-26

工程名稱		桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
分項工程名稱		協力廠商		
檢查位置		檢查日期		年 月 日
施工流程		☐ 施工前檢查 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
檢查項目		設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查 結果
施 工 前	送審資料	依送審圖樣 1.是否與設計圖相符 2.排水方向及坡度按設計圖規劃		
	放樣	依設計圖號		
	材料尺寸	間格		
	底層處理	夯實整平		
施 工 中	混凝土澆置	有無異常狀態		
		長度:_____		
		寬度:_____		
	混凝土澆置後	厚度:_____		
		混凝土初凝前，表面鏟平再均勻		
	鏟平粉光型式	撒佈彩色壓花料		
_____圖案_____型式_____				
色				
施 工 後	脫膜環境整理	壓花		
		噴上透明封面劑，形成保護層		
壓印 7 天後以高壓水 養護達 28 天，始開放使用				
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 ☐ 未完成改善，填至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1.檢測標準及實際檢測情形應具體明確或量化尺寸。 2.檢測結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢測之項目則打「／」。 3.嚴重缺失、缺失複查未能及時完成改善，應填具「不合格品管制總表」進行追蹤改善，本表單可先行存檔。 4.本表由工地現場施工人員實地檢測後覈實記載簽認				

工地主任(工地負責人)簽名：

現場施工人員（檢查人員）簽名：

表 七-28 汛期工地防災減災自主檢查表

編號：SF-

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
承攬廠商	五嶺營造有限公司		
檢查地點		檢查日期	
檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
防汛災害 風險辨識	<u>查詢防汛風險資訊之相關網站瞭解鄰近工區之淹水、坡地災害潛勢圖及歷年風災復建工程資訊，並據以檢視施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約等防救災文件之防救災措施是否妥適。</u> <u>(註：本檢查項目應於每年度進入汛期進行第 1 次防災減災自主檢查時實施，爾後視工地實際需要辦理)</u>		
防救災文件資料	設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。		
防救災措施應變準備	確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材(人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等)之立即到位及正常運作功能。		
工地臨時構造物	施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。		
工地排水設施	工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。		
工地大型機械設備	吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。		
工地開挖及土石挖填方	對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。		
工地水文及邊坡變化	加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。		
工地防汛缺口	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。		

工地垃圾、雜物及廢棄物	垃圾、雜物及廢棄物應予清理。		
工地施工器材	施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。		
工地電力系統	電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。		
工地房舍、辦公室及倉庫	強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。		
其他	一、工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。		

缺失複查結果：

備註：

一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。

二、有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」(http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro_system.pasin) 業整合內政部「TGOS 圖台」(<http://tgos.nat.gov.tw>) 及「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」(<http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/>) 大數據；另內政部「TGOS 圖台」、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「土石流防災資訊服務網」、國家災害科技防救中心 (NCDR)「災害潛勢地圖網站」等亦提供相關資料查詢。

二、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。

檢查人員簽名：

工地主任簽名：

第八章 不合格品之管制

一、不合格材料及設備之管制

(一)材料檢驗及試驗不合格

1. 材料若檢驗或試驗判定為不合格材料時，品管工程師應在送貨單及『材料退料記錄單』上註明為不合格，加蓋『驗退』印戳並併同該試驗報告呈工地代理人核閱後，立即以書面通知供應商儘速將不合格材料運離工地。
2. 不合格材料在未運離前，應以標籤『材料驗退』標示於該批材料上；必要時以警示帶輔助標示，以防誤用。
3. 品管工程師應統計及評估不合格率較高之供應商，以書面通知改善；必要時予以拒絕供料
4. 品管工程師應追蹤辦理各項材料之檢驗與試驗至合格，才能供料，否則一律運離工地。

(二)材料檢驗及試驗不合格之處理方式

1. 上述產品經檢/試驗及鑑定不合格者，以下列方法處理之：
 - (1) 標示
 - (2) 隔離
 - (3) 重試驗合格後使用
 - (4) 退料
2. 不合格產品均應紀錄管制追蹤。
3. 填寫材料退料紀錄表、照片紀錄表、不合格報告紀錄表。

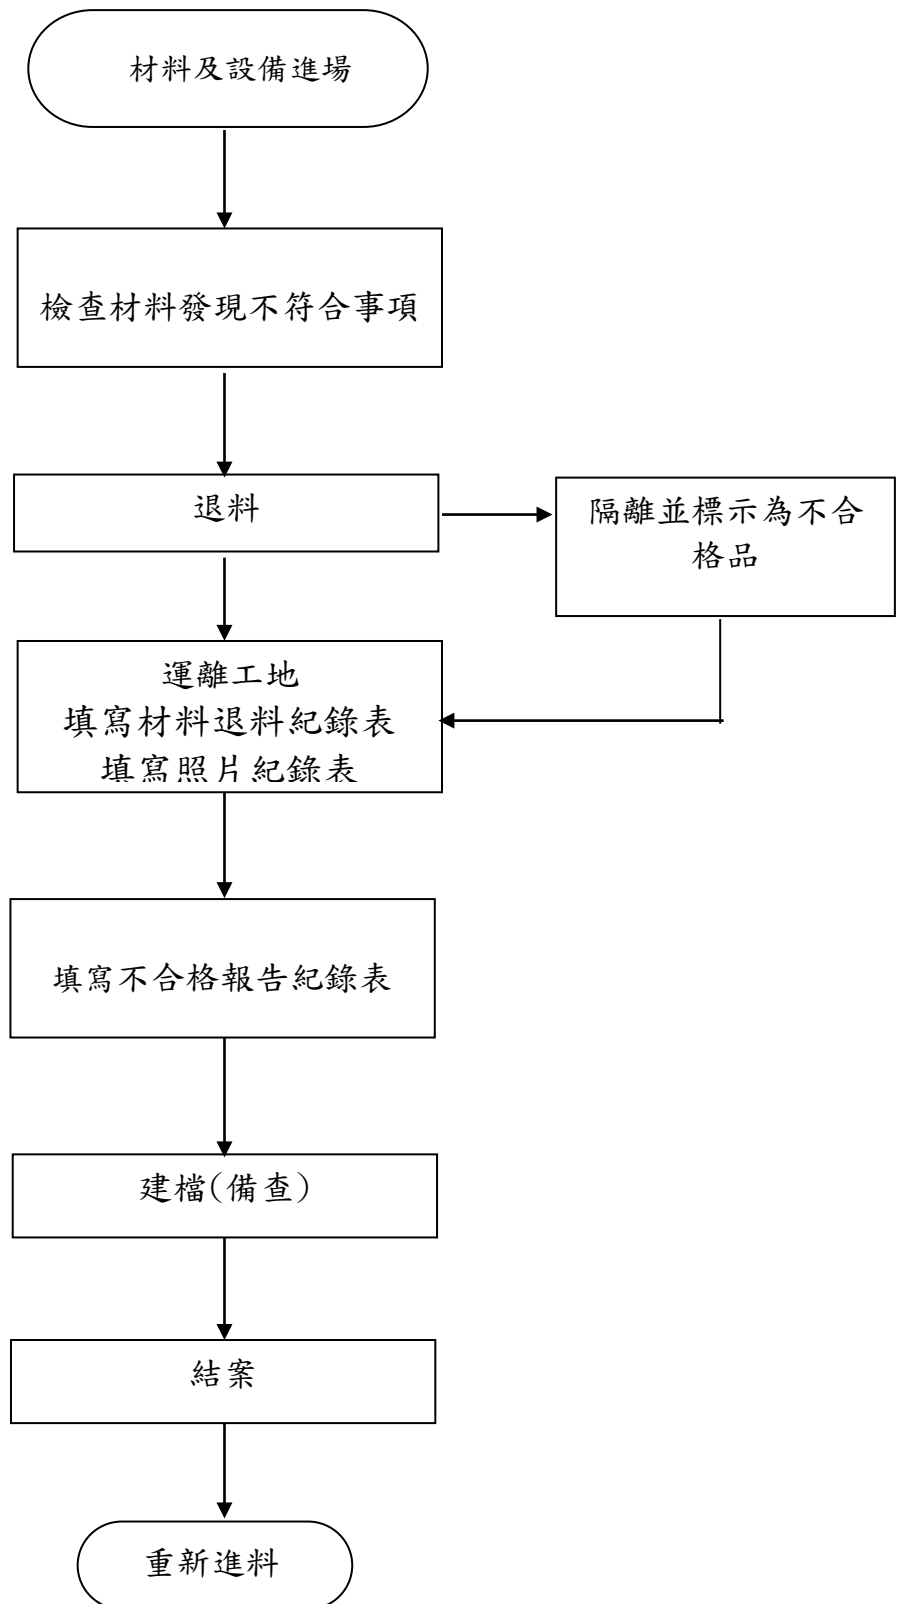


圖 八-1 材料自主檢查不合格管制作業流程

二、施工不合格品質之管制

(一)施工檢驗不合格

1. 施工檢驗不合格分為：

(1) 主要不合格：凡未依契約或施工規範完成，有影響結構或使用等實值缺陷與安全之虞者，需拆除、重作等之不合格。

(2) 次要不合格：不影響結構或使用上安全之虞，只需部份敲除重作、補強或是罰扣款等方式處理之不合格。

2. 施工檢驗或試驗判定為不合格時，品管工程師應填具『不合格報告書』及各施工檢驗表單，呈工地負責人核閱後，由工地負責人擬定修改或拆除重做之改善方案，並即刻進行修改或重做至妥善；由品管工程師跟催複驗至符合規範要求始結案。

3. 本工程委託試驗機構為經 TAF 認證通過或公立機構。

(二)施工檢驗不合格之處理方式

一、施工檢驗不合格，以下列方法處理之：

(1) 修正改善複驗。

(2) 複驗不合格拆除重做。

(3) 瑕疵：經工程師發現無結構危害以口頭或書面通知改正者均屬之。

二、填寫照片紀錄表、不合格報告紀錄表。

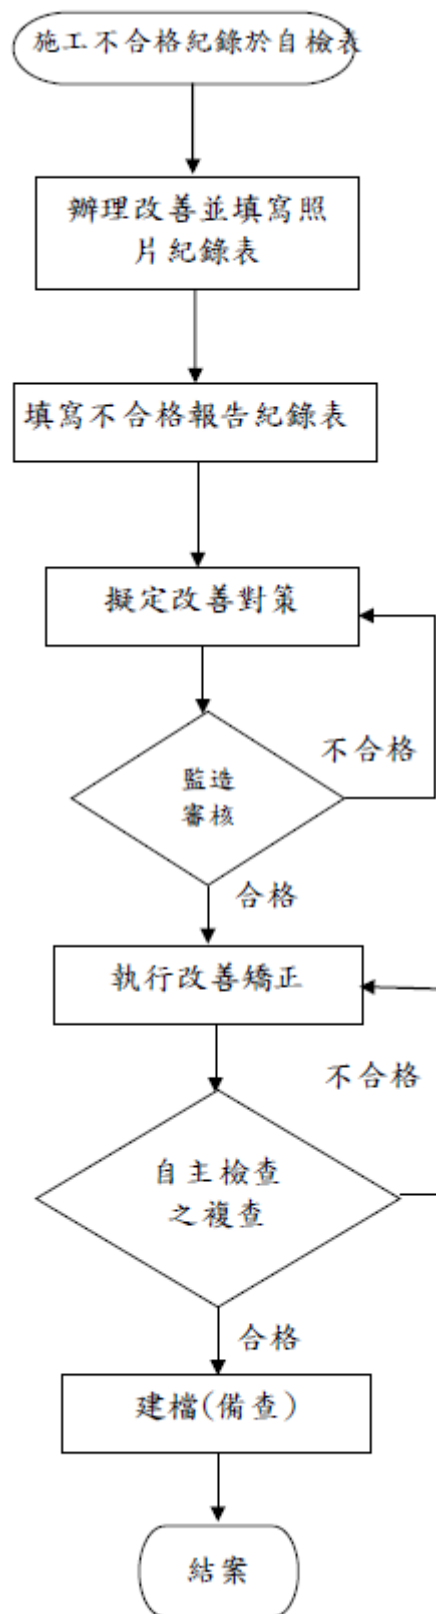


圖 八-2 施工自主檢查不合格管制作業流程

三、應用表單

表 八-1 不合格管制一覽表

[illegible]

表 八-3 不合格品改正紀錄表

編號：

工程名稱	桃園市第 47 期桃園區中平市地重劃工程		
監造單位	杜風工程服務股份有限公司	檢查日期	
承攬廠商	五嶺營造有限公司	限定完成改善日期：	
缺失具體情形、位置、範圍： 檢查人員簽名：			
要求改正單位採取改善措施			
採取改善及預防措施：			
缺失改善成果確認			
查證日期： 改善結果確認： ☐改善完成 ☐未完成改善（說明： ☐其他（說明： 複查人員簽名：			

工地主任簽名：

品管人員簽名：

備註：本表需併同改正過程改善前中後照片存檔。

表 八-4 施工缺失改善照片表

工程名稱：桃園市第七期桃園區中平市地重劃工程	缺失事項：	(照片尺寸3*5)
	改善中情形：	
	改善後情形：	

第九章 矯正與預防措施

一、矯正措施

(一)辦理時機

依現場工程師填寫之自主檢查表所列缺失，由品管人員與以統計分析，相同屬性之一般缺失如發生超過十次以上則列入矯正程序，屬重大缺失者亦比照辦理。

(二)矯正措施流程

1. 品管人員針對一般缺失及重大缺失作統計分析。
2. 需列入矯正者則由品管人員通知現場工程師填具矯正措施紀錄表，並由品管人員協助判定異常原因。
3. 由專案經理及品管組長召開品質會議，共同研討有效而確實之矯正措施。
4. 研擬之矯正措施則交由現場工程師執行，並由品管人員確認執行成果及評判。

(三)矯正措施成效之評估

1. 判別施工人員是否依指示修正。
2. 修正成果是否符合規範要求。
3. 確認現場工程師及施工人員務實施工，避免再犯。

(四)矯正結果紀錄

1. 品管人員依據研擬矯正措施，判別施工人員是否遵照執行。
2. 現場人員執行完成，由品管人員依執行結果及規範或圖說比較，是否達到執行成效。
3. 所有判定結果及評語均紀錄於矯正措施紀錄表。

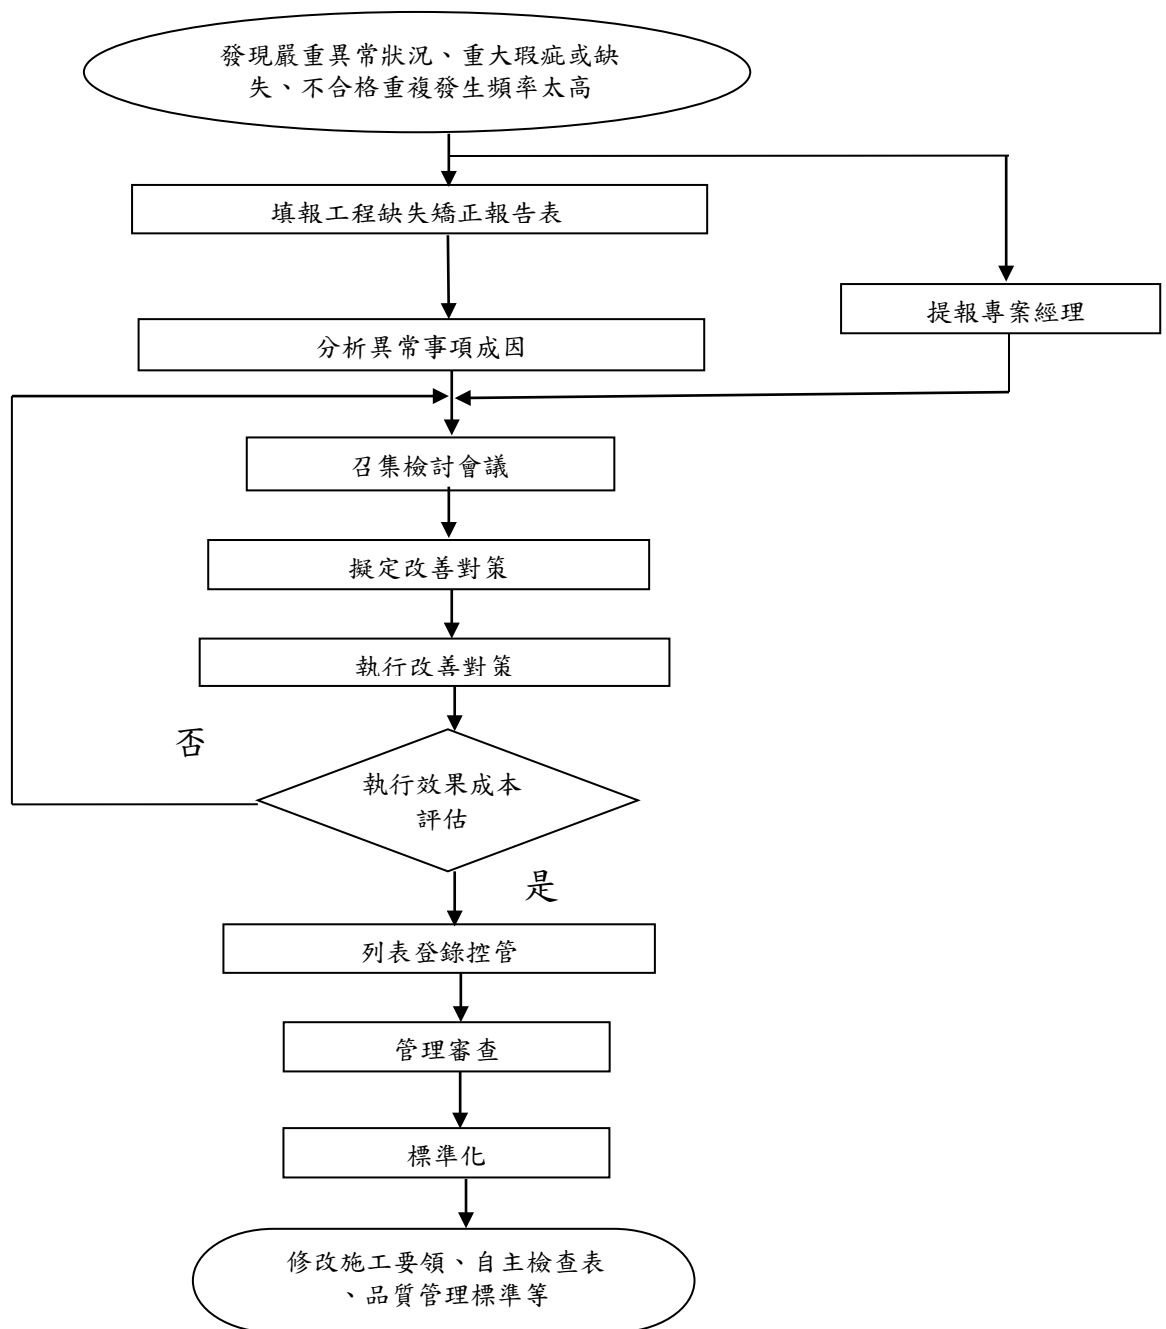


圖 九-1 矯正措施流程圖

二、預防措施

(一)辦理時機

當施工或材料設備發生重大異常時，或工程司判定為嚴重及經常性缺失，即列為預防措施程序。

(二)預防措施流程

1. 品管人員統計缺失發生之時機，並由會同現場工程師一同判定異常發生原因。
2. 現場工程師將異常原因填列預防措施紀錄表。
3. 由專案經理及品管組長召開品質會議，共同研擬實際而有效之改善方式，即預防錯誤再犯之確實方法。
4. 預防措施之改正執行後，品管人員判別執行之成果是否有效，而且預防下一階段同樣缺失之發生。

(三)預防措施成效之評估

1. 判別施工人員是否依指示修正。
2. 改善之結果是否確實而有效。
3. 是否可達到預防異常再現之成效。

(四)預防結果紀錄

1. 品管人員依據研討之預防措施，判別是否確實執行。
2. 執行之成果交品管人員判別是否有效而落實。
3. 判定之結果均紀錄於預防措施紀錄表。

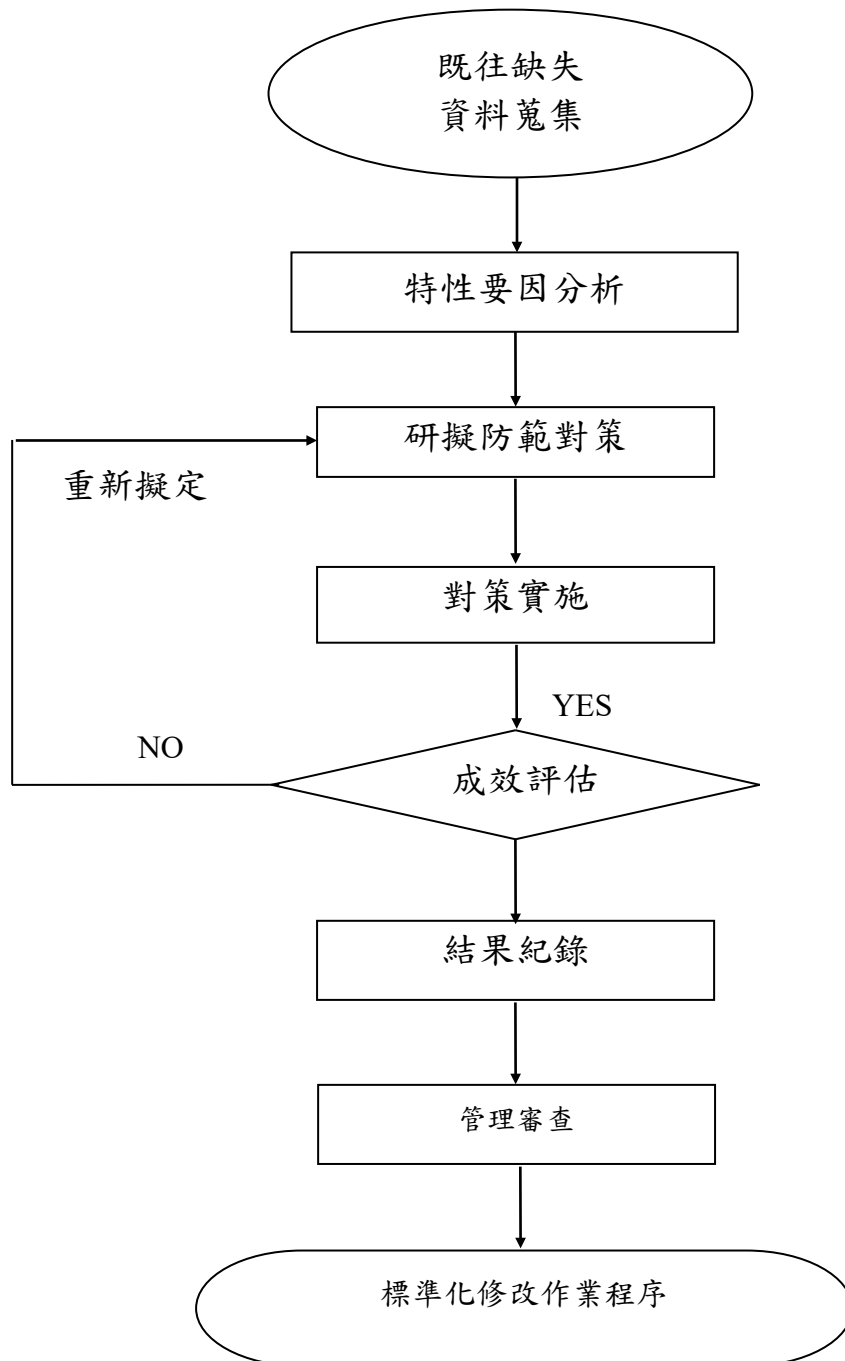


圖 九-2 預防措施流程圖

三、應用表單

表 九-1 異常矯正與預防處理紀錄表

編號：

工程名稱	桃園市第47期桃園區中平市地重劃工程	廠商名稱	五嶺營造有限公司
發生位置		發生日期	
異常現象：			
工地主任：		經辦工程師：	
異常原因分析及預防措施：			
矯正措施：			
預防措施：			
矯正改善結果評估與確認：			
☐ 未矯正 ☐ 矯正未符合要求 ☐ 不通過 ☐ 其他說明			
其他說明：			
☐ 結案 ☐ 未結案 日期：			
工地主任：		品管工程師：	

發生單位：	發生日期：
相片黏貼處	
說明：	
相片黏貼處	
說明：	

第十章 內部品質稽核

一、品質稽核權責

本公司內部稽核人員由公司管理階層選派，主要權責為稽查施工人員的基本知識與工作的執行情況，查看各項計畫書內容是否確定填寫與執行，並將稽查結果回饋公司做未來改進的方面。

(一)內部品質稽核任務編組

成員須具備下列其中條件：

1. 經公共工程品質訓練課程合格者。
2. 領有技師考試及格證書者。

(二)內部品質稽核組織職掌

1. 總公司稽核小組：根據總公司營運訂定品質管理方針，要求各工地據此施行，並辦理品質稽核複查執行情況。
2. 專任工程人員：依營造業法第 35 條第 3 款規定至工地督察施工品質是否符合契約要求
3. 工地品管稽核小組：
 - (1) 稽核組長：稽核計畫之擬定及督導執行，稽核成效之確認。
 - (2) 稽核員：執行稽核作業，稽核缺失之改善追蹤。
 - (3) 觀察員：觀察稽核員執行稽核作業正確與否並做成紀錄，以便爾後稽核成效之檢討。

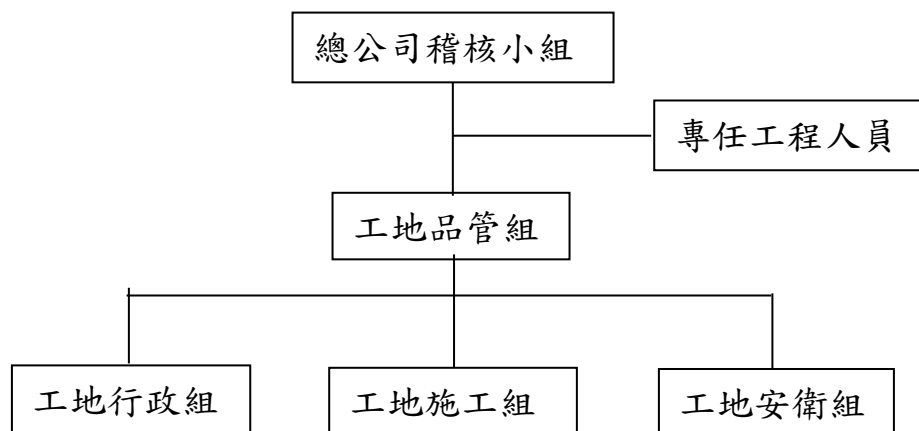


圖 十-1 內部品質稽核組織圖

二、品質稽核範圍

- (一)施工人員應具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負的任務與品質責任。
- (二)施工人員確實了解執行工作的標準（施工品質管理標準、品質管理標準）。
- (三)對於工地之各項計畫書、施工品質管理標準、施工圖表、品質管理標準、自主檢查等，是否落實執行。
- (四)由文件及紀錄查證執行工作者確實依據作業流程執行。
- (五)查證執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。
- (六)回饋機制之有效性。

三、品質稽核頻率

擬定稽核頻率(計畫)時，凡管理、組織、政策、技術或工法等方面有不穩定或重大之改變，其能影響品質系統者，以及各工項初始施工或最近幾次稽核之結果等各種狀況，均為訂定稽核頻率之因素，並據以排定「內部品質稽核計畫表」(表十-1)。

本工程內部品質稽核，包含定期與不定期稽核兩類：

(一)定期稽核：

總公司、專任工程人員及品質管理人員對本工程進行內部品質稽核，每半年執行一次內部品質稽核為原則。

- 1. 公司稽核小組：開工後半年辦理一次內部品質稽核。
- 2. 專任工程人員：每月督察工地一次。
- 3. 品質管理人員：不定期辦理一次內部品質稽核。

(二)不定期稽核：

- 1. 品質系統發生重大變更或異常時，包括組織較大異動及各項規劃辦法重大修訂時。
- 2. 對受稽核部門所採取之矯正措施，有需要進一步檢查評估時。
- 3. 除年度定期稽核外，可依據需要實施不定期品質稽核。不定期內部

品質稽核，得不事先通知受稽核單位。

四、品質稽核流程

- (一)地品管稽核小組依頻率年底前排定「定期內部品質稽核計劃表」，並得視需要隨時修訂之。
- (二)地品管稽核小組依據「定期內部品質稽核計劃表」所排定之稽核進度，執行稽核。
- (三)除年度定期稽核計劃外，可依據不定期稽核適用情況，決定實施不定期內部品質稽核時機。
- (四)稽核人員執行內部品質稽核時，需依照下列程序實施：
1. 內稽小組組長通知受稽核組別召開稽核前會議，參加人員包括受稽核組別人員，並於會議中說明稽核之程序、內容、配合事項、時間安排等事宜。
 2. 內稽小組現場稽核後這召開稽核後會議，稽核結果要求各組別於改善期限內完成並且追蹤改善情形，後擬定矯正及預防措施，並作成紀錄結案。

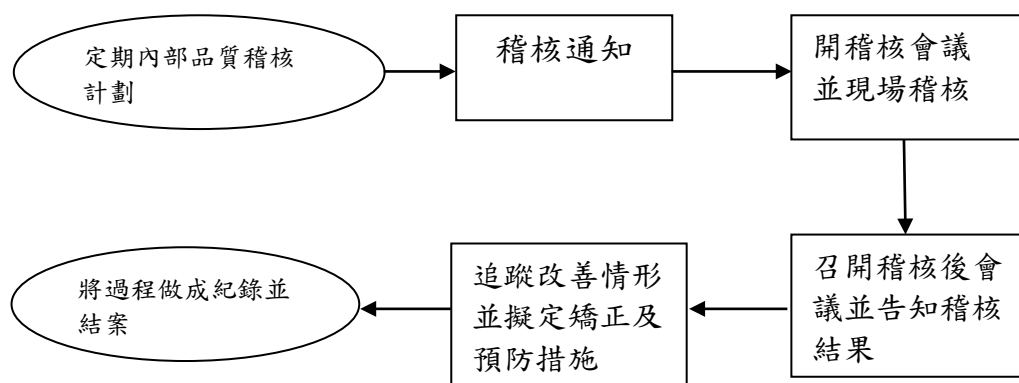


圖 十-2 品質稽核流程圖

五、應用表單

表 十-1 定期內部品質稽核計畫表

年/月份	定期稽核	不定期稽核	備註
115/04			
115/05			
115/06			
115/07			
115/08			
115/09	●		
115/10			
115/11			
115/12			
115/11			
115/12			
116/01	●		
116/02			
116/03			
116/04			
116/05			
116/06			
116/07	●		
116/08			
116/09			
116/10			
116/11			
116/12			

表 十-2 內部品質稽核通知單

受稽核單位	桃園市第47 期桃園區中平市地 重劃工程		通知日期		
稽核日期					
稽核前會議	時間		稽核後會議	時間	
	地點			地點	
項次	品質稽核要項				
備 註	受稽核部門要求變更日期，應於二日以前通知稽核小組組長				
稽核小組組 長		稽核員		受稽核單 位主管	

表 十-3 內部品質稽核檢查表

文件編號		文件名稱		稽核日期	
受稽核單位	桃園市第47期桃園區中 平市地重劃工程	稽核員		會審人員	
項次	稽核項目		稽核結果	缺失內容	
	行政組				
	文書組				
	施工組				

稽核結果符號：○＝符合

x＝不符合

△＝不適用

表 十-4 內部品質稽核改善通知單

收文單位：桃園市第47 期 桃園區中平市地重劃工程		日期：		洽談人員：	
填發者：		稽核編號：			
缺失描述：					
缺失改正情形： ☐ 調查措施（確認缺失實況與影響範圍） ☐ 補救措施（對缺失已造成影響的彌補措施） ☐ 矯正措施（防止再犯的因應措施） 受稽核單位：					
完成日期：		矯正措施評核：			
		接受		不接受	
稽核單位證實之措施					
執行之結果				稽核員：	
				結案日期：	
接受 不接受 				稽核組長：	

表 十-5 內部品質稽核成效追蹤表

項次	不符事項說明		責任單位	改善期限	追蹤結果
管理代表		稽核小組 組 長		稽核員	

第十一章 文件記錄管理系統

一、文件管理系統

所有文件進出工地，均應經檔案管理員（工地負責行政人員）登錄並編列流水號，再按類別、項目、順序交各承辦單位及人員辦理。承辦人員簽辦呈判並經主管核示後，應將來文單位、日期、流水號、內容大綱及收文日期、辦理情形等登載後，再依檔案類別分檔存放。檔案文件之調閱，需簽請主管核可；並應將調閱核可單（登載調閱日期、收發文日期、流水號、內容大綱）交管理人員收執後調閱。

（一）文件紀錄分類代碼

總類	代碼	細類	細類	流水號	保存期限
			代碼		（建議）
公文	N	收文	NA		完工後五年
		收文-主辦機關公文	NA	01	完工後五年
		收文-監造單位公文	NA	02	完工後五年
文件 申報	H	開工報告表(含竣工報告表)	HA		完工後五年
		工程保險資料	HB		完工後五年
		空氣汙染防制費開工申報(含完工)	HC		完工後五年
		其他申報資料(如自來水、電力、電信、 消防、建照、使照等)	...		完工後五年
契約 文件	C	原始契約	CA		完工後五年
		變更契約	CB		完工後五年
圖說	D	合約書圖	DC		完工後五年
		變更設計圖	DR		完工後五年
		竣工圖	DG		完工後五年
計畫 書及 送審 資料	P	整體施工計畫	PQ	01	完工後五年
		整體品質計畫	PQ	02	完工後五年
		職業安全衛生管理計畫	PQ	03	完工後五年
		抵石子工程分項施工計畫	PQ	...	完工後五年
		鋼筋材料送審資料	PC	01	完工後五年
		預拌混凝土材料送審資料	PC	02	完工後五年

		其他材料送審資料(依各別專案需求依序增加)	PC	...	完工後五年
職安訓練	R	協議組織訓練紀錄	RA	01	完工後五年
		一般安全衛生教育訓練紀錄	RA	02	完工後五年
		其他職安訓練紀錄(依各別專案需求依序增加)	RA	...	完工後五年
進度報告	G	工程日報表	GD		完工後五年
		工程進度表	GM		完工後五年
施工紀錄	W	施工照片	WA		完工後五年
		竣工回覆單	WC		完工後五年
		營建剩餘土石方證明文件	WE		完工後五年
		其他依契約提交之報告（依各別專案需求依序增加）			完工後五年
材質證明及試驗報告	T	材料出廠證明	TA		完工後五年
		鋼筋材料出廠證明	TA	01	完工後五年
		預拌混凝土材料出廠證明	TA	02	完工後五年
		其他材料出廠證明（依各別專案需求依序增加）	TA	...	完工後五年
		試驗報告	TB		完工後五年
		鋼筋試驗報告	TB	01	完工後五年
		混凝土試驗報告	TB	02	完工後五年
		其他試驗報告（依各別專案需求依序增加）	TB	...	完工後五年
檢查紀錄	E	材料設備品質檢驗紀錄表	EM		完工後五年
		職業安全衛生自主檢查表	ES	01	完工後五年
		工地環境清潔及交通維持安全措施檢查表	ES	02	完工後五年
		其他安衛環保檢查表（依各別專案需求依序增加）	ES	...	完工後五年
		其他施工作業自主檢查表（依各別專案需求依序增加）	EW	...	完工後五年
		主任技師督察紀錄表	EP		完工後五年
		內部品質稽核報告表	EB		完工後五年
缺失改善	Q	不合格品追蹤改善紀錄	QC		完工後五年
估驗	B	業主估驗計價資料	BU		完工後五年

會議 記錄	R	業主工務會議紀錄	RE		完工後五年
		工地檢討會	RW		完工後五年
		施工界面協調會	RC		完工後五年
結算 驗收	F	驗收紀錄	FA		完工後五年
		結算驗收證明書	FB		完工後五年

(二)文件紀錄編碼原則

代碼	流水號	版次
QB	001	01

例如：編號 QB-001-01 為品質管理類，施工方面之第一份文件第一版

二、紀錄管理作業程序

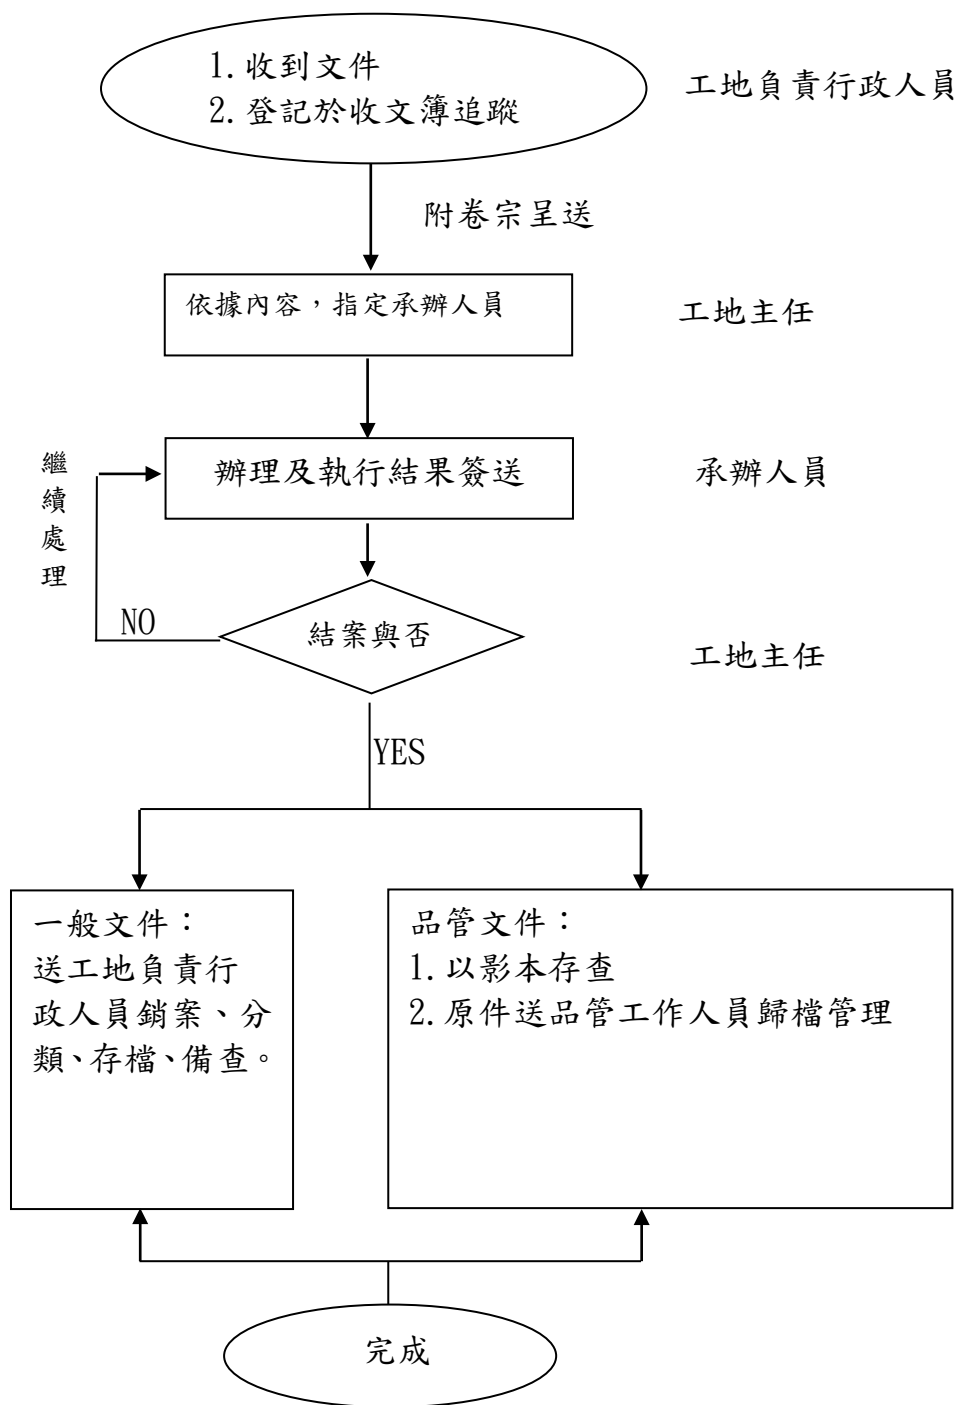


圖 十一-1 收文文件傳送流程及歸檔流程圖

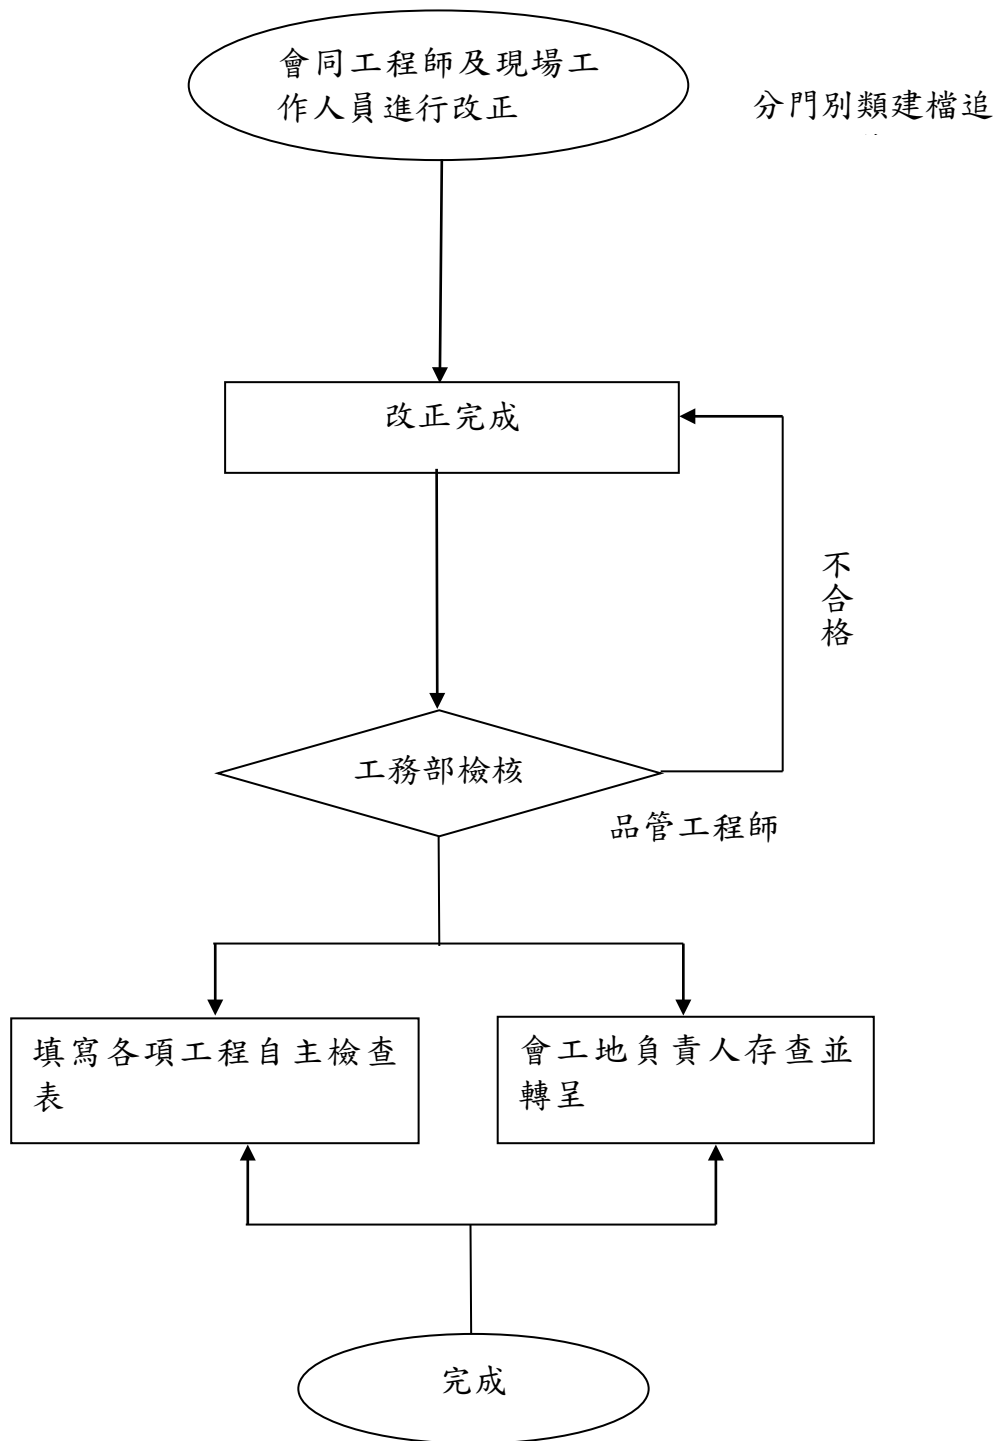


圖 十一-2 發文文件傳送流程及歸檔流程圖

三、文件紀錄移轉及存檔

(一)紀錄移轉：

保留完整之工作紀錄以備工程司隨時核查。工作紀錄包括：

1. 日報、月報及晴雨表。
2. 進度月報、估驗申請表。
3. 材試報告及紀錄、測試紀錄。
4. 製程品管報告及紀錄。
5. 施工圖及製造圖。
6. 施工申請及現場檢查紀錄。
7. 開工、竣工及缺失改善紀錄。
8. 開會紀錄、協調紀錄及來往函件。
9. 分包紀錄、採購紀錄、安裝紀錄。
10. 施工紀錄、施預力紀錄、灌漿紀錄。
11. 安全、衛生、環保紀錄及事故、災害紀錄。
12. 保險、保證、理賠及索賠紀錄。
13. 民眾阻撓、抗爭及損鄰紀錄。
14. 契約變更紀錄。
15. 測量紀錄、路權樁及控制樁紀錄。
16. 工程或工作暫停、復工、停工紀錄。
17. 人員與機具設備異動紀錄。

(二)文件存檔位置及存檔年限

1. 竣工時文件除製成電子檔外並載運回總公司保存。
2. 紀錄保存年限五年。
