

工程名稱：「111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程
(開口合約)」-北區

第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號
遊戲場新闢工程

工程序號：契約(112)景觀工程字第 001 號

整體品質計畫書

細類代碼	流水號	版次
PQ	002	01

主辦機關：桃園市政府工務局

設計單位：潘天壹建築師事務所

監造單位：湧泉景觀顧問有限公司

承攬廠商：五嶺營造有限公司

中 華 民 國 112 年 09 月

整體品質計畫書送審核章表

工程名稱：「111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)」-北區

第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程

契約編號：契約(112)景觀工程字第 001 號

(五嶺營造有限公司) 承攬單位	提報次數：第一次 提報日期： 年 月 日	簽章欄
	【蓋公司章】	主任技師： 品管人員： 工地負責人： 職安人員：
(湧泉景觀顧問有限公司) 監造單位	審查結果： ☐ 依審查意見重新提報（限定提報日期： ） ☐ 審查合格 審查合格日期： 審查合格文號：	簽章欄
	【蓋公司章】	【專業技師、現場監造主管均應簽章並簽屬日期】
(桃園市政府工務局) 核定機關	☐ 依修正意見重新提報（限定提報日期： ） ☐ 同意核定 核定日期： 核定文號： 機關戳章：	

備註：1. 計畫書經監造單位審查，轉請主辦機關核定後函覆監造單位及承攬廠商，始完成審核程序。

2. 本表應裝訂於計畫書首頁。

整體品質計畫書審查表

工程名稱：111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區
第 4 派-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程

審查日期： 年 月 日

工程主辦機關：桃園市政府工務局

編號：

項次	章節	審查項目	審查結果	
			符合	不符情形
一	計畫範圍	1.工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名詞定義。		
二	管理權責及分工	1.工地品管組織架構是否含專任工程人員。		
		2.是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數。		
		3.是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌（品管人員職掌應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目。		
三	施工要領	1.是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項目。		
		2.是否提示施工要領內容基本大綱。		
四	品質管理標準	1.是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目。		
		2.是否說明品質管理標準應檢討之項目。		
		3.是否標準化品質管理標準表單格式。		
五	材料與設備及施工檢驗程序	1.是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應送審資料（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）及預訂送審日期。		
		2.是否訂定材料試驗室應符合之規定。		
		3.是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式。		
		4.是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序。		
		5.是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序。		
		6.具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運轉類之系統架構。		
六	自主檢查表	1.是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目。		
		2.是否標準化自主檢查表之表單。		
		3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明。		

（其品質計畫內容及審查重點得視工程需求調整）

表 3-2 品質計畫審查意見表（續）

項次	章節	審查項目	審查結果	
			符合	不符情形
七	不合格品之管制	1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序。		
		2.施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法		
八	矯正與預防措施	1.矯正措施辦理時機是否訂定		
		2.矯正措施執行流程是否實際		
		3.預防措施辦理時機是否訂定		
		4.預防措施執行流程是否實際		
九	內部品質稽核	1.稽核範圍是否訂定		
		2.稽核頻率是否訂定		
		3.是否含稽核後之缺失列管及回饋		
十	文件紀錄管理系統	是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃。		
審查意見序號	計畫之頁碼或圖表編號	審 查 意 見	備 註	

監造負責人(監造主任)：

審查人：

(其品質計畫內容及審查重點得視工程需求調整)

目錄

壹、	計畫範圍.....	- 1 -
一、	依據	- 1 -
二、	工程概要.....	- 1 -
三、	工程主要施工項目及數量.....	- 2 -
四、	適用對象.....	- 6 -
五、	名詞定義.....	- 6 -
貳、	管理權責及分工.....	- 8 -
一、	品管組織.....	- 8 -
二、	工作職掌.....	- 9 -
參、	施工要領.....	- 11 -
一、	施工要領訂定.....	- 11 -
肆、	品質管理標準.....	- 28 -
一、	品質管理標準訂定.....	- 28 -
伍、	材料與設備及施工檢驗程序.....	- 55 -
一、	材料設備檢驗程序.....	- 55 -
二、	施工檢驗程序.....	- 93 -
陸、	設備功能運轉檢測程序及標準.....	- 118 -
柒、	自主檢查表.....	- 120 -
一、	目的	- 120 -
二、	自主檢查表之執行.....	- 122 -
捌、	不合格品之管制.....	- 147 -
一、	不合格材料及設備之管制.....	- 147 -
二、	施工不合格品之管制.....	- 147 -
三、	不合格品改正與追蹤.....	- 147 -
玖、	文件記錄管理系統.....	- 151 -
一、	文件管理系統.....	- 151 -
二、	記錄管理作業程序.....	- 152 -

圖目錄

圖 5-1、材料/設備選定送審流程圖	56	-
圖 5-2、材料設備廠驗流程圖	73	-
圖 5-3、材料設備檢驗流程圖	74	-
圖 5-7-1、放樣工程施工作業流程及檢驗圖	95	-
圖 5-7-2、鋼筋(銲接鋼線網)工程施工作業流程及檢驗圖	96	-
圖 5-7-3、模板工程施工作業流程及檢驗圖	97	-
圖 5-7-4、混凝土工程施工作業流程及檢驗圖	98	-
圖 5-7-5、鋪面標線工程施工作業流程及檢驗圖	99	-
圖 5-7-6、排水管溝工程施工作業流程及檢驗圖	100	-
圖 5-7-7、木作工程施工作業流程及檢驗圖	101	-
圖 5-7-8、金屬物件工程施工作業流程及檢驗圖	102	-
圖 5-7-9、鋼構工程施工作業流程及檢驗圖	103	-
圖 5-7-10、抵石子工程施工作業流程及檢驗圖	104	-
圖 5-7-11、水泥磨石子工程施工作業流程及檢驗圖	105	-
圖 5-7-12、混凝土面層工程施工作業流程及檢驗圖	106	-
圖 5-7-15、無縫地墊工程施工作業流程及檢驗圖	109	-
圖 5-7-16、人工草皮工程施工作業流程及檢驗圖	110	-
圖 5-7-17、植栽移植工程施工作業流程及檢驗圖	111	-
圖 5-7-18、植栽新植工程施工作業流程及檢驗圖	112	-
圖 5-7-19、草皮鋪植工程施工作業流程及檢驗圖	113	-
圖 5-7-20、照明工程施工作業流程及檢驗圖	114	-
圖 5-7-21、配(分)電箱工程施工作業流程及檢驗圖	115	-
圖 5-7-22、澆灌系統工程施工作業流程及檢驗圖	116	-
圖 5-7-23、兒童遊戲場工程施工作業流程及檢驗圖	117	-
圖 9-1、文件編碼圖例	152	-

表目錄

表 3-1、放樣工程施工要領	- 12 -
表 3-2、鋼筋(銲接鋼線網)工程施工要領	- 13 -
表 3-3、模板工程施工要領	- 14 -
表 3-4、混凝土工程施工要領	- 15 -
表 3-5、鋪面標線工程施工要領	- 16 -
表 3-6、排水管溝工程施工要領	- 16 -
表 3-7、木作工程施工要領	- 17 -
表 3-8、金屬物件工程施工要領	- 18 -
表 3-9、鋼構工程施工要領	- 18 -
表 3-10、抵石子工程施工要領	- 19 -
表 3-11、水泥磨石子工程施工要領	- 20 -
表 3-12、混凝土面層工程施工要領	- 20 -
表 3-13、高壓混凝土緣石工程施工要領	- 21 -
表 3-14、透水性鋪面工程施工要領	- 21 -
表 3-15、無縫地墊工程施工要領	- 22 -
表 3-16、人工草皮工程施工要領	- 22 -
表 3-17、植栽移植工程施工要領	- 22 -
表 3-18、植栽新植工程施工要領	- 24 -
表 3-19、草皮鋪植工程施工要領	- 24 -
表 3-20、照明工程施工要領	- 25 -
表 3-21、配(分)電箱工程施工要領	- 26 -
表 3-22、噴灌工程施工作業施工要領	- 27 -
表 3-23、兒童遊戲場工程施工要領	- 27 -
表 4-1、放樣工程品質管理標準	- 29 -
表 4-2、鋼筋(銲接鋼線網)工程品質管理標準	- 30 -
表 4-3、模板工程施工品質管理標準	- 31 -

表 4-4、混凝土工程品質管理標準表	- 32 -
表 4-5、鋪面標線工程品質管理標準	- 34 -
表 4-6、排水管溝工程施工品質管理標準	- 35 -
表 4-7、木作工程施工品質管理標準	- 37 -
表 4-8、金屬物件工程施工品質管理標準表	- 38 -
表 4-9、鋼構工程施工品質管理標準表	- 39 -
表 4-10、抵石子工程施工品質管理標準表	- 40 -
表 4-11、水泥磨石子工程施工品質管理標準表	- 41 -
表 4-12、混凝土面層工程施工品質管理標準表	- 42 -
表 4-13、高壓混凝土緣石工程施工品質管理標準表	- 43 -
表 4-14、透水性鋪面工程施工品質管理標準表	- 44 -
表 4-15、無縫地墊工程施工品質管理標準表	- 45 -
表 4-16、人工草皮工程施工品質管理標準表	- 46 -
表 4-17、植栽移植工程施工品質管理標準表	- 48 -
表 4-18、植栽新植工程施工品質管理標準表	- 49 -
表 4-19、草皮鋪植工程施工品質管理標準表	- 50 -
表 4-20、照明工程施工品質管理標準表	- 51 -
表 4-21、配(分)電箱工程施工品質管理標準表	- 52 -
表 4-22、澆灌工程檢查管理標準表	- 53 -
表 4-23、兒童遊戲場工程施工品質管理標準表	- 54 -
表 5-2、材料設備送審管制總表	- 57 -
表 5-2、材料自主檢查表	- 75 -
表 5-3、材料退料紀錄單	- 76 -
表 5-4、材料設備品質抽驗紀錄表	- 77 -
表 5-5、材料設備檢(試)驗管制總表	- 78 -
表 6-1、單機運轉自檢標準表	- 119 -
表 6-2、單機運轉自檢標準表	- 119 -
表 8-1、不合格品改善管制總表	- 148 -
表 8-2、不合格品改正紀錄表	- 149 -

表 8-3、不合格品改善照片表	- 150 -
表 9-1、文件紀錄分類代碼	- 152 -

附件

一、 工程人員證書	- 153 -
(一)、 主任技師證書	- 154 -
(二)、 工地主任證	- 154 -
(三)、 品管人員結業證書	- 155 -
(四)、 職業安全衛生業務主管證書	- 156 -

壹、計畫範圍

一、依據

本公司保證本工程各項施工作業，均能符合契約規範之品質要求，設依據下列各項制定本工程品質計畫書，以為施工品質之最高指導方針：

- (一)、「行政院公共工程委員會頒布的」「公共工程施工品質管理作業要點」。
- (二)、工程契約規範。
- (三)、設計圖說。
- (四)、施工說明書、施工規範。
- (五)、本公司品質管制制度。

二、工程概要

- (一)、工程名稱：「111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)」
-北區第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程
- (二)、主辦機關：桃園市政府工務局
- (三)、設計單位及負責人：潘天壹建築師事務所
- (四)、監造單位：湧泉景觀顧問有限公司
- (五)、施工廠商及主任技師：五嶺營造有限公司、曾英俊技師
- (六)、施工地點：桃園市蘆竹區
- (七)、本次派工工期：訂於 112 年 06 月 26 日開工，工期 180 個日曆天
- (八)、本次派工金額：新台幣 18,158,430 元整

三、工程主要施工項目及數量

項次	項目及說明	單位	數量
壹	施工費		
一	土木工程類		
3	土方工作，細整地	M2	2,332.0
12	土方工作，挖方	M3	680.0
13	土方工作，填方	M3	680.0
17	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm ²	M3	25.8
21	鋼筋，SD280，連工帶料	T	2.1
27	場鑄結構混凝土用模板，普通模板，乙種	M2	40.0
37	混凝土附屬品，伸縮縫	M	155.0
38	標線，熱處理聚酯，反光	M2	8.5
43	級配粒料底層，碎石級配	C. M3	6.6
二	排水工程類		
2	排水管溝，開挖回填，深度 30-60cm	M	124.0
12	產品，預鑄混凝土，預鑄陰井，寬 60x 長 60x 深 90cm，含鍍鋅格柵板	組	6.0
15	產品，軟式盲溝透水管 2"，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等	M	280.0
17	產品，滲透陰井 30*30*35cm	組	19.0
新增	排水管溝(明溝)	M	33.2
三	金屬、木料及管材等資材類		
52	硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管)，含管配件，標稱 50mm	M	129.5
55	硬質聚氯乙烯塑膠管(B 管厚管)，含管配件，標稱 100mm	M	56.0
61	硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，含管配件，標稱 25mm	M	161.9
72	硬質聚氯乙烯塑膠管，E 管，含管配件，標稱 28mm	M	600.0
80	產品，電線及電纜，600V 聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm ²	M	320.0
81	產品，電線及電纜，600V 聚氯乙烯絕緣電線，絞線，3.5mm ²	M	140.0
82	產品，電線及電纜，600V 聚氯乙烯絕緣電線，絞線，5.5mm ²	M	600.0
214	燈具配管，工資費	M	1,105.5
215	燈具配線，工資費	M	1,060.0
221	鍍鋅格柵板及框座	KG	287.0
新增	產品，導線管，聚氯乙烯披覆金屬軟管，含管配件，標稱 22mm	M	320.0
四	鋪面及景觀設施工程類		
4	混凝土表面處理，水泥拉毛處理	M2	120.0
8	混凝土表面處理，水泥粉光處理	M2	172.0
14	緣石，預鑄，25≤全高<30cm	M	41.7
18	透水性鋪面，無細粒料混凝土，宜蘭石 TH=3cm	M2	906.3

19	透水性鋪面，無細粒料混凝土，3 分清碎石組成	M2	1,433.0
27	橡膠地磚，無縫，SBR(含膠)，1cm	M2	2,553.0
34	兒童遊戲場設備，人工草皮，t=4.0cm	M2	278.0
80	產品，宜蘭石	M3	28.2
新增	磨石子座椅	M	70.0
新增	座椅靠背	M	24.0
新增	入口意象牆	M	6.0
新增	入口意象牆不銹鋼板	組	1.0
新增	鍍鋅鋼板，鋼板收邊，W=5cm，T=4.5mm	M	344.0
五	綠化植栽工程類		
1	產品，植栽，客土，砂質壤土，含無紅火蟻證明	C. M3	136.7
4	清除及掘除，環境整理，含雜草雜木清除	M2	2,332.0
14	喬、灌木移植工程		
A	移植，10≤米高直徑<15m，喬木，境內移植	株	39.0
B	移植，15≤米高直徑<20m，喬木，境內移植	株	8.0
C	移植，20≤米高直徑<25m，喬木，境內移植	株	1.0
D	移植，25≤米高直徑<30m，喬木，境內移植	株	1.0
15	喬木栽植工程		
0	喬木植栽，第三類 C 組，10cm≤米高直徑，360cm≤樹高，160cm≤樹寬	株	5.0
16	灌木及地被栽植工程		
T	產品，沿階草，高度<20cm，寬度<10cm，容器直徑<10cm 盆苗	株	1,152.0
V	產品，紫嬌花，20≤高度<30cm，20≤寬度<30cm	株	335.0
52	產品，馬纓丹，20≤高度<25cm，20≤寬度<25cm	株	455.0
57	植草，密鋪，不限草種(假儉草)	M2	672.0
58	植草，撒播，不限草籽(花籽)，種籽(假儉草)	M2	133.7
六	照明工程類		
1	LED 照明設備，景觀高燈，H:3.5~5M	盞	15.0
4	LED 照明設備，LED 軟條燈	M	65.0
16	產品，分電箱，電源開關箱，不銹鋼板	座	1.0
19	變壓器防水開關器保護箱	個	3.0
新增	防水型電源供應器	個	3.0
新增	NFB 2P 50AF 50AT 10KA 220V	個	1.0
新增	漏電斷路器 ELCB 300MA	組	3.0
七	噴灌工程		
3	產品，景觀灌溉系統，整體安裝測試與調整費	次	1.0
4	產品，景觀灌溉設備，管溝開挖及回填(景觀灌溉系統用)	M	1,267.4

9	電機基本材料及施工方法，電磁開關	只	3.0
10	產品，景觀灌溉設備，防水接頭	只	6.0
16	產品，景觀灌溉設備，閘閥	只	2.0
26	產品，景觀灌溉設備，噴灌專用馬達，3HP	組	1.0
29	產品，景觀灌溉設備，噴灌控制箱	個	1.0
35	產品，景觀灌溉設備，水閘箱	組	6.0
36	產品，電機基本材料及施工方法，24 小時定時器	只	1.0
39	產品，閘，快速給水閘，含給水閘插桿組，（插桿、活動彎頭及接頭等）	只	6.0
44	產品，閘，快速給水閘，QCV 銅製	只	6.0
53	水泥混凝土構造物，蓄水設施，5T，含 2" 浮球遙控閘及爬梯	組	1.0
九	兒童遊具工程		
38	橡膠地磚，彩色無縫式橡膠地墊(EPDM 材質)th:10mm	M2	158.0
45	雙人漫步機(豪華版)	座	1.0
49	雙人伸腰伸背器(簡易版)	組	1.0
59	雙人扭腰器(豪華版)	座	1.0
62	雙人大輪轉(豪華版)	座	1.0
64	雙人坐蹬(豪華版)	座	1.0
新增	兒童遊戲場設備，土丘攀爬設施	式	1.0
新增	兒童遊戲場設備，滑梯，水泥磨石子	M2	30.0
新增	兒童遊戲場設備，攀爬牆	式	1.0
新增	地景，滑草坡區	M2	20.9
新增	地景，梯田意象爬坡區	M2	9.2
新增	地景，磨石子扶手	M	31.6
新增	兒童遊戲場設備，鳥巢及一般鞦韆	組	1.0
新增	兒童遊戲場設備，遮陽風箏	座	1.0
新增	兒童遊戲場設備，遮陽風箏(大)	座	1.0
新增	光影鋼棚	座	1.0
新增	安全扶手欄杆	M	46.0
新增	鍍鋅鋼料，遊戲設施告示牌	座	6.0
新增	鍍鋅鋼料，遊戲場告示牌	座	1.0
新增	設施使用許可，各項申請代辦文件(含簽證費用等)	式	1.0
十	假設工程、人力機具及交通維持		
1	假設工程		
A	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌，鋁質，長 120x 寬 75cm，安裝費	座	1.0
新增	工務所	月	6.0
3	人力機具		

A	技術工	工	105.0
B	大工	工	50.0
C	小工	工	195.0
J	開挖機，PC30	天	5.0
O	租用小型鏟土機	天	5.0
Q	吊卡車(8 噸以上)	時	16.0
T	吊車(25 噸-50 噸)	時	80.0
33	灑水車(3.0-3.9 立方公尺)	天	2.0
36	機動平土機，100~109kw	時	40.0
37	推土機，60~69KW	時	40.0
42	小型貨車，總重 3-3.9T	天	11.0
50	發電機(50KV)	天	6.0
52	傾卸貨車，總重 15-15.9t	時	16.0
55	挖土機板車託運作業	趟	2.0
4	施工測量，放樣	M2	2,332.0
貳	間接工程費		
一	職業安全衛生管理及環境保護措施費		
1	職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	組	1.0
2	職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	組	1.0
3	職業安全衛生，一般器材，滅火器	個	1.0
4	職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽，工地用	個	10.0
5	職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心	個	10.0
6	職業安全衛生，保護器材，，高處作業，安，背負式安全帶	組	1.0
8	職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱	組	1.0
10	環境保護，施工便道灑水	次	1.0
11	環境保護，沖洗設備	式	1.0
12	環境保護，環境清潔維護費	處	1.0
14	環境保護，其他環境保護措施	式	1.0
二	工程品質管理費		
1	資料送審，品質管理計畫書	份	1.0
2	資料送審，施工計畫	份	1.0
3	管理人員，品質管理人員費	月	6.0
4	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045 混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	2.0
5	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3051 混凝土鑽心試體及切鋸試體抗壓及抗彎強度試驗法	組	1.0
7	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	組	2.0

8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	組	2.0
11	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，土壤夯實試驗	組	1.0
18	木種鑑定試驗費	組	1.0
新增	品質管理，試驗規範及標準，鋼結構焊道檢測	次	1.0
新增	無細料混凝土透水檢測試驗費	組	1.0
三	包商利潤	式	1.0
四	營造綜合保險費	式	1.0
五	營業稅	式	1.0
	小計(間接工程費)		
參	台電及台水相關申請作業費	式	2.0
肆	外線補助費	式	1.0
伍	水質檢測費用	式	1.0

四、適用對象

(一)、施工管理人員、品管人員、負責本工程相關業務之公司同仁皆適用之。

(二)、與本公司訂立契約之

1. 所有分包協力廠商。
2. 所有材料供應商。
3. 設備製造廠商。
4. 所有施工人員。

(三)、適用對象均應遵循計畫書之相關規定從事管理、執行、及驗證等業務，以保證工程各項作業品質均確實符合業主合約規範要求。

五、名詞定義

(一)、機關（或稱甲方）：係指桃園市政府工務局，為簽訂本契約起造本工程之業主。

(二)、監造單位：湧泉景觀顧問有限公司。

(三)、廠商（或稱乙方或承包商）：係指簽訂契約之本工程承包人，廠商包括其法定代理人，合法繼承人。

(四)、工程司(或稱甲方工程司或工程司)：係指經機關以書面指派，授權之個人（自然人），代表機關負責本契約之執行者。

- (五)、專任工程人員：係指受聘於營造業之技師或建築師，擔任其所承攬工程之施工技術指導及施工安全之人員。
- (六)、工地負責人：係指受聘於營造業，擔任其所承攬工程之工地事務及施工管理之人員。
- (七)、品管人員：係指本公司依行政院工程會規定，所聘任指派具備公共工程施工品質管理作業要點所定合乎品管人員資格條件，經依規定報備之品管業務人員。
- (八)、職業安全衛生人員：係指本公司規定所指派之專員，並授權其專職統籌辦理執行職業安全衛生業務與督導工作，並向公司負責。
- (九)、施工品質檢驗：工程材料經施工或加工後之成果即施工品質，應實施檢驗。
- (十)、檢驗停留點(限止點)：在未經監造單位完成抽查核可之前，該作業流程不能繼續進行之作業流程點。監造單位規定之檢驗停留點包括文件、施工機具設備查證、材料設備審查及檢驗、施工品質檢驗、重要施工作業檢查、隱蔽部位檢查及其他規定事項等。各項檢驗停留點應經檢驗或檢查合格不得進行下一階段作業。檢驗停留點監造單位應事先規劃，並於開工後彙整通知施工廠商，並要求廠商提出檢驗申請單及配合辦理。
- (十一)、施工自主檢查：各項施工作業完成後，承攬廠商施工人員應實施自主檢查。
- (十二)、施工抽查：廠商各項施工作業施作完成並實施自主檢查無誤後，監造單位以施工抽查記錄表實施施工抽查。
- (十三)、材料管制：指本工程使用之產品製程管理與檢驗作業。
- (十四)、施工管制：指本工程施工過程執行之施工計畫、管理與檢驗。
- (十五)、不合格品：只經檢視試驗、檢驗等過程所發生品質不符合要求之文件。材料、施工成果等情形，稱之為不合格品。
- (十六)、不合格品管制：不符合要求之文件、材料、施工成果等情形。

貳、管理權責及分工

一、品管組織

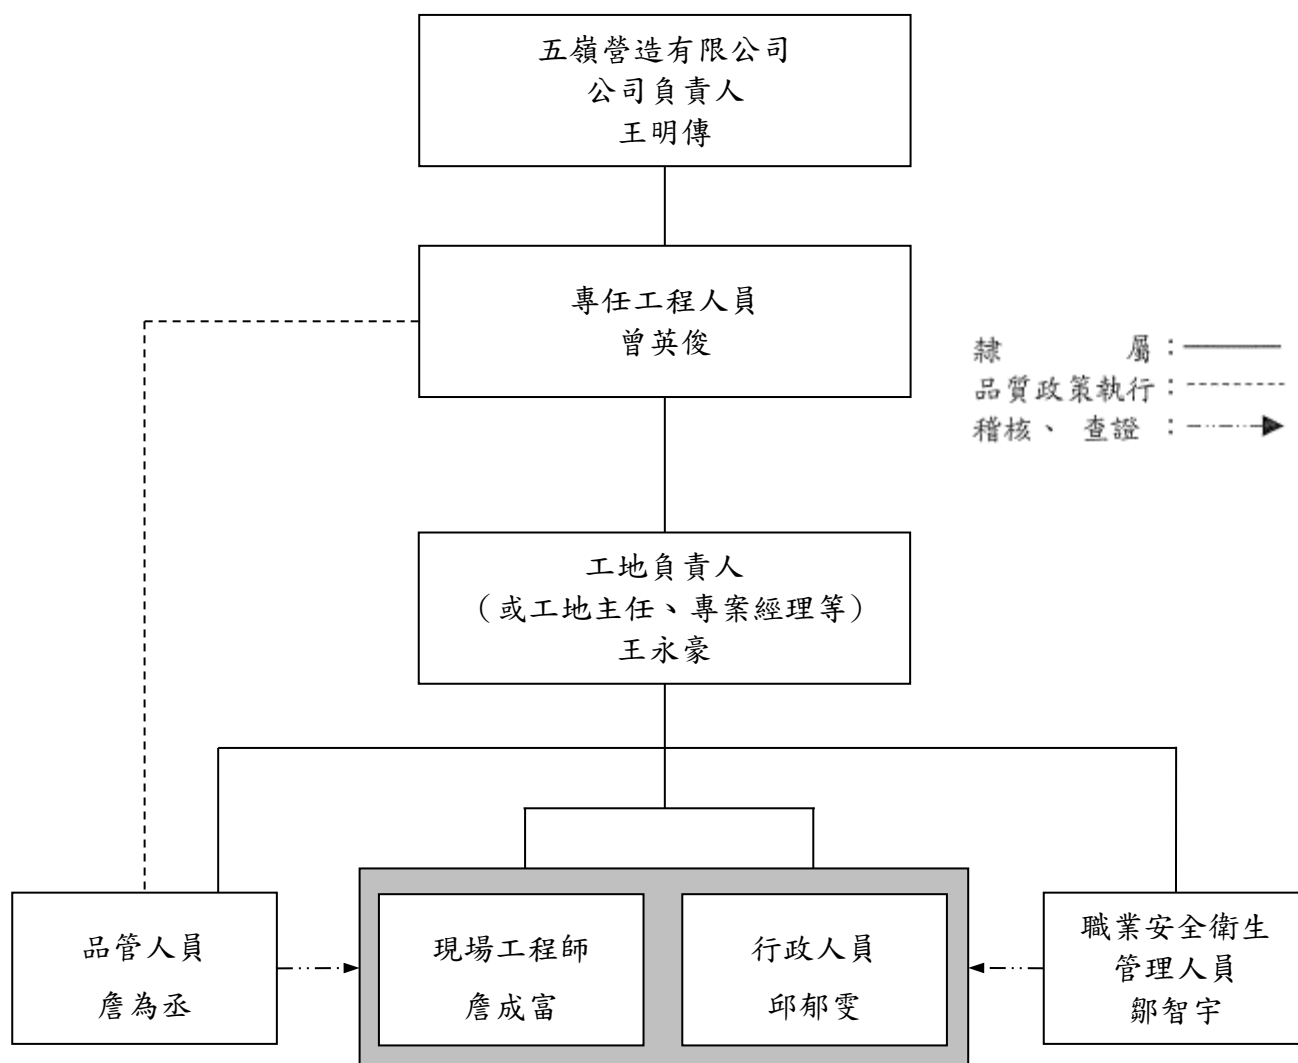


圖 2-1、公司組織架構圖

備註：

1. 工地組織圖依實際人員配置。
2. 主任技師、工地負責人、品管人員及職安人員有異動時，應報請監造單位及主辦機關核備，工地組織圖一併更新。

二、工作職掌

職稱	工作職掌
專任工程人員 (主任技師) 曾英俊	1. 查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章。 2. 於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章。 3. 督察按圖施工、解決施工技術問題。 4. 依工地負責人之通報，處理工地緊急異常狀況。 5. 查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章。 6. 營繕工程必須勘驗部分赴現場履勘，並於申報勘驗文件簽名或蓋章。 7. 主管機關勘驗工程時，在場說明，並於相關文件簽名或蓋章。 8. 其他依法令規定應辦理之事項。
工地負責人 (工地主任) 王永豪	1. 依施工計畫書執行按圖施工。 2. 按日填報施工日誌。 3. 工地之人員、機具及材料等管理。 4. 工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務。 5. 工地遇緊急異常狀況之通報。 6. 其他依法令規定應辦理之事項。
品管人員 詹為丞	1. 品管負責人負責綜理乙方品管業務及與甲方之聯繫工作。 2. 依據工程契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，並據以推動實施。 3. 執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。 4. 品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤改善。 5. 依合約規定負責品質文件、紀錄之管理。 6. 現場施工作業之監督，及其他提升工程品質事宜。 7. 督導施工組確實執行品檢工作，所有品管文件及報表之填寫。 8. 辦理自驗及會同甲方試驗人員等辦理品管檢驗及試驗作業。 9. 執行材料檢驗與工地試驗、檢驗工作之協調。 10. 各種品管文件(如證明、報告、紀錄、施工計劃等圖說)之建立與審查。 11. 各單項工程之檢驗及會同業主辦理完工審查。 12. 派員查驗分包商、供應商與製造商之品管流程。

	13. 經授權後得代理品管負責人執行指定工作。 14. 輔助與督導各協力廠商、材料供應商與製造商品管工作品管工作。 15. 整理各種文件提送作業。 16. 配合品質控制作業、執行材料檢驗、工地檢驗及自主檢查工作。 17. 針對工程現況與施工品質作持續性查驗與評估，填寫各項作業之查驗與評估文件，呈報品管負責人。 18. 負責一切品管文件檔案整理及建檔。 19 其他臨時交辦事項。
職業安全衛生 管理人員 鄒智宇	1. 執行督導及記錄整理。 2. 職業安全衛生協議組織。 3. 自主檢查及記錄。 4. 其他工地安全衛生管理業務之執行
現場工程師 詹成富	1. 負責施工計畫撰寫及工程施工。 2. 簽報工程協力廠商工程付款。 3. 相關日報表之填寫。 4. 負責工程施工中協力廠商施工品質之控管與自主品管之查驗。 5. 會同甲方辦理現場施工品質查驗。 6. 每日安全衛生自動檢查執行與紀錄填寫。 7. 負責工程材料之管理。 8. 進場材料之存放、標示管理
行政人員 邱郁雯	1. 綜合施工處理人事、出納、總務等業務。 2. 負責處理非工程技術性之外涉事宜。 3. 宣達公司常態性之通知與公告。 4. 安排增進施工處同仁情誼相關事宜。

參、施工要領

一、施工要領訂定

本工程後續依據派工內容訂定各項作業施工要領，以常用工項詳述如下：

項次	施工要領	附註
1	放樣工程施工要領	表 3-1
2	鋼筋(銲接鋼線網)工程施工要領	表 3-2
3	模板工程施工要領	表 3-3
4	混凝土工程施工要領	表 3-4
5	鋪面標線工程施工要領	表 3-5
6	排水管溝工程施工要領	表 3-6
7	木作工程施工要領	表 3-7
8	金屬物件工程施工要領	表 3-8
9	鋼構工程施工要領	表 3-9
10	抵石子工程施工要領	表 3-10
11	水泥磨石子工程施工要領	表 3-11
12	混凝土面層工程施工要領	表 3-12
13	高壓混凝土緣石工程施工要領	表 3-13
14	透水性鋪面工程施工要領	表 3-14
15	無縫地墊工程施工要領	表 3-15
16	人工草皮工程施工要領	表 3-16
17	植栽移植工程施工要領	表 3-17
18	植栽新植工程施工要領	表 3-18
19	草皮鋪植工程施工要領	表 3-19
20	照明工程施工要領	表 3-20
21	配(分)電箱工程施工要領	表 3-21
22	澆灌工程施工要領	表 3-22
23	兒童遊戲場工程施工要領	表 3-23

表 3-1、放樣工程施工要領

施工步驟	使用材料	機具設備	注意事項
1. 施工前準備			1. 擬定測量計劃 2. 選擇適當的測量方式及工具
2. 控制樁測量	鋼釘或其他適合材料	經緯儀 水準儀 皮尺	1. 本工程部份若與其他工程相接，導線點須與其他施工單位相同
3. 縱橫斷面測量	木樁 鋼釘或其他適合材料	經緯儀 水準儀 皮尺	1. 測定主要結構體橫斷面線 2. 橫斷面各樁號中心樁之高程應與縱斷面樁號高程一致
4. 結構物放樣	木樁	經緯儀	1. 位置及高程須符合圖說規定 2. 放樣誤差須符合圖說要求

表 3-2、鋼筋(鉚接鋼線網)工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	依據設計圖，施工說明核算數量繪製結構體每根鋼筋剪裁長度
2. 材料進場	鋼筋 鉚接鋼線網	裝卸用貨車 吊車	1. 鋼筋、鉚接鋼線網幅射線檢驗報告，出場報告，取樣送驗 2. 鋼筋、鉚接鋼線網須墊高儲放，加蓋帆布 3. 鋼筋、鉚接鋼線網應維持清潔
3. 加工	鋼筋 鋼筋 鉚接鋼線網	加工機具	1. 裁切長度 2. 排列層次 3. 彎勾和錨定長度 4. 鋼筋架高，分類堆置
4. 組立	鋼筋 鉚接鋼線網 鐵絲 墊塊	吊車	1. 鐵絲綁紮以防止鋼筋、鉚接鋼線網位移 2. 垂直鋼筋每點綁紮 1. 40D 或依施工圖，相鄰兩根鋼筋搭接位置至少應錯開直徑之 25 倍 2. 鉚接鋼線網搭接至少一網目且 $\geq 20\text{cm}$ 可跳隔綁紮 3. 鉚接鋼線網鉚接長度至少 10cm 4. 保護層墊置妥善 5. 角隅補強筋妥善處理
5. 組立後檢查		皮尺	1. 鉚接鋼線網號數及支數檢查 2. 確定排列層次，綁紮牢固 3. 間距與保護層須符合圖說規範 4. 錨定及彎勾長度，搭接位置及長度符合圖說規定

表 3-3、模板工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 臨土側清水模、臨水側普通模。 2. 決定工法，模板應力分析及繪製施工圖送審核可據以施工。
2. 模板進場		裝卸用貨車 吊車	1. 注意板面結合間隙。 2. 角材尺寸、平直度及間距要符合規定。 3. 繫結器尺寸及種類要與圖說規範相符。 4. 各類材料分別堆放。
3. 放樣		經緯儀 水準儀 皮尺	1. 依施工放樣圖說。 2. 放樣尺寸高程及坡度須符合圖說規範。
4. 模板及支撐 組立	鐵絲 墊塊	吊車	1. 構造物斷面尺寸須符合規定。 2. 牆模板之垂直精度與頂部水平精度要符合圖說規範。 3. 埋設物件及位置須符合規定。 4. 底部高程及平整度須符合圖說規範。 5. 模板內須維持清潔。 6. 支撐須為穩固狀態。 7. 繫結材料須符合規定(不可將不適合之材料埋入。 8. 須有脫模劑。
5. 拆模		L 型撬棒	1. 基礎牆版等各部份模板依規定期限拆除 2. 清理模板及塗油
6. 環境保護			1. 工地環境清潔檢查

表 3-4、混凝土工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 模板尺寸、高程、支撐及鋼筋組立須檢查 2. 接縫須妥善處理 3. 保護層應符合圖說規定 4. 施工機具及照明設備須備妥 5. 防護材料及安全措施須準備完善 6. 澆置前須清理及檢查
2. 拌合廠生產混凝土		拌合設備	1. 檢視配比設計資料 2. 供應量及運輸路況之規劃，避免供料中斷
3. 到場材料檢查	混凝土	預拌車 坍度測定儀 氯離子測定儀	1. 應進行坍度、氯離子試驗 2. 檢視出料單之出廠時間 3. 抗壓試體須製作
4. 混凝土澆置	混凝土	預拌車 洩槽 壓送車 振動棒	1. 澆置順序須妥善規劃及執行 2. 作業人員的分配及搗實須妥善 3. 澆置高度，厚度及水平控制須符合圖說規定 4. 施工縫妥善處理以維持接合面連結強度 5. 洩落高度超過 1.5m 須使用漏斗
5. 養護			1. 混凝土表面須保持濕潤 2. 視水泥強度調整養護時間
6. 拆模後混凝土表面修飾	水泥砂漿	砂磨機	1. 鐵線及繫結器須修剪或拆除 2. 保護層及蜂巢修補須用原配比修飾 3. 混凝土之平整度、垂直度及高程須依圖說進行修飾

表 3-5、鋪面標線工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 檢驗圖面 2. 基準點與高程點是否已確認
2. 材料進場	熱處理聚酯標線	裝卸用貨車	1. 畫線規格、尺寸 2. 標線顏色是否與圖說相符。
3. 施工中		水平尺 水線 熱拌標線機	現場整理及清潔並塗黏層劑。
4. 完成後檢查			1. 表面乾淨整潔

表 3-6、排水管溝工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 依據設計圖，施工說明核算涵管種類，規格及數量辦理採購 2. 依圖說選擇適用的臨時擋土設施
2. 進場儲放	管材	裝卸用貨車 吊車	1. 吊放時要做好防護措施 2. 需注意管徑、厚度及有無裂痕 3. 儲放地點不得影響施工
3. 測量放樣及管溝開挖		挖土機 吊車 經緯儀 水準儀 皮尺	1. 機具進場，並先檢查機具性能 2. 依圖說放樣開挖 3. 定樣板，拉水線，控制坡高 4. 底層土方整平夯實及改良 5. 開挖前地表須清理乾淨 6. 溝底材料須符合圖說規定
4. 埋設	管材及其他適用材料	吊車 卡車	1. 底部鋪設墊層 2. 拉水線修正 3. 管內部需清除乾淨 4. 接縫處理，封漿止漏
5. 回填夯實	適當的回填材料	挖土機 卡車 壓路機	1. 確實做好灑水及分層夯實的動作 2. 回填之高程及坡度須符合圖說規定

表 3-7、木作工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 依圖面造型排列配置 2. 木料尺寸規格須符合圖說規範 3. 各五金配件計算 4. 現地須整理乾淨
2. 測量放樣		經緯儀 水準儀 皮尺	位置與高程須符合圖說規範
3. 材料進場	木料 五金材料 繫結鐵件	裝卸用貨車	1. 木料堆置儲放須符合保護措施規定 2. 依規定施作防腐處理
4. 安裝	木料 五金材料 防腐塗料 油漆	木工機具 裁切組裝工具 角尺 水準器 吊車	1. 施工面清潔並乾燥 2. 依施工大樣圖施作 3. 須避免彎曲變形及接合不準確等問題 4. 若木製品與混凝土或污工面有直接接觸時，要先塗佈適當的防腐塗料 5. 高架作業人員的安全措施完善 6. 需注意水平與垂直度 7. 鐵件的繫結與材質需符合規定並依圖說規範要求 8. 結構料須栓緊牢固 9. 須塗保護漆 10. 原有防腐但若遭破壞，須再做二次防腐

表 3-8、金屬物件工程施工要領

施工步驟	使用材料	機具設備	說明及注意事項
1. 施工前準備		交維器具設置	1. 現場放樣量測 2. 材料訂製及加工 3. 警示與交維設置
2. 材料檢查	結構用鋼料、不鏽鋼料、鋁合金、鋁料		1. 符合設計圖說相關尺寸 2. 外觀無損壞情形
3. 安裝施工		手工機具、卡車、吊車	1. 基礎深度與範圍符合圖說 2. 注意設置方向、高度與垂直度 3. 烤漆與送審核定相同 4. 完成面無變形掉漆 5. 核對設計圖說 6. 完成面正直無歪斜、穩固無鬆動

表 3-9、鋼構工程施工要領

施工步驟	使用材料	機具設備	說明及注意事項
1. 施工前準備		交維器具設置	1. 現場放樣量測 2. 材料訂製及加工 3. 警示與交維設置
2. 材料檢查	結構用鋼料、不鏽鋼料、鋁合金、鋁料		1. 符合設計圖說相關尺寸 2. 外觀無損壞情形
3. 安裝施工		手工機具、卡車、吊車	1. 基礎深度與範圍符合圖說 2. 注意設置方向、高度與垂直度 3. 烤漆與送審核定相同 4. 完成面無變形掉漆 5. 核對設計圖說 6. 完成面正直無歪斜、穩固無鬆動

表 3-10、抵石子工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 將混凝土表面異物清除 2. 控制粉刷厚度 3. 減少粉刷料過量吸水 4. 依設計圖或工程司之指示設置工作縫及伸縮縫
2. 放樣	木椿	經緯儀 水準儀	1. 測定施工範圍 2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正
3. 水泥砂漿製作	水泥		1. 水泥砂漿之配合比例採用一份水泥及三份砂與適量之水拌和 2. 水泥砂漿之拌和應置於一接合嚴密不漏水之容器內拌和。
4. 底層處理		鏟刀 木尺	1. 水泥與砂比例 1:3 與適量石粒、水拌合 2. 應於接合不漏水之容器內 3. 拌合時間不少於 3 分鐘
5. 抵石子施工		鏟刀 抵石海棉塊	1. 底層乾透後，應先以鏟刀用力均勻壓平，並儘量避免產生鏟刀痕 2. 水泥初凝後，即以乾淨之海綿塊抵洗表面，完成面應洗刷清潔 3. 自高處向低處施工 4. 水泥碎石料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料 5. 抵石子之面積過大時，應分格施工，分格之大小應依工程司指示辦理 6. 牆面如須留置螺絲及其他洞孔時，應於施工前預先埋設，不得在抵石子完成後再行鑿補
6. 後續工作			整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清

表 3-11、水泥磨石子工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 混凝土表面異物清除 2. 安排工作動線 3. 依照圖說施作伸縮縫
2. 放樣	木椿	經緯儀 水準儀	1. 測定施工範圍 2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正
3. 水泥砂漿製作	水泥砂漿 石料		1. 水泥與砂比例 1:3 與適量石粒、水拌合 2. 應於接合不漏水之容器內 3. 拌合時間不少於 3 分鐘
4. 底層處理	水泥砂漿 石料	鏟刀 木尺	1. 下料需均勻、厚度一致 2. 鏟刀拍打鏟平施壓
5. 磨石子施工	水泥砂漿 石料	鏟刀 抵石海棉塊	1. 底層乾透後，應先以鏟刀用力均勻壓平，並儘量避免產生鏟刀痕 2. 水泥初凝後，即以乾淨之海綿塊抵洗表面，完成面應洗刷清潔 3. 自高處向低處施工 4. 水泥碎石料內禁止摻其他化學膠合物，但可酌加礦物填縫料
6. 後續工作			整幅施工面應均勻清淨，不得混濁不清

表 3-12、混凝土面層工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 混凝土表面異物清除 2. 安排工作動線 3. 依照圖說施作伸縮縫
2. 材料拌合	水泥砂漿 石料	裝卸用貨車	1. 水泥與砂比例 1:3 與適量石粒、水拌合 2. 應於接合不漏水之容器內 3. 拌合時間不少於 3 分鐘
3. 下料與鏟平	水泥砂漿 石料		1. 下料需均勻、厚度一致 2. 鏟刀拍打鏟平施壓
4. 乾透後斬琢		機械拉毛	1. 待泥漿面完全乾透後進行斬琢 2. 拉毛、掃毛間距 < 1cm 3. 深度需均勻
5. 完成			1. 施工表面應均勻清潔 2. 周邊環境整理清掃 3. 澆置後七日內表面須灑水保持濕潤狀態

表 3-13、高壓混凝土緣石工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備		鋼捲尺	1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 基準點與高程點確認
2. 材料進場	緣石	裝卸用貨車 吊車	1. 規格、尺寸 2. 出廠或進口證明 3. 材料試驗證明
3. 緣石鋪設	緣石	拖板車 木槌 橡皮榔頭	1. 應儘可能使用整塊地磚、界石之單元代替切割單元 2. 緣石鋪設時須先以木槌或橡皮榔頭輕擊表面，使磚與襯墊砂或水泥砂漿緊密接合，同時調整高度，若敲擊聲響有異時，即表示仍未緊密接合，須立即掀開重新鋪貼 3. 剛鋪設完成未乾漿之地面，應設置圍籬防止人車進入，維持鋪面完成面之平整
4. 完成			1. 施作完成後，應立即清理鋪面表面 2. 已安裝完成之緣石表面應保持清潔

表 3-14、透水性鋪面工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	級配粒料	平路機 挖土機 振動輾壓機	1. 路面雜物須清除乾淨 2. 路面須整平壓實 3. 如有洞穴或不平須填平夯實 4. 按契約規格選擇材料
2. 碎石級配鋪設	碎石級配	卡車 刮路機 震動壓路機	1. 鋪設前完成碎石級配須符合圖說 2. 厚度控制須符合圖說規範 3. 鋪設後壓密度試驗須符合圖說規範 4. 平整度，厚度及坡度須符合圖說規範
3. 表面修飾及養護	水泥砂漿	動力修面機械	1. 用動力修面機械刮除不規則之混凝土，並修平使鋪面層產生均勻紋理 2. 自動修面無法完成則用手工修面
5. 完成			1. 施工表面應均勻清潔 2. 周邊環境整理清掃

表 3-15、無縫地墊工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 材料進場	彈性地墊	裝卸用貨車	1. 材料進場需墊高至少 10cm。
2. 放樣及組裝	水平儀、水線 彈性地墊 黏合劑 EPDM		1. 組裝位置確認抽查前量化填入施工抽查紀錄表。 2. 安全距離 $\geq 183\text{cm}$ 3. 雨天時不得施作
3. 完成			1. 施工表面應均勻清潔 2. 周邊環境整理清掃

表 3-16、人工草皮工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 材料進場	人工草皮	裝卸用貨車	1. 材料進場需墊高至少 10cm。
2. 放樣及組裝	水平儀、水線 人工草皮 黏合劑	美工刀	1. 組裝位置確認抽查前量化填入施工抽查紀錄表。 2. 安全距離 $\geq 183\text{cm}$ 3. 雨天時不得施作
3. 完成			1. 施工表面應均勻清潔 2. 周邊環境整理清掃

表 3-17、植栽移植工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 樹種須確認並檢視出廠報告 2. 土壤肥料等材料要求須符合圖說規範 3. 固定材料及水源須符合圖說
2. 現地整理	肥料，鐵件	挖土機	1. 排水坡度整理須符合圖說 2. 現地依圖說規範整平壓實
3. 樹種移植	喬木	挖土機、卡車	1. 喬木斷根處理 2. 修枝處理 3. 球根要求包紮作業

4. 植物搬運進場	契約內規定之植物	裝卸用貨車	1. 運輸保護措施 2. 裝卸保護措施
5. 植物種植	契約內規定之植物	裝卸用貨車	1. 種植的位置，尺寸，深度及密度需符合契約圖說規定。 2. 補植的時機與數量需符合契約圖說規定。
6. 養護與補植	肥料 防病蟲害之藥品 補植材料	灑水設備 割草機 農藥機具	1. 澆水養護並施追肥 2. 病蟲害防治 3. 清除雜草 4. 修剪 5. 支架須保持穩固

表 3-18、植栽新植工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 樹種須確認並檢視出廠報告 2. 土壤肥料等材料要求須符合圖說規範 3. 固定材料及水源須符合圖說
2. 現地整理	肥料，鐵件	挖土機	1. 排水坡度整理須符合圖說 2. 現地依圖說規範整平壓實
3. 植物搬運進場	契約內規定之植物	裝卸用貨車	1. 運輸保護措施 2. 裝卸保護措施
4. 植物種植	契約內規定之植物	裝卸用貨車	1. 種植的位置，尺寸，深度及密度需符合契約圖說規定。 2. 補植的時機與數量需符合契約圖說規定。
5. 養護與補植	肥料 防病蟲害之藥品 補植材料	灑水設備 割草機 農藥機具	1. 澆水養護並施追肥 2. 病蟲害防治 3. 清除雜草 4. 修剪

表 3-19、草皮鋪植工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備			1. 樹種須確認並檢視出廠報告 2. 土壤肥料等材料要求須符合圖說規範 3. 固定材料及水源須符合圖說
2. 現地整理	肥料，鐵件	挖土機	1. 排水坡度整理須符合圖說 2. 現地依圖說規範整平壓實
3. 草皮搬運進場	契約內規定之草皮	裝卸用貨車	1. 運輸保護措施 2. 裝卸保護措施
4. 草皮種植	契約內規定之草皮	裝卸用貨車	1. 種植的位置，尺寸，深度及密度需符合契約圖說規定。 2. 補植的時機與數量需符合契約圖說規定。
5. 養護與補植	肥料 防病蟲害之藥品 補植材料	灑水設備 割草機 農藥機具	1. 澆水養護並施追肥 2. 病蟲害防治 3. 清除雜草

表 3-20、照明工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	燈具設備 管材		1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 材料設備確認無受損
2. 放樣		噴漆	1. 依圖說規定確認各燈具位置
3. 開挖		挖土機	1. 確認開挖深度符合規範 2. 溝底不得有大土塊、石塊或浮土
4. 基座施作	基栓	搬運車	1. 確認施作完成高程
4. 配管	PVC 電管材		1. 管道連線前要進行外觀檢查，發現有破損、裂痕、明顯變形、顏色不統一等異常現象的管道必須立即更換，並加以標記另行保管。 2. 各管連線塗膠之前管口內外管壁均應十分清潔、乾燥，連線管件亦同 3. 完成配管後埋設警示帶
5. 管溝回填		挖土機	1. 回填高度符合圖說規範 2. 如溝槽的土質較差，如：岩石結構或礫石較多等，需外運沙或細土回填
6. 燈具安裝	燈具設備		1. 安裝完成後確認穩固 2. 通電測試，是否有燈具故障未亮

表 3-21、配(分)電箱工程施工要領

施工步驟	使用材料	機具設備	注意事項
施工前準備			1. 施工前檢核圖面及討論。 2. 電機設計圖說對於影響電機安裝的全部結構細節僅為一般說明，細節部分應配合建築、結構及機械設計圖說，承包商應協調各項工作進行預埋及施工。
送審材料			1. 燈具照明設備、電纜電線設備、開關箱設備、電氣管線設備、PVC 管設備、管線另料。 2. 檢附出廠證明及保證書且審閱合格。
	接地設備 線盒 接線料 固定架	電器工具 電動版手 接電用具	1. 接地線及電氣設備非帶電金屬部份，均應具有電氣安全之連續性及有效之接地裝置。 2. 金屬導線管、供電設備及中性導線之接地線，應依照設計圖或特訂條款之規定完成之。 3. 出線盒之定位應使各邊與牆壁，門框，地板平行，每一出線盒應有盒蓋。
變壓裝置		電器工具 電動版手 接電用具	1. 電機設備裝置如變壓器、發電機及電動機應設適當防振功能之防振裝置。 2. 拉線盒、匯流排、電纜架及其他項目之安裝，凡需要檢查、拆除或換裝者，應設在建築完工後可及且方便之場所。
系統與設備 測試		電氣測試組	1. 照明設備及管路工程、電氣設備及管路工程 2. 使用之電氣測試組應合於中央標準規範，測試紀錄應依合約規定存查

表 3-22、噴灌工程施工作業施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	噴灌設備 管材		1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 材料設備確認無受損
2. 放樣		噴漆	1. 依圖說規定確認各點位位置
3. 開挖		挖土機	1. 確認開挖深度符合規範 2. 溝底不得有大土塊、石塊或浮土
4. 配管	PVC 水管材		1. 管道連線前要進行外觀檢查，發現有破損、裂痕、明顯變形等異常現象必須立即更換。 2. 完成配管後埋設警示帶
5. 管溝回填		挖土機	1. 回填高度符合圖說規範 2. 如溝槽的土質較差，如：岩石結構或礫石較多等，需外運沙或細土回填
6. 噴頭安裝	噴灌設備		1. 數量及位置是否正確 2. 完成後噴水測試，是否有達設計半徑、功能性是否正常

表 3-23、兒童遊戲場工程施工要領

施工步驟	使用材料	施工機具	注意事項
1. 施工前準備	兒童遊戲場 遊具		1. 依據設計圖，施工說明核算數量 2. 材料設備確認無受損
2. 基礎面確認	水平儀 水準儀	噴漆	1. 依圖說規定確認點位位置 2. 基礎面養護日數足夠無積水問題
3. 面材施作 其他設備安裝		吊卡車	1. 固定方法、收邊細節確認後方可吊運進工區 2. 3. 管道連線後要進行外觀檢查，發現有破損、裂痕、明顯變形、異常現象的管道必須立即更換
4. 安裝完成			1. 完成面完整、穩固

肆、品質管理標準

一、品質管理標準訂定

為使參與施工之人員、分包商、供應商及製造商等，對各項工作之工程標準都有共通之認知；日後將配合各工項施工前提出分項施工計畫，品質管理標準將併入分項施工計畫內；需提出品質管理標準之工項如下所列。

項次	品質管理標準	附註
1	放樣工程品質管理標準	表 4-1
2	鋼筋(銲接鋼線網)工程品質管理標準	表 4-2
3	模板工程品質管理標準	表 4-3
4	混凝土工程品質管理標準	表 4-4
5	鋪面標線工程品質管理標準	表 4-5
6	排水管溝工程品質管理標準	表 4-6
7	木作工程品質管理標準	表 4-7
8	金屬物件工程品質管理標準	表 4-8
9	鋼構工程品質管理標準	表 4-9
10	抵石子工程品質管理標準	表 4-10
11	水泥磨石子工程品質管理標準	表 4-11
12	混凝土面層工程品質管理標準	表 4-12
13	高壓混凝土緣石工程品質管理標準	表 4-13
14	透水性鋪面工程品質管理標準	表 4-14
15	無縫地墊工程品質管理標準	表 4-15
16	人工草皮工程品質管理標準	表 4-16
17	植栽移植工程品質管理標準	表 4-17
18	植栽新植工程品質管理標準	表 4-18
19	草皮鋪植工程品質管理標準	表 4-19
20	照明工程品質管理標準	表 4-20
21	配(分)電箱工程品質管理標準	表 4-21
22	澆灌工程品質管理標準	表 4-22
23	兒童遊戲場工程品質管理標準	表 4-23

表 4-1、放樣工程品質管理標準

施工流程		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法		
施工前	核對圖說 現場核對	輔助引點設置	成果圖為準永久性 及安全性為目標地	鑑界完成後	目視	全面 (每個測量 作業前)	重測重做	放樣工程自主檢 查表	
		儀器校正	依校正方法動作	測量前	目視	檢查	送修	放樣工程自主檢 查表	
施工中	現場測量放樣	放樣控制點	放樣控制點是否現 地標定	*※測量中	目視	隨時	重新放樣	放樣工程自主檢 查表	
		放樣位置	放樣位置是否正確 或經現場指示	*※測量中	目視 丈量 水準測量	隨時	重新放樣	放樣工程自主檢 查表	
		高程	高程點放樣是否考 量基地排水或經現 場指示	*※測量中	目視 水準測量	隨時	重新放樣	放樣工程自主檢 查表	
施工後	放樣後核對	衝突點	放樣後是否考量現 地衝突點向監造單 位提出疑問	測量後	目視	隨時	重新放樣	放樣工程自主檢 查表	
	檢驗尺寸	檢驗成果	完成之結構檢驗位 置、尺寸、高程	*※測量後	目視 丈量	隨時	在修整或嚴重 者拆除重做	放樣工程自主檢 查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-2、鋼筋(銲接鋼線網)工程品質管理標準

施 工 流 程		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法		
施工前	材料進場	進場型號	鋼筋：D10、D13、D16 銲接鋼線網	堆置期間	目視	每批	退貨運離	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	
		進場堆置	進場材料必須墊高至少 10cm 以上，防止鋼筋污染及銹蝕	堆置期間	目視	每批	改善堆置場所	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	
施工中	鋼筋組立	鋼筋直徑、支數、間距、位置	(依契約圖說量化填入) 依施工圖	*※組立中	目視及尺量	每施工單元	調整修正	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	
		綁紮或銲接固定	1. 間距 < 20cm 可間隔綁紮 2. 間距 ≥ 20cm 應逐步綁紮 3. 銲接長度至少 10cm	*※組立中	尺量	每施工單元	增加綁紮；補銲接	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	
			(依契約圖說量化填入) 40D 或依施工圖，相鄰兩根鋼筋搭接位置至少應錯開直徑之 25 倍 銲接鋼線網至少一網目且 ≥ 20cm	*※組立中	尺量	每施工單元	調整修正	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	
		保護層厚度	不接觸土壤 5cm±0.5cm 接觸土壤 7.5cm±0.5cm	*※組立中	尺量	每施工單元	調整修正	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	
施工後	整體性	是否穩固	應穩固俾混凝土澆置時不致鬆動	組立後	目視	每施工單元	調整修正	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	
		混凝土墊塊	混凝土墊塊間距： D10 鋼筋，墊塊間距 ≤ 60 cm D13 鋼筋，墊塊間距 ≤ 80 cm D16(以上)鋼筋，墊塊間距 ≤ 1m。	*※組立後	尺量	每施工單元	調整修正	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	
		保護層厚度	不接觸土壤 5cm±0.5cm 接觸土壤 7.5cm±0.5cm	*※組立後	尺量	每施工單元	調整修正	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	

表 4-3、模板工程施工品質管理標準

施工流程		管理項目	管 理 要 點						備註
			檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	
施工前	模板進場	模板材料	進場材料必須墊高至少10cm以上，防止污染	*※堆置期間	目視、尺量	每批	改正	模板工程自主檢查表	
		脫模劑	脫模劑或塗料，應係不污染混凝土面或使其變色	施工中	目視	每次	改正	模板工程自主檢查表	
施工中	放樣	放樣及高程控制	設置樣板、水線	組立前	水準儀、經緯儀	每次組模時	立即改善	模板工程自主檢查表	
	模板組立	保護層厚度	保護層厚度及許可差： 50mm±6mm； 75mm±12.5mm	*※組立中	尺量	每次組模時	立即改善	模板工程自主檢查表	
		水平繫材	依施工圖位置設置 是否設置穩固	*※施工中	目視	每次	改正	模板工程自主檢查表	
		開口位置及預埋構件	依設計圖設置（依契約圖說檢查前量化填入）	*※組立中	目視、尺量	每次	改正	模板工程自主檢查表	
		伸縮縫設置	間隔 m，垂直縫寬度≤ cm，以適量填縫劑填縫	*※組立中	尺量	每次	改正	模板工程自主檢查表	
施工後		板組立完成之長、寬、高	依施工圖（依契約圖說檢查前量化填入） 長： 、寬： 、高：	*※組立後	尺量	每次	改正	模板工程自主檢查表	
		是否牢固	水平及垂直接縫應支撐牢固並保持平直，且應緊密接合	組立後	目視	每次	改正	模板工程自主檢查表	
		清潔孔、模板內清潔狀況	模板內清潔無雜物	組立後	目視	每次	改正	模板工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-4、混凝土工程品質管理標準表

施工流程		管理項目	管 理 要 點					管理紀錄	備註
			檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法		
施工前	混凝土澆置前檢查	鋼筋、模板組立檢查	鋼筋、模板組立經檢查合格，澆置位置清潔無雜物	澆置前	目視	每次澆置	檢查符合再施工	混凝土工程自主檢查表	
		澆置範圍、數量及順序	應依施工計畫規劃之範圍、數量及順序	澆置前	目視	每次澆置	檢查符合再施工	混凝土工程自主檢查表	
施工中	預拌混凝土運輸	拌和至到場洩料時間控制	輸送途中保持攪動者 ≤ 60 分鐘、途中未加攪動者 ≤ 30 分鐘，澆置完成 ≤ 90 分鐘	*※卸料時	出貨單	每車	退料	混凝土工程自主檢查表	
		混凝土強度	210 kgf/cm ²	*※澆置前	出貨單	每車	退料	混凝土工程自主檢查表	
	混凝土澆置	溫度	不得低於13℃，亦不得高於32℃	*※卸料時	溫度計	每日澆置前	退料	混凝土工程自主檢查表	
		坍度	依配比設計， 設計坍度 < 50 mm之許可差為 ± 15 mm 設計坍度50~100mm之許可差為 ± 25 mm 設計坍度大於100mm之許可差為 ± 40 mm	*※卸料時	尺量	每日澆置前	重作、退料	混凝土工程自主檢查表	
		氯離子含量	NaCl離子換算 ≤ 0.15 kg/m ³	*※卸料時	儀器檢測	每日澆置前	退料	混凝土工程自主檢查表	
		試體取樣	取樣製作混凝土圓柱試體，每組取樣至少製作5個試體	*※卸料時	圓柱試體製作	A. 各種配比混凝土，每100m ³ 至少取樣1組。 未滿100m ³ 以100m ³ 計之。	重作	混凝土工程自主檢查表	

施工流程	管理項目	管 理 要 點					管理紀錄	備註
		檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法		
	混凝土澆置 落下高度	1. 管口至澆置面應 $\leq 0.5\text{m}$ 2. 混凝土表面不得產生析離現象，或有過多水分或砂漿出現，	澆置時	目視	每次	調整改正	混凝土工程自主檢查表	
	澆置間隔時間	澆置間隔時間應 $\leq 20\text{min}$	澆置時	計時器	每次	加強時間控制	施工自主檢查表	
	振動棒	澆置15分鐘內振動，垂直插入前層深度10 cm，間隔45cm，時間5~10秒	澆置時	目視	每次	修正	施工自主檢查表	
施工後	養護	混凝土表面濕潤狀況	每日灑水或以不織布濕潤覆蓋至少7日	初期養生	目視	每日	改善修正	施工自主檢查表
		拆模及表面檢查	平順無蜂巢、無冷縫、無表面龜裂等現象之狀況	依契約規定	目視	拆模時	修正	施工自主檢查表

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-5、鋪面標線工程品質管理標準

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	路線漆	漆面材料	應為未開封之合格廠牌產品	施工前	目視	各種一次	等待查驗後施作	鋪面標線工程自主檢查表	
	熱處理聚酯標線	顏色	與送審資料相符	施工前	目視	各種一次	等待查驗後施作	鋪面標線工程自主檢查表	
施工中	標線樣式	放樣位置	與送審資料相符	*※施工中	目視	各種一次	修正改善	鋪面標線工程自主檢查表	
		寬度	__cm(±6mm)	*※施工中	目視、尺量	各種一次	重新施作或改善	鋪面標線工程自主檢查表	
	標線區	地坪	表面未受汙染且乾淨	*※施工中	目視	各種一次	修正改善	鋪面標線工程自主檢查表	
	塗佈標線	塗料	黏層劑均勻塗於路面上	*※施工中	目視	各種一次	修正改善	鋪面標線工程自主檢查表	
		塗料厚度	__mm(±5%)	*※施工中	目視、尺量	各種一次	重新施作或改善	鋪面標線工程自主檢查表	
施工後	完成面	表面	顏色均勻，且無皺紋、起泡、裂痕、剝離等現象	施工後	目視	各種一次	重新清潔	鋪面標線工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-6、排水管溝工程施工品質管理標準

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	放樣	配管位置	配管位置經監造單位確認	施工前	目視、尺量	每區一次	重新放樣確認	排水管溝工程 自主檢查表	
	進料	材料堆放位置	避免陽光直曬或易破損之位置	施工前	目視、尺量	每區一次	調整材料放置方式	排水管溝工程 自主檢查表	
	材料	高密度聚乙烯管	尺寸： D=160mm D=200mm D=300mm D=600mm	施工前	目視、尺量	每批料進場一次	退料不得進場	排水管溝工程 自主檢查表	
		鋼筋混凝土管 B 型，三級	D=600mm D=800mm D=1000mm D=1200mm D=1500mm	施工前	目視、尺量	每批料進場一次	退料不得進場	排水管溝工程 自主檢查表	
		軟式盲溝透水管	2" 2.5" 3" 4"	施工前	目視、尺量	每批料進場一次	退料不得進場	排水管溝工程 自主檢查表	
	管線埋設	排水管溝	內徑 W=20-25cm	*※施工中	目視、尺量	每區一次	重新挖管溝至正確深度	排水管溝工程 自主檢查表	

		埋設物	警示帶	*※施工中	目視、尺 量	每區一次	重新放置警示 帶	排水管溝工程 自主檢查表	
		管完整性	無破損	*※施工中	目視、尺 量	每區一次	更換破損管材	排水管溝工程 自主檢查表	
		管內清潔	管內清潔無雜物	*※施工中	目視、尺 量	每區一次	清潔	排水管溝工程 自主檢查表	
		經過車道之管路	加裝套管保護	*施工中	目視、尺 量	每區一次	加裝套管	排水管溝工程 自主檢查表	
		銜接牢固	牢固無鬆動	*※施工 中	目視、尺 量	每區一次	加強固定	排水管溝工程 自主檢查表	
	設備安裝	安裝	牢固	*※施工 中	目視、尺 量	每區一次	加強固定	排水管溝工程 自主檢查表	
施工 後	完工	試水	無漏水之情形發生	*※完工 後	檢測	全部一次	尋找漏水點並 改善後重新測 試	排水管溝工程 自主檢查表	
		暗溝	洩水孔確實安裝 順接既有水溝、排水順利無積 水 熱浸鍍鋅蓋板排列筆直	*※完工 後	檢測	全部一次	尋找積水點並 改善後重新測 試	排水管溝工程 自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-7、木作工程施工品質管理標準

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	鋼結構	鋼結構	已完成補漆及查驗	施工前	目視	各種一次	等待查驗後施作	木作工程自主檢查表	
施工中	木作結構	木料材質	鐵木、金潭木、南方松、再生複合材、再生複合材-內含金屬管	*※施工中	目視	各種一次	換料	木作工程自主檢查表	
		木料尺寸	__*__*__cm(±5%)	*※施工中	目視、尺量	各種一次	重新施作或改善	木作工程自主檢查表	
		木料間隙	__mm(±5%)	*※施工中	目視、尺量	各種一次	重新施作或改善	木作工程自主檢查表	
	木材固定	固定	穩固	*※施工中	目視、手搖	各種一次	加強固定	木作工程自主檢查表	
	塗佈護木塗料	塗料	與送審資料相符	*※施工中	目視	各種一次	換料	木作工程自主檢查表	
		塗佈量	≥10m ² /每公升	*※施工中	目視	各種一次	重新施作或改善	木作工程自主檢查表	
		乾燥時間	4-5 小時	*※施工中	目視	各種一次	在等待	木作工程自主檢查表	
		塗佈次數	3 次	*※施工中	目視	各種一次	再次塗佈	木作工程自主檢查表	
		完成面	表面塗佈均勻	*※施工中	目視	各種一次	改善	木作工程自主檢查表	
	完成面	木料邊緣	導角 R=1cm	施工後	目視、尺量	各種一次	改善	木作工程自主檢查表	
		木料完成面	無變形無裂痕	施工後	目視	各種一次	更換變形木料	木作工程自主檢查表	
		表面	無砂漿殘留及其他雜物	施工後	目視	各種一次	重新清潔	木作工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-8、金屬物件工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	基礎	基礎面	清潔無積水問題	施工前	目視	各種一次	改善	金屬物件工程 自主檢查表	
	金屬結構	金屬材質	結構用鋼料、不鏽鋼料、鋁合金、鋁料	施工中	目視、尺量	各種一次	換料重新施作	金屬物件工程 自主檢查表	
		物件尺寸	__*__*__cm(±5%)	*※施工中	目視、尺量	各種一次	換料重新施作	金屬物件工程 自主檢查表	
		鎖固方式	與施工圖相符	*※施工中	目視、尺量	各種一次	換料重新施作	金屬物件工程 自主檢查表	
		接合處處理	磨平及拋光	*※施工中	目視	各種一次	重新打磨	金屬物件工程 自主檢查表	
	表面	烤漆	顏色同送審核定顏色	*施工中	目視、測試	各種一次	重新上漆	金屬物件工程 自主檢查表	
施工後	完成面	固定	穩固	*※施工中	目視、手搖	各種一次	加強固定	金屬物件工程 自主檢查表	
		完成面	無變形、掉漆	*※施工後	目視	各種一次	更換變形鐵件、補漆	金屬物件工程 自主檢查表	
		表面	無砂漿殘留及其他雜物	施工後	目視	各種一次	重新清潔	金屬物件工程 自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-9、鋼構工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	基礎	基礎面	清潔無積水問題	施工前	目視	各種一次	改善	鋼構工程自主檢查表	
	金屬結構	金屬材質	結構用鋼料、不鏽鋼料、鋁合金、鋁料	施工中	目視、尺量	各種一次	換料重新施作	鋼構工程自主檢查表	
		結構尺寸	__*_*__cm(±5%)	*※施工中	目視、尺量	各種一次	換料重新施作	鋼構工程自主檢查表	
		結構間距	__cm(±5%)	*※施工中	目視、尺量	各種一次	換料重新施作	鋼構工程自主檢查表	
		鎖固方式	與送審施工圖相符	*※施工中	目視、尺量	各種一次	換料重新施作	鋼構工程自主檢查表	
		接合處處理	磨平及拋光	*※施工中	目視	各種一次	重新打磨	鋼構工程自主檢查表	
	表面	烤漆	顏色同核定顏色	*※施工中	目視、測試	各種一次	重新上漆	鋼構工程自主檢查表	
施工後	完成面	固定	穩固	*※施工中	目視、手搖	各種一次	加強固定	鋼構工程自主檢查表	
		完成面	無變形、掉漆	*※施工後	目視	各種一次	更換變形鐵件、補漆	鋼構工程自主檢查表	
		表面	無砂漿殘留及其他雜物	施工後	目視	各種一次	重新清潔	鋼構工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-10、抵石子工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	施工原料	樣品	同送審石材	材料進場時	目視	每批進貨時	運出工地不准使用	抵石子工程自主檢查表	
		表面濕潤	濕潤表面無明水	不定時	目視	每次	加強濕潤	抵石子工程自主檢查表	
施工中		施工面打毛	是否將現有面層清理打毛處理	*※施工中	目視	每次	重新施作	抵石子工程自主檢查表	
		水泥砂漿配比	1. 底層採用水泥:砂=1:3與適量之水拌和（均以容積比計算）。 2. 除契約另有規定外，面層採用水泥:碎石:礦物填縫料=1:1.5:0.25，於乾拌均勻後，再與適量之水拌和。	*※施工中	目視	每次	重新施作	抵石子工程自主檢查表	
		水泥及小石料	面層水泥及小石粒料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合物。	*※施工中	目視	每次	重新施作	抵石子工程自主檢查表	
		水泥粒料砂漿粉刷	厚度0.6~1.0 cm，塹平許可差5 mm，無鏟刀痕跡。	*※施工中	目視	每次	重新施作	抵石子工程自主檢查表	
		抵洗表面	由高至低海綿抵洗均勻，小石粒面均勻露出。	*※施工中	目視	每次	重新施作	抵石子工程自主檢查表	
施工後	完成面	石材清晰度	石材面無殘留砂漿並清理乾淨	施工後	目視	每區段	改善	抵石子工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-11、水泥磨石子工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施 工 前	施工原料	樣品	同送審石材	材料進場時	目視	每批進貨時	運出工地不准使用	水泥磨石子工程自主檢查表	
		表面濕潤	濕潤表面無明水	不定時	目視	每次	加強濕潤	水泥磨石子工程自主檢查表	
施 工 中		施工面打毛	是否將現有面層清理打毛處理	*※施工中	目視	每次	重新施作	水 泥 磨 石 子 工 程 自 主 檢 查 表	
		水泥砂漿配比	1. 底層採用水泥：砂=1：3與適量之水拌和（均以容積比計算）。 2. 除契約另有規定外，面層採用 100kg 石粒及 50kg 水泥之混合比例礮，先乾拌後加適量之清水拌和。	*※施工中	目視	每次	重新施作	水 泥 磨 石 子 工 程 自 主 檢 查 表	
		水泥及小石料	面層水泥及小石粒料內禁止摻雜海菜或其他化學膠合物。	*※施工中	目視	每次	重新施作	水 泥 磨 石 子 工 程 自 主 檢 查 表	
		露石率	面層漏石率須在50%以上。	*※施工中	目視	每次	重新施作	水 泥 磨 石 子 工 程 自 主 檢 查 表	
		打磨	除另有規定外均須用機器加水打磨，惟邊緣及凹角等確 不能為機器之磨片所能達到之處，得以人工用磨磚打磨。	*※施工中	目視	每次	重新施作	水 泥 磨 石 子 工 程 自 主 檢 查 表	
施 工 後	完成面	石材清晰度	石材面無殘留砂漿並清理乾淨	施工後	目視	每區段	改善	水 泥 磨 石 子 工 程 自 主 檢 查 表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-12、混凝土面層工程施工品質管理標準表

工程項目	管 理 要 點						管理紀錄	備註
	管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	地面平整度	平整無沉陷	每次整地	目視	每次進場時	重新整地	混凝土面層工程 自主檢查表	
施工中	鋪面拉毛	拉毛間距<1cm	*※施工中	量器	每次	調整修正	混凝土面層工程 自主檢查表	
	機械拉毛		*※施工中	量器	每次	調整修正	混凝土面層工程 自主檢查表	
	機械掃毛	掃毛間距<1cm	*※施工中	量器	每次	調整修正	混凝土面層工程 自主檢查表	
	粉光	平整	*※施工中	量器	每次	調整修正	混凝土面層工程 自主檢查表	
	伸縮縫	伸縮縫間距： <u>5.0m~10.0M</u> 寬度 1.0cm±0.3cm	*※施工中	尺量	每次	調整修正	混凝土面層工程 自主檢查表	
施工後	混凝土養護	澆置後七日內表面須灑水保持 濕潤狀態	*※混凝土澆 置完成	目視	每次	調整修正	混凝土面層工程 自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-13、高壓混凝土緣石工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	測量與放樣	施工範圍	1. 是否與設計圖相符 2. 排水方向及坡度按設計圖規劃	*※施工前	縱、橫斷面水準測量	全面	與監造單位檢討改善方式	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	
	材料選擇	緣石	依照設計圖說	施工前	目視	每批	退貨重新送驗	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	
施工中	整地壓實	路基整理	清除雜草及廢棄物	施工中	目視	每區	要求改正	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	
		整地高程	開挖至設計高程並壓實	施工中	水準測量	每區	要求改正	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	
	模板工作	請參考模板工程部份	依設計圖說要求	施工中	請參考模板工程部份	請參考模板工程部份	請參考模板工程部份	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	
	混凝土工作	請參考混凝土工程部份	依設計圖說要求	施工中	請參考混凝土工程部份	請參考混凝土工程部份	請參考混凝土工程部份	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	
	緣石鋪排	鋪排高程	*※	*※施工中	目視	每區	要求改正	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	
		鋪排型式	依設計圖說要求	*※施工中	目視	每區	要求改正	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	
		緣石表面	緣石面不可沾到混凝土	*※施工中	目視	每區	要求改正	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	
	環境整理	鋪面清潔	緣石表面清潔與四周環境整理	施工後	目視	每區	要求改正	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-14、透水性鋪面工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	材料進場	進場堆置	墊高至少 10cm	*※進場後	尺量	每批	修正改善	透水性鋪面工程 自主檢查表	
		宜蘭石	TH=3cm	進場後	目視	每批	換料	透水性鋪面工程 自主檢查表	
		清碎石	3 分	進場後	目視	1 次/批	換料	透水性鋪面工程 自主檢查表	
施工中	預鑄型單元磚	每段長度	1 至 1.5m	*施工中	目視	每施工單元	換料	透水性鋪面工程 自主檢查表	
		位置	1：3 水泥砂漿鋪置於已壓實之路基上	*※組立後	目視 量尺	每施工單元	調整修正	透水性鋪面工程 自主檢查表	
		混凝土抗壓強度	CNS 1232	*※組立後	目視 量尺	每施工單元	調整修正	透水性鋪面工程 自主檢查表	
		空隙	不得超過 1cm	*※組立後	量尺	每處	調整修正	透水性鋪面工程 自主檢查表	
		高程	面與頂之線型與高程應正確。	*※組立後	目視 量尺	每施工單元	調整修正	透水性鋪面工程 自主檢查表	
施工後	檢視	整理	清潔	施工後	目視	隨時	立刻清理	透水性鋪面工程 自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-15、無縫地墊工程施工品質管理標準表

工程項目	管 理 要 點						管理紀錄	備註
	管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	證明文件	出廠證明及材質證明書	每次	目視	每批	退貨	無縫地墊工程 自主檢查表	
	進場堆置	墊高至少10cm以上，防止污染	*※堆置期間	目視	每批	改善堆置場所	無縫地墊工程 自主檢查表	
施工中	*測量放樣及組裝	(依契約圖說量化填入) 依施工圖，以墨斗標示施工範圍	*※施工中	以尺丈量	每施工單元	調整修正	無縫地墊工程 自主檢查表	
	*材料規格	☐ SBR(含膠)1cm ☐ EPDM(表層)1cm	*※施工中	目視	每處	調整修正	無縫地墊工程 自主檢查表	
	*材料規格	☐ SBR+XPE，5cm 以下 ☐ SBR+XPE，5cm-10cm	*※施工中	以尺丈量	每處	退貨	無縫地墊工程 自主檢查表	
施工後	養生	12小時以上硬化養生	施工後	目視	每施工單元		無縫地墊工程 自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-16、人工草皮工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	整地	地面平整度	平整無沉陷	每次整地	目視	每次進場時	重新整地	人工草皮工程自主檢查表	
		材料進場堆置	進場材料必須墊高至少 10 cm 以上，防止污染及銹蝕	*※每次進場	目視	每次進場時	改善堆置場所	人工草皮工程自主檢查表	
施工中	鋼筋組立	鋼線網規格	D=5.00mm，10*10cm	*※組立前	目視、尺量	每施工單元	退料	人工草皮工程自主檢查表	
		綁紮或銲接固定	1. 間距 < 20cm 可間隔綁紮 2. 銲接長度至少 10cm	*※組立中	目視、尺量	每次	增加綁紮；補銲接	人工草皮工程自主檢查表	
		搭接長度	竹節銲接鋼線網 ≥ 20cm，至少一網目	*※組立中	目視、尺量	每次	調整修正	人工草皮工程自主檢查表	
		混凝土墊塊	混凝土墊塊間距： D13 銲接鋼線網，墊塊間距 ≤ 80 cm	*※組立中	目視、尺量	每次	調整修正	人工草皮工程自主檢查表	
	模板組立	放樣、高程	樣板、水線	*※組立中	目視	每次	調整修正	人工草皮工程自主檢查表	
		保護層厚度	保護層厚度及許可差： 75mm ± 12.5mm	*※組立中	目視、尺量	每次	調整修正	人工草皮工程自主檢查表	
	置混凝土澆	混凝土強度及澆置完成時間	210 kgf/cm ²	*※澆置前	出貨單	每次	退料	出貨單	
		澆置完成時間	澆置完成 ≤ 90 分鐘	*※澆置前	出貨單	每次	退料	人工草皮工程自主檢查表	
		溫度	不得低於 13℃，亦不得高於 32℃	*※澆置前	溫度計	每次	退料	人工草皮工程自主檢查表	

		坍度	設計坍度大於100mm之許可差為±40mm	*※澆置前	尺寸	A. 各種配比混凝土，每100m3至少取樣1組。未滿100m3以100m3計之。	重作、退料	人工草皮工程 自主檢查表	
		氯離子含量	NaCl離子換算≤0.15kg/m3	*※澆置前	儀器檢測	每次	退料	人工草皮工程 自主檢查表	
		試體取樣	取樣製作混凝土圓柱試體，每組取樣至少製作5個試體	★澆置前	圓柱試體製作	A. 各種配比混凝土，每100m3至少取樣1組。未滿100m3以100m3計之。	重作	人工草皮工程 自主檢查表	
	人工草皮鋪設	2~5mmSBR 橡膠 顆粒混合 PU 膠	☐ t=4.0cm ☐ t=12.0cm	*※施工中	尺寸	每次	調整修正	人工草皮工程 自主檢查表	
		草長	t=2.5cm	*※施工中	尺寸	每次	調整修正	人工草皮工程 自主檢查表	
施工後	鋪面平整度	平整	施工完成	目視	每次	調整修正	施工自主檢查表		

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-17、植栽移植工程施工品質管理標準表

施工流程		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法		
施工前	植栽	移植植栽確認	以放樣確認	施工前	目視	每區段	修正錯誤重新放樣確認	植栽移植工程自主檢查表	
施工中	斷根	斷根	已完成斷根	施工前	目視	每區段	重新斷根	植栽移植工程自主檢查表	
	種植	植穴	大於土球	*※種植時	目視、尺量	每區段	重新挖樹穴	植栽移植工程自主檢查表	
		施放基肥	肥料與客土充分拌勻	*※種植時	目視、尺量	每區段	增加肥料	植栽移植工程自主檢查表	
		種植位置	經放樣確認	*※施工中	目視	每區段	重新放樣確認	植栽移植工程自主檢查表	
		栽植方式	去除土球網繩	*※施工中	目視、尺量	每區段	改善	植栽移植工程自主檢查表	
	立支架	支架	木支架、繩索支架、鋼管支架	*※施工中	目視、尺量	每區段	重新架設支架	植栽移植工程自主檢查表	
施工後	完成面	完成土面	設置蓄水窪地	施工後	目視	每區段	重新施作	植栽移植工程自主檢查表	
	種植後	澆水	種植後馬上澆水	施工後	目視	每區段	改善馬上澆水	植栽移植工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-18、植栽新植工程施工品質管理標準表

施工流程		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法		
施工前	植栽	植栽種類、尺寸、土球完整度	依規定之規格及生長良好	訂購及交貨時	目視、尺量	每樹種取樣一株	退貨另行選購	植栽新植工程自主檢查表	
施工中	種植	植穴	大於土球	*※種植時	目視、尺量	每區段	重新挖樹穴	植栽新植工程自主檢查表	
		施放基肥	肥料與客土充分拌勻	*※種植時	目視、尺量	每區段	增加肥料	植栽新植工程自主檢查表	
		種植位置	經放樣確認	*※施工中	目視	每區段	重新放樣確認	植栽新植工程自主檢查表	
		栽植方式	喬木:去除土球網繩 灌木、草花:採三角種植法	*※施工中	目視、尺量	每區段	改善	植栽新植工程自主檢查表	
	立支架	繩索支架	木支架、繩索支架、鋼管支架	*※施工中	目視、尺量	每區段	重新架設支架	植栽新植工程自主檢查表	
施工後	完成面	完成土面	設置蓄水窪地、土球不裸露	施工後	目視	每區段	重新施作	植栽新植工程自主檢查表	
	種植後	澆水	種植後馬上澆水	施工後	目視	每區段	改善 馬上澆水	植栽新植工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-19、草皮鋪植工程施工品質管理標準表

施工流程		管 理 要 點						管理 紀錄	備註
		管理項目	檢查標準	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置 方法		
施工前	植生基材及 草皮	草皮	草毯完整	*※施工前	目視	每區段	退貨	草皮鋪植工程自主檢查表	
施工中	草皮施工	底土	掘鬆 20~30cm 並清除 ϕ 2cm 以上之雜物石塊、樹根雜草等	*※施工中	目視、尺量	每區段	改善	草皮鋪植工程自主檢查表	
		表土	10cm 既有土壤與有機肥充份混合	*※施工中	目視、尺量	每區段	增加客土	草皮鋪植工程自主檢查表	
		種植位置	經放樣確認	*※施工中	目視	每區段	重新放樣確認	草皮鋪植工程自主檢查表	
		草毯	滿鋪 無>2cm 間隙	*※施工中	目視、尺量	每區段	改善	草皮鋪植工程自主檢查表	
		固定	壓實	*※施工中	目視	每區段	改善	草皮鋪植工程自主檢查表	
		澆水	種植後馬上澆水	*※施工中	目視	每區段	改善 馬上澆水	草皮鋪植工程自主檢查表	
施工後	完成面	完成面	草皮生長完整無缺漏	施工後	目視	每區段	補草皮	草皮鋪植工程自主檢查表	
		補砂	鋪設後 2~3 個禮拜 全區草坪區補砂	施工後	目視	每區段	重新補砂	草皮鋪植工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-20、照明工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前		材料證明文件	出廠證明	施工前	目視	每次	改正、退料	照明工程自主檢查表	
		燈具種類	☐ 景觀高燈，(LED照明設備)H=3.5~5M ☐ LED軟條燈，(LED照明設備)	*※施工前	目視	每次	退料	照明工程自主檢查表	
施 工 中	管 線 基 礎 埋 設	管線基礎埋設	管線埋設深度 公尺	*※施工中	目視、尺量	每次	調整修正	照明工程自主檢查表	
		排水槽	混凝土基座頂面應設洩水槽。	施工中	目視	每次	調整修正	照明工程自主檢查表	
	照 明 燈 具 組 立	錨碇螺栓	管線埋設深度 公尺	*※施工中	目視、尺量	每次	調整修正	照明工程自主檢查表	
			導線管內應先完全清除乾淨。在每一空管槽內應留下一尼龍繩以備未來安放電線或電纜用，同時其出口應加帽或加栓塞，以防止雜物或水份進入						
			混凝土基座頂面應設洩水槽						
			預埋螺栓3/4” L=50cmm熱浸鍍鋅						
			裸露螺栓過長有危險之虞者，須加裝蓋頭螺帽或螺栓保護套						
	燈桿長度	☐ 景觀燈，3.5~5.0M	*※施工中	目視、尺量	每次	改正、退料	照明工程自主檢查表		
	照 明 燈 具 組 裝 施 工	固結部分是否牢固	*※燈具組立	目視、尺量	每次	調整修正	照明工程自主檢查表		
		接地設施標準							
漏電斷路器標準									
施工後		功能測試	用電安全、接地設施	*※施工後	儀器	每次	調整修正	照明工程自主檢查表	
		清理	照明表面清理 施工汙損清除	施工後	目視	每次	修正	照明工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-21、配(分)電箱工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	材料搬入	配電盤及組件之規格、尺寸、廠牌、品質、數量及貯存方法	核對訂貨單內容，材質符合樣品存放於妥當地方，以免受損	*※設備進場時	核對訂貨單，目視、以尺丈量	運入工地時逐項	標籤「檢測不合格禁止使用」並要求遠離工地	配(分)電箱工程自主檢查表	
施工中	配電盤的安裝	配電盤位置放樣	核對安裝位置、數量	*※不定期	以捲尺丈量	設備安裝前逐項	重新放樣	配(分)電箱工程自主檢查表	
		電纜(線)進出口開孔應有防護墊圈，以防電纜刮傷	目視進出口開孔應有防護墊圈	*※不定期	目視	設備安裝前逐項	調整、修正	配(分)電箱工程自主檢查表	
		配電盤安裝	核對施工圖及設計圖說	*※不定期	目視	設備安裝前逐項	調整、修正	配(分)電箱工程自主檢查表	
		核對盤內匯流排相序顏色是否正確	三相:紅白藍 N相:黑 單相:紅藍 N相:黑	*※不定期	目視	設備安裝前逐項	調整、修正	配(分)電箱工程自主檢查表	
施工後	配盤電檢測	匯流排、電纜、控制線等連接與相序核對，接地連接、絕緣電阻	核對施工圖及設計圖說	*※設備安裝後	三用電錶、高阻計、相序測量錶等及目視	設備安裝後逐項	更換	配(分)電箱工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-22、澆灌工程檢查管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施 工 前	放樣	配管位置	配管位置經監造單位確認	施工前	目視、尺量	每區一次	重新放樣確認	澆灌工程自主檢查表	
	進料	材料堆放位置	避免陽光直曬或易破損之位置	施工前	目視、尺量	每區一次	調整材料放置方式	澆灌工程自主檢查表	
	安衛查驗點	工地職業安全衛生	桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知第十五點。	施工前 1 次	目視	1 次/批	修正改善	澆灌工程自主檢查表	
施 工 中	管線埋設	管溝深度	管徑>3" : 管溝深度≥60cm 管徑 2~3" : 管溝深度≥40cm 管徑≤1 1/2" : 管溝深度≥30cm	*※施工中	目視、尺量	每區一次	重新挖管溝至正確深度	澆灌工程自主檢查表	
		埋設物	警示帶	*※施工中	目視、尺量	每區一次	重新放置警示帶	澆灌工程自主檢查表	
		管完整性	無破損	*※施工中	目視、尺量	每區一次	更換破損管材	澆灌工程自主檢查表	
		管內清潔	管內清潔無雜物	*※施工中	目視、尺量	每區一次	清潔	澆灌工程自主檢查表	
		經過車道之管路	加裝套管保護	*※施工中	目視、尺量	每區一次	加裝套管	澆灌工程自主檢查表	
		銜接牢固	牢固無鬆動	*※施工中	目視、尺量	每區一次	加強固定	澆灌工程自主檢查表	
	設備安裝	安裝	牢固	*※施工中	目視、尺量	每區一次	加強固定	澆灌工程自主檢查表	
施 工 後	完工	試水	無漏水之情形發生	*※完工後	檢測	全部一次	尋找漏水點並改善後重新測試	澆灌工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

表 4-23、兒童遊戲場工程施工品質管理標準表

工程項目		管 理 要 點						管理紀錄	備註
		管理項目	管理標準	檢查時間	檢查方法	檢查頻率	不合標準之處置方法		
施工前	送審	施工圖、烤漆顏色、材料	如核定之送審資料	施工前	目視	全部一次	重新送審	兒童遊戲場工程自主檢查表	
	基礎	基礎面	清潔無積水問題	施工前	目視	全部一次	改善	兒童遊戲場工程自主檢查表	
施工中	遊具尺寸	主結構尺寸	如核定之送審資料 ___*___*___cm(±5%)	*※施工中	目視、尺量	全部一次	更換材料、改善	兒童遊戲場工程自主檢查表	
		各部件尺寸	如核定之送審資料 ___*___*___cm(±5%)	*※施工中	目視、尺量	全部一次	更換材料、改善	兒童遊戲場工程自主檢查表	
		整體尺寸	如核定之送審資料 W=___cm(±5%) H=___cm(±5%) L=___cm(±5%)	*※施工中	目視、尺量	全部一次	更換材料、改善	兒童遊戲場工程自主檢查表	
施工後	完成	烤漆	完整無掉漆	*※施工後	目視	全部一次	補漆	兒童遊戲場工程自主檢查表	
		整體完成面	收邊無銳利角及未封口處銜接除平整無缺陷裂縫	*※施工後	目視	全部一次	改善	兒童遊戲場工程自主檢查表	
		固定	穩固	*※施工後	目視、手搖	各種一次	重新加強固定	兒童遊戲場工程自主檢查表	

*為檢驗停留點

※為自主檢查停留點

伍、材料與設備及施工檢驗程序

一、材料設備檢驗程序

(一)、材料與設備資格送審流程(詳圖 5-1)

品管人員依合約書、施工規範及設計圖說等文件之內容及需求，經與施工部門方面協商決議之後，將共同選定之施工或材料供應廠商之相關資料，如：協力廠商相關證明資料、材料規範、樣品、材料型錄、相關材料檢試驗報告等彙整之後，訂定「材料/設備送審管制總表」(詳表 6-1)，並檢討訂定送審日期及備料日期，據以管控。再依「材料設備送審管制表」所列各項材料送至業主或監造單位審查，經業主或監造單位核定認可之後，方能採用；若該次提送資料未經監造單位認可核定時，則需再次提送其他經施工單位及品管部門認定之施工或材料廠商資料予以業主或監造單位審查，在未經業主或監造單位正式核定之前，不得製造、進料或施工。

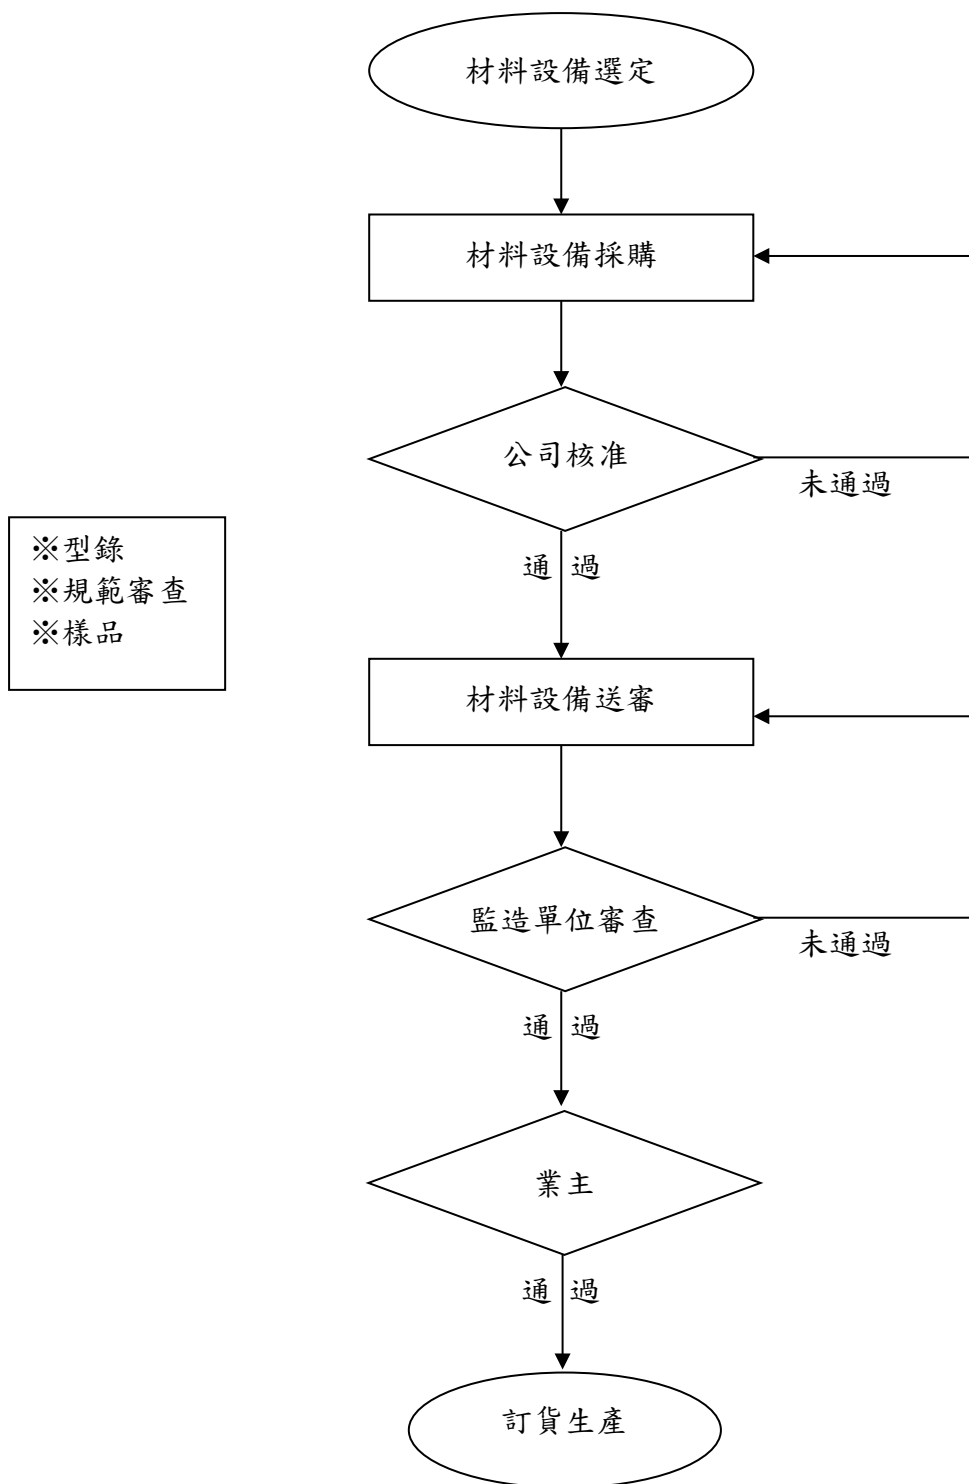


圖 5-1、材料/設備選定送審流程圖

表 5-1、材料設備送審管制總表

編號:TA-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹. 一. 17	25. 8M3	是		否	√		√		√ 1. 配比資料		
	結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm ²											
2	壹. 一. 21	2. 1T	是		否	√		√		√ 1. 無輻射證明 2. 出廠品質證明書		
	鋼筋，SD280，連工帶料											
3	壹. 一. 38	8. 5M2	否		否	√	√	√		√ 1. 選色		
	標線，熱處理聚酯，反光											
4	壹. 二. 12	6 顆										
	產品，預鑄混凝土，預鑄陰井，寬 90x 長 90x 深 90cm，含鍍鋅格柵板											
4-1	壹. 二. 12(1)	—	否		否	√	√					
	預鑄陰井，寬 90x 長 90x 深 90cm											
4-2	壹. 二. 12(2)	—	否		否	√	√	√				

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	鍍鋅格柵板											
5	壹. 二. 15	280M	否		否	√	√	√				
	產品，軟式盲溝透水管3"，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等											
6	壹. 二. 17	19 組	否		否	√	√	√				
	產品，滲透陰井30*30*35cm											
7	壹. 三. 52	129.5M	否		否	√	√					
	硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，含管配件，標稱50mm											
8	壹. 三. 55	56M	否		否	√	√					
	硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，含管配件，標稱100mm											
9	壹. 三. 61	161.9M	否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，含管配件，標稱25mm											
10	壹. 三. 72	600M	否		否	√	√					
	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E 管，含管配件，標稱 28mm											
11	壹. 三. 80	320M	否		否	√	√					
	產品，電線及電纜，600V 聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2. 0mm ²											
12	壹. 三. 81	140M	否		否	√	√					
	產品，電線及電纜，600V 聚氯乙烯絕緣電線，絞線，3. 5mm ²											
13	壹. 三. 82	600M	否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	產品，電線及電纜，600V 聚氯乙稀絕緣電線，絞線，5.5mm2											
14	壹. 三. 221	6 組	否		否	√	√	√				
	鍍鋅格柵板及框座											
15	壹. 三. 新增工項	320M	否		否	√	√					
	產品，導線管，聚氯乙稀披覆金屬軟管，含管配件，標稱 22mm											
16	壹. 四. 14	41. 7M	否		否	√	√	√				
	緣石，預鑄，25≤全高<30cm											
17	壹. 四. 18	906. 3M2	否		否	√	√			√ 1. 色彩計畫		
	透水性鋪面，無細粒料混凝土，宜蘭石 TH=3cm											
18	壹. 四. 19	1433M2	是		否	√	√		√			

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	透水性鋪面，無細粒料混凝土，3 分清碎石組成											
19	壹. 四. 27	2553M2	否		否	√	√	√				
	橡膠地磚，無縫，SBR(含膠)，1cm											
20	壹. 四. 34	278M2	否		否	√	√	√	√			
	兒童遊戲場設備，人工草皮，t=4. 0cm											
21	壹. 四. 80	28. 2M3	否		否				√			
	產品，宜蘭石											
22	壹. 四. 新增工項	70M										
	磨石子座椅											
22-1	壹. 四. 新增工項(1)	-	否		否	√	√		√	√ 1. 選樣		
	磨石子											
23	壹. 四. 新增工項	24M										
	座椅靠背											
23-1	壹. 四. 新增工項(2)	-	否		否	√	√	√	√			

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	產品，木材，再生複合材											
23-2	壹. 四. 新增工項(3)	—	否		否	√		√				
	不銹鋼料											
24	壹. 四. 新增工項	6M										
	入口意象牆											
24-1	壹. 四. 新增工項(4)	—	否		否	√	√		√	√ 1. 選樣		
	抵石子											
25	壹. 四. 新增工項	1 組	否		否	√		√		√ 1. 無輻射證明		
	入口意象牆不銹鋼板											
26	壹. 四. 新增工項	344M	否		否	√		√		√ 1. 無輻射證明		
	鍍鋅鋼板，鋼板收邊， W=5cm，T=4.5mm											
27	壹. 五. 1	136.7 C. M3	否		否	√		√	√	√ 1. 無紅火蟻		

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	產品，植栽，客土，砂質壤土，含無紅火蟻證明									證明		
28	壹. 五. 15. 0	5 株	否		是	√						
	喬木植栽，第三類 C 組，10cm≤米高直徑，360cm≤樹高，160cm≤樹寬											
29	壹. 五. 16. T	1152 株	否		否	√			√	√ 1. 標準苗株照		
	產品，沿階草，高度<20cm，寬度<10cm，容器直徑<10cm 盆苗											
30	壹. 五. 16. V	335 株	否		否	√			√	√ 1. 標準苗株照		
	產品，紫嬌花，20≤高度<30cm，20≤寬度<30cm											
31	壹. 五. 16. 52	455 株	否		否	√			√	√ 1. 標準苗株照		
	產品，馬纓丹，20≤高度<25cm，20≤寬度<25cm											
32	壹. 五. 16. 57	673M2	否		否	√			√	√ 1. 標準苗株		

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	植草，密鋪，不限草種									照		
33	壹. 五. 16. 58	133. 7M2	否		否	√						
	植草，撒播，不限草籽(花籽)，種籽(假儉草)											
34	壹. 六. 1	15 盞	否		否	√	√	√	√			
	LED 照明設備，景觀高燈，H:3. 5~5M											
35	壹. 六. 4	65M	否		否	√	√	√	√			
	LED 照明設備，LED 軟條燈											
36	壹. 六. 16	1 座	否		否	√	√	√				
	產品，分電箱，電源開關箱，不銹鋼板											
37	壹. 六. 19	3 個	否		否	√	√	√	√			
	變壓器防水開關器保護箱											
38	壹. 六. 新增工項	3 個	否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料（√）					審查日期	備註 （歸檔編號）
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	防水型電源供應器											
39	壹. 六. 新增工項	1 個	否		否	√	√					
	NFB 2P 50AF 50AT 10KA 220V											
40	壹. 六. 新增工項	3 組	否		否	√	√					
	漏電斷路器 ELCB 300MA											
41	壹. 七. 9	3 只	否		否	√	√					
	電機基本材料及施工方法，電磁開關											
42	壹. 七. 10	6 只	否		否	√	√		√			
	產品，景觀灌溉設備，防水接頭											
43	壹. 七. 16	2 只	否		否	√	√					
	產品，景觀灌溉設備，閘閥											
44	壹. 七. 26		否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	產品，景觀灌溉設備，噴灌專用馬達，3HP											
45	壹. 七. 29	1 個	否		否	√	√					
	產品，景觀灌溉設備，噴灌控制箱											
46	壹. 七. 35	6 組	否		否	√	√					
	產品，景觀灌溉設備，水閘箱											
47	壹. 七. 36	1 只	否		否	√	√					
	產品，電機基本材料及施工方法，24 小時定時器											
48	壹. 七. 39	6 只	否		否	√	√					
	產品，閘，快速給水閘，含給水閘插桿組，(插桿、活動彎頭及接頭等)											
49	壹. 七. 44	6 只	否		否	√	√					
	產品，閘，快速給水閘，QCV 銅製											
50	壹. 七. 53	1 組	否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	水泥混凝土構造物，蓄水設施，5T，含 2"浮球遙控閥及爬梯											
51	壹. 九. 38	158m2	否		否	√	√		√	√ 1. 色彩計畫		
	橡膠地磚，彩色無縫式橡膠地墊(EPDM 材質)th:10mm											
52	壹. 九. 45	1 座	否		否	√	√					
	雙人漫步機(豪華版)											
53	壹. 九. 49	1 組	否		否	√	√					
	雙人伸腰伸背器(簡易版)											
54	壹. 九. 59	1 座	否		否	√	√					
	雙人扭腰器(豪華版)											
55	壹. 九. 62	1 座	否		否	√	√					
	雙人大輪轉(豪華版)											
56	壹. 九. 64	1 座	否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	雙人坐蹬(豪華版)											
57	壹. 九. 新增工項	1 式										
	兒童遊戲場設備，土丘攀爬設施											
57-1	壹. 九. 新增工項(1)	—	是		否	√		√ 1. 木種 2. 含水量 3. 材等	√			
	原木											
57-2	壹. 九. 新增工項(2)	—	否		否	√	√			√ 1. 選樣		
	攀爬網											
58	壹. 九. 新增工項	30m2	否		否	√	√		√	√ 1. 選樣		
	兒童遊戲場設備，滑梯，水泥磨石子											
59	壹. 九. 新增工項	1 式										
	兒童遊戲場設備，攀爬牆											
59-1	壹. 九. 新增工項(3)	—	否		否	√	√			√ 1. 選樣		
	兒童遊戲場設備，攀爬塊											
59-2	壹. 九. 新增工項(4)	—	否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	兒童遊戲場設備，特多龍繩											
59-3	壹. 九. 新增工項(5)	—	否		否	√	√					
	兒童遊戲場設備，木板爬繩											
60	壹. 九. 新增工項	31. 6M	否		否	√	√		√	√ 1. 選樣		
	地景，磨石子扶手											
61	壹. 九. 新增工項	1 組	否		否	√	√					
	兒童遊戲場設備，鳥巢及一般鞦韆											
62	壹. 九. 新增工項	1 座	否		否	√	√					
	兒童遊戲場設備，遮陽風箏											
63	壹. 九. 新增工項	1 座	否		否	√	√					
	兒童遊戲場設備，遮陽風箏(大)											
64	壹. 九. 新增工項	1 座										
	光影鋼棚											
64-1	壹. 九. 新增工項(6)	—	否		否	√		√				

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	結構用鋼料											
64-2	壹. 九. 新增工項(7)		否		否	√	√			√ 1. 色卡		
	結構用鋼料，烤漆											
64-3	壹. 九. 新增工項(8)	—	否		否	√			√	√ 1. 選樣		
	PVC 板											
65	壹. 九. 新增工項	46M	否		否	√		√		√ 1. 無輻射證明		
	安全扶手欄杆											
66	壹. 九. 新增工項	6 座	否		否	√		√				
	鍍鋅鋼料，遊戲設施告示牌											
67	壹. 九. 新增工項	1 座	否		否	√		√				
	鍍鋅鋼料，遊戲場告示牌											

(二)、材料與設備檢試驗單位之核備程序

依據施工規範、設計圖說、施工說明書(或廠商型錄)和技術規則材料設備需委外試驗項目，應於材料進場前選擇符合 TAF 認證或符合契約規定之實驗室或學術單位之試驗室。

(三)、材料與設備於進場後之管理

1. 材料進場後，應依材料檢試驗辦理情形，即刻標示「未檢驗」、「檢驗中」或「檢驗合格」之標示牌，以使施工人員不致誤用「未檢驗」或「檢驗中」之材料。

(四)、材料與設備檢驗流程

1. 材料進場依據材料(設備)檢驗作業流程(如圖 6-2)，人員辦理自主檢查(表 6-2)，經自主檢查合格後，向監造單位申請辦理檢驗，檢驗合格後方可使用。
2. 於需要取樣試驗之材料，於材料進場後確認廠牌及規格無誤後，向監造單位申請會同現場取樣，並將取樣材料簽封後，送核准之實驗室試驗。
3. 待試驗結果合格後將試驗報告提送業主備查後始得開始使用該批材料。試驗報告若不合格，依第八章不合格管制規定辦理改善，並依規定辦理複驗；若複驗結果仍不合格，將該批材料通知供應商限期將該批材料運離工地，避免誤用並重新進料檢驗，並填寫材料退料紀錄單(表 5-3)。

(五)、對材料與設備檢驗、試驗結果之管制方法

1. 對材料設備檢驗合格，應填寫材料設備品質抽驗紀錄表(表 6-4)，將檢驗報告一份送業主或監造單位存查，一份建檔於工地備查，一份為完工時納入竣工報告。
2. 試驗檢查結果不合格之材料設備，由品管人員立即申請複驗程序，若再不合格者依第八章「不合格品之管制」程序辦理，若統計分析結果中發現異常或問題重覆發生時，應立即依「矯正與預防措施」程序辦理，以消除偏離管制之原因。在材料未經

試驗檢查合格前，不准使用並標示於材料上加以區分，以免誤用。

3. 現場人員應將材料、設備送檢試驗之資料完整彙集建檔、並將其結果紀錄於「材料設備檢（試）驗管制總表」（詳表 6-5），以便日後品管單位或施工單位之資料稽查作業。
4. 各項材料試驗結果，皆應紀錄於材料設備檢（試）驗管制總表（詳表 5-5）據以管制。

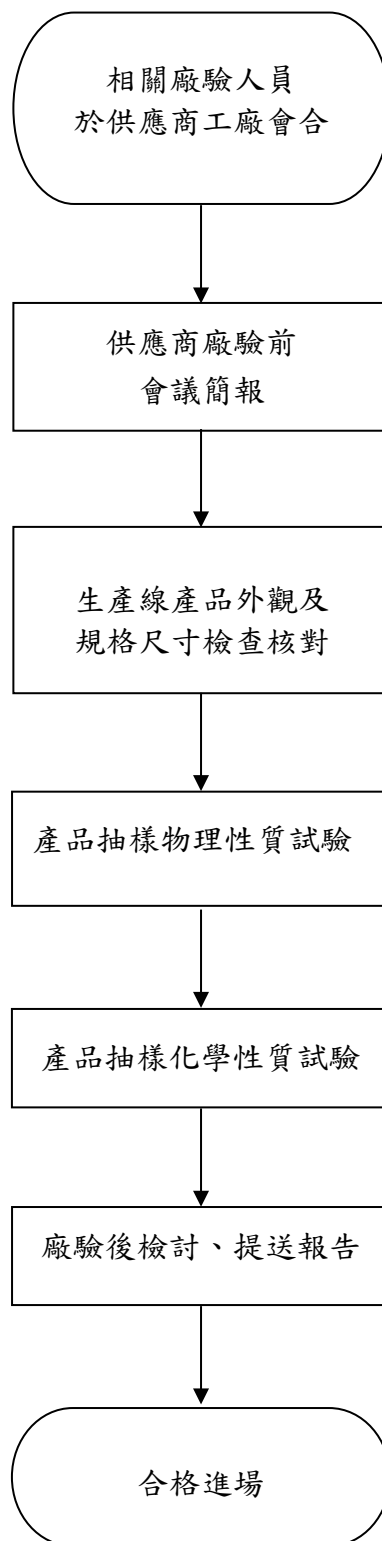


圖 5-2、材料設備廠驗流程圖

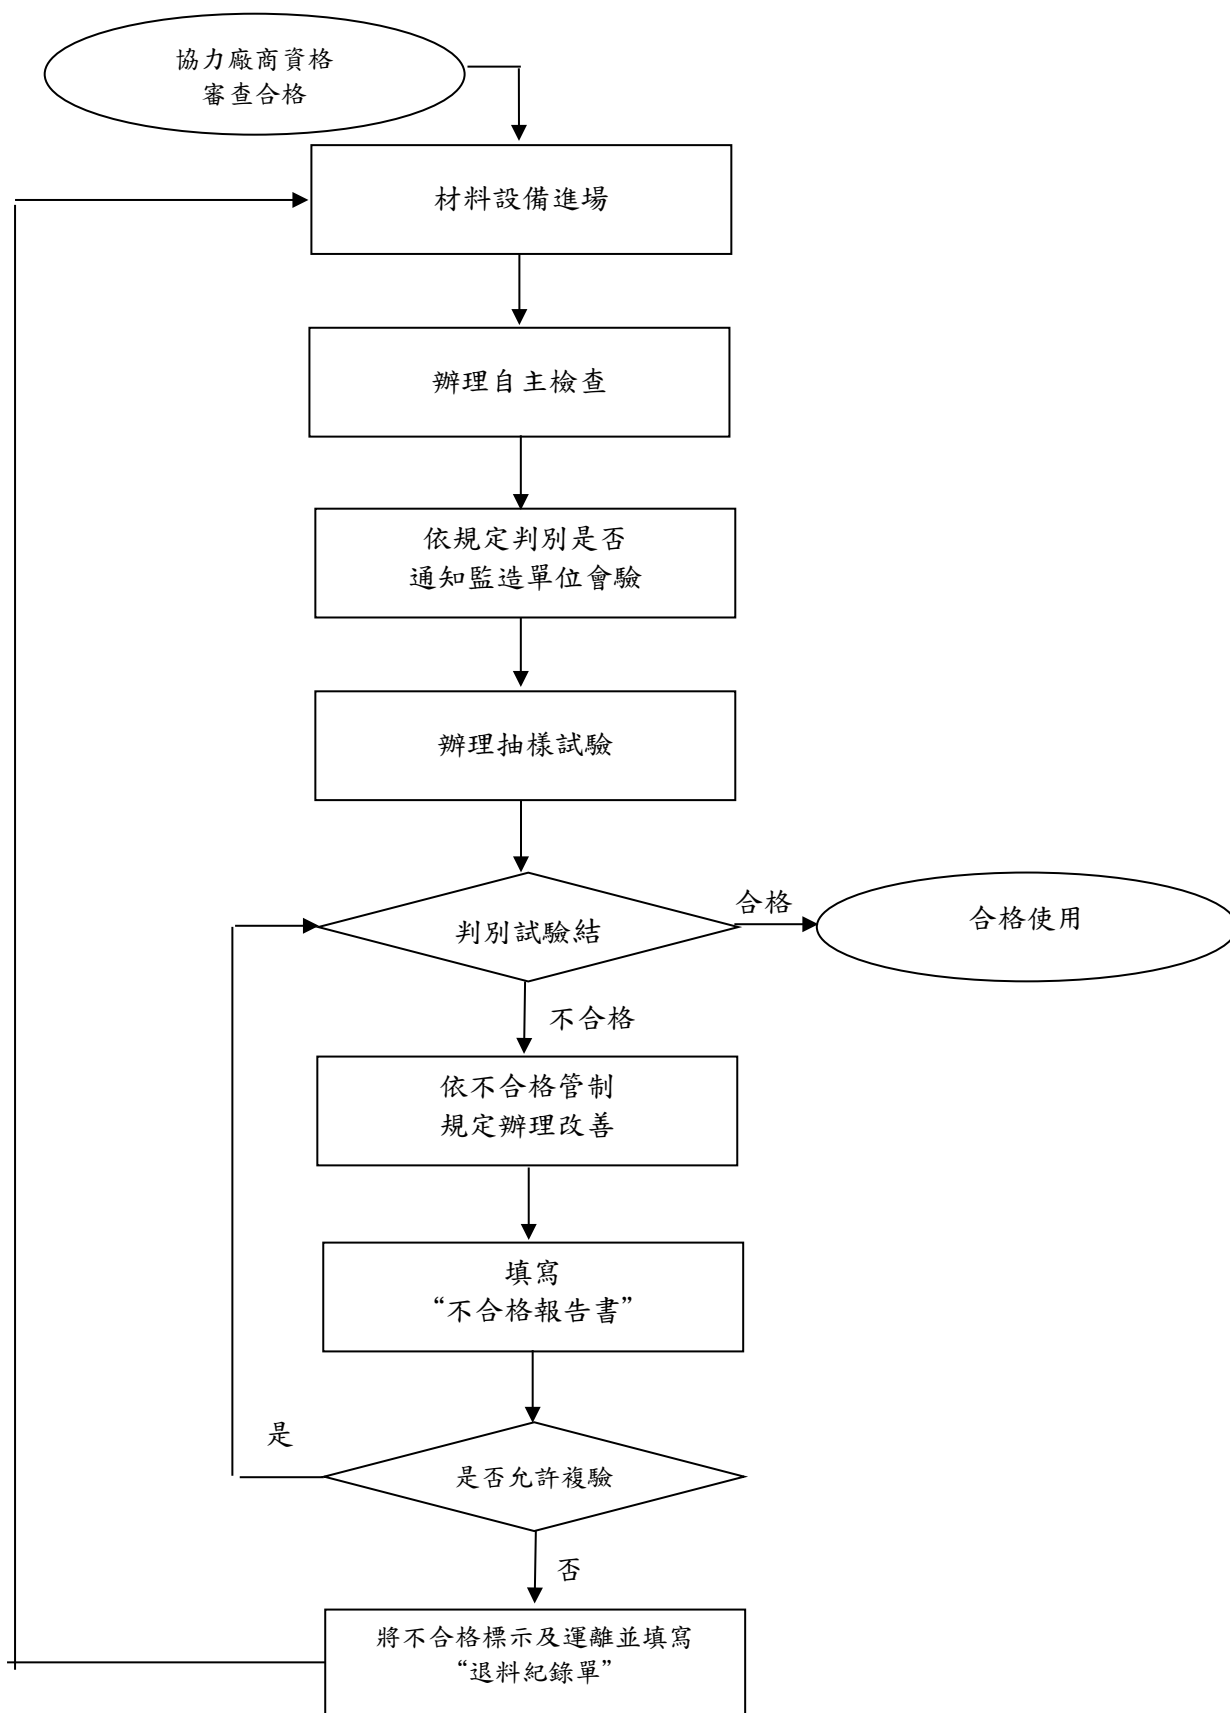


圖 5-3、材料設備檢驗流程圖

表 5-2、材料自主檢查表
材料自主檢查表

編號：TC-

工程名稱：

材料/設備名稱				檢驗日期	年 月 日
檢 驗 項 目	品質管理標準	檢驗數量	單位	檢驗值	檢驗結果
說 明	1. 『檢查結果』為檢驗值與品質管理標準之比較，填寫『合格』、『不合格』。 2. 檢驗不合格則登錄至「材料/設備檢（試）驗管制總表」第○項進行追蹤改善。				

工地負責人：

現場人員簽名（檢驗人員）：

表 5-3、材料退料紀錄單

材料退料紀錄單

編號：TD-

退料紀錄單			
日期： 年 月 日			
退料名稱		試驗編號	
材料名稱	退料理由及數量	代表試樣編號	
附件			
備註			
說明： 1、本紀錄單適用於材料試驗不格需予退料時填寫。 2、不合格材料，需有標識，以免誤用。 3、必要時得拍照存證，並將照片列為本紀錄單附件，其他相關文件（如材料計算表、磅單…等）亦一併附存。			
品	管	人	員
		工	地
		負	責
		人	

表 5-4、材料設備品質抽驗紀錄表

材料/設備品質查驗紀錄表

工程名稱	111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區、南區		
材料設備名稱		供應稱包商	
進場日期		進廠數量	
材料設備出廠證明			
材料設備堆置地點			
材料設備契約規範			
查驗方式	☐ 駐廠抽驗 ☐ 型錄樣品審核 ☐ 工地現場抽驗 ☐ 材料試驗式抽驗 ☐ 書面審查 ☐ 其他：		
取樣	取樣數量： 樣品保存或養護地點： 取樣日期： 送樣日期： 試驗日期： 會驗人員： 設備安裝位置：		
試驗機構名稱		試驗報告編號	
試驗項目及數據	☐ 如試驗報告 ☐ 其他： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值： 試驗項目： 合格值： 試驗值：		
抽驗結果	☐ 合格同意使用 ☐ 不合格隔離標示並運離工地 ☐ 數量不足 ☐ 材料推置場所不良 ☐ 其他	備註	應具體敘明規範(合格值)與查驗(試驗值)之數據，作為判定合格之依據。

承包商簽章：

監造單位：

備註：1. 材料設備抽驗不合格時，以備忘錄通知承包商改正並要求承包商儘速將材料設備隔離標示並運離工地。

2. 須檢附試驗報告。

表 5-5、材料設備檢（試）驗管制總表

編號：TB-01

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料（√）					審查日期	備註 （歸檔編號）
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹.一.17	25.8M3	是		否	√		√		√ 1. 配比資料		
	結構用混凝土，預拌， 210kgf/cm ²											
2	壹.一.21	2.1T	是		否	√		√		√ 1. 無輻射證明 2. 出廠品質證明書		
	鋼筋，SD280，連工帶料											
3	壹.一.38	8.5M2	否		否	√	√	√		√ 1. 選色		
	標線，熱處理聚酯，反光											
4	壹.二.12	6 顆										
	產品，預鑄混凝土，預鑄陰井，寬 60x 長 60x 深 90cm，含鍍鋅格柵板											
4-1	壹.二.12(1)	—	否		否	√	√					
	預鑄陰井，寬 60x 長 60x 深 90cm											

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
4-2	壹. 二. 12(2)	—	否		否							
	鍍鋅格柵板					√	√	√				
5	壹. 二. 15	280M	否		否							
	產品，軟式盲溝透水管 2"，含開挖、回填透水材料及包覆非織物等					√	√	√				
6	壹. 二. 17	19 組	否		否							
	產品，滲透陰井 30*30*35cm					√	√	√				
7	壹. 三. 52	129. 5M	否		否							
	硬質聚氣乙烯塑膠管(B 管厚管)，含管配件，標稱 50mm					√	√					
8	壹. 三. 55	56M	否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料（√）					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	硬質聚氯乙烯塑膠管(B管厚管)，含管配件，標稱100mm											
9	壹. 三. 61	161.9M	否		否	√	√					
	硬質聚氯乙烯塑膠管(自來水用)，含管配件，標稱25mm											
10	壹. 三. 72	600M	否		否	√	√					
	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，含管配件，標稱28mm											
11	壹. 三. 80	320M	否		否	√	√					
	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，絞線，2.0mm ²											
12	壹. 三. 81	140M	否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	產品，電線及電纜，600V 聚氯乙炔絕緣電線，絞線，3.5mm2											
13	壹. 三. 82	600M	否		否	√	√					
	產品，電線及電纜，600V 聚氯乙炔絕緣電線，絞線，5.5mm2											
14	壹. 三. 221	6 組	否		否	√	√	√				
	鍍鋅格柵板及框座											
15	壹. 三. 新增工項	320M	否		否	√	√					
	產品，導線管，聚氯乙炔 披覆金屬軟管，含管配件，標稱 22mm											
16	壹. 四. 14	41. 7M	否		否	√	√	√				

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	緣石，預鑄，25≤全高<30cm											
17	壹. 四. 18	906.3M2	否		否	√	√			√ 1. 色彩計畫		
	透水性鋪面，無細粒料混凝土，宜蘭石 TH=3cm											
18	壹. 四. 19	1433M2	是		否	√	√		√			
	透水性鋪面，無細粒料混凝土，3 分清碎石組成											
19	壹. 四. 27	2553M2	否		否	√	√	√				
	橡膠地磚，無縫，SBR(含膠)，1cm											
20	壹. 四. 34	278M2	否		否	√	√	√	√			
	兒童遊戲場設備，人工草皮，t=4.0cm											
21	壹. 四. 80	28.2M3	否		否				√			
	產品，宜蘭石											
22	壹. 四. 新增工項	70M										
	磨石子座椅											

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
22-1	壹. 四. 新增工項(1)	—	否		否	√	√		√	√ 1. 選樣		
	磨石子											
23	壹. 四. 新增工項	24M										
	座椅靠背											
23-1	壹. 四. 新增工項(2)	—	否		否	√	√	√	√			
	產品，木材，再生複合材											
23-2	壹. 四. 新增工項(3)	—	否		否	√		√				
	不銹鋼料											
24	壹. 四. 新增工項	6M										
	入口意象牆											
24-1	壹. 四. 新增工項(4)	—	否		否	√	√		√	√ 1. 選樣		
	抵石子											
25	壹. 四. 新增工項	1 組	否		否	√		√		√ 1. 無輻射證		

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	入口意象牆不銹鋼板									明		
26	壹. 四. 新增工項	344M	否		否	√		√		√ 1. 無輻射證明		
	鍍鋅鋼板，鋼板收邊， W=5cm，T=4.5mm											
27	壹. 五. 1	136.7 C. M3	否		否	√		√	√	√ 1. 無紅火蟻證明		
	產品，植栽，客土，砂質壤土，含無紅火蟻證明											
28	壹. 五. 15. 0	5 株	否		是	√						
	喬木植栽，第三類 C 組， 10cm≤米高直徑，360cm≤樹高，160cm≤樹寬											
29	壹. 五. 16. T	1152 株	否		否	√			√	√ 1. 標準苗株照		
	產品，沿階草，高度<20cm，寬度<10cm，容器直徑<10cm 盆苗											
30	壹. 五. 16. V	335 株	否		否	√			√	√ 1. 標準苗株照		

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	產品，紫嬌花，20≤高度<30cm，20≤寬度<30cm											
31	壹. 五. 16. 52	455 株	否		否	√			√	√ 1. 標準苗株照		
	產品，馬纓丹，20≤高度<25cm，20≤寬度<25cm											
32	壹. 五. 16. 57	673M2	否		否	√			√	√ 1. 標準苗株照		
	植草，密鋪，不限草種											
33	壹. 五. 16. 58	133. 7M2	否		否	√						
	植草，撒播，不限草籽(花籽)，種籽(假儉草)											
34	壹. 六. 1	15 盞	否		否	√	√	√	√			
	LED 照明設備，景觀高燈，H:3. 5~5M											

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
35	壹. 六. 4	65M	否		否	√	√	√	√			
	LED 照明設備，LED 軟條燈											
36	壹. 六. 16	1 座	否		否	√	√	√				
	產品，分電箱，電源開關箱，不銹鋼板											
37	壹. 六. 19	3 個	否		否	√	√	√	√			
	變壓器防水開關器保護箱											
38	壹. 六. 新增工項	3 個	否		否	√	√					
	防水型電源供應器											
39	壹. 六. 新增工項	1 個	否		否	√	√					
	NFB 2P 50AF 50AT 10KA 220V											
40	壹. 六. 新增工項	3 組	否		否	√	√					
	漏電斷路器 ELCB 300MA											

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
41	壹. 七. 9	3 只	否		否	√	√					
	電機基本材料及施工方法，電磁開關											
42	壹. 七. 10	6 只	否		否	√	√		√			
	產品，景觀灌溉設備，防水接頭											
43	壹. 七. 16	2 只	否		否	√	√					
	產品，景觀灌溉設備，閘閥											
44	壹. 七. 26	1 組	否		否	√	√					
	產品，景觀灌溉設備，噴灌專用馬達，3HP											
45	壹. 七. 29	1 個	否		否	√	√					
	產品，景觀灌溉設備，噴灌控制箱											
46	壹. 七. 35	6 組	否		否	√	√					
	產品，景觀灌溉設備，水閘箱											

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
47	壹. 七. 36	1 只	否		否	√	√					
	產品，電機基本材料及施工方法，24 小時定時器											
48	壹. 七. 39	6 只	否		否	√	√					
	產品，閥，快速給水閥，含給水閥插桿組，(插桿、活動彎頭及接頭等)											
49	壹. 七. 44	6 只	否		否	√	√					
	產品，閥，快速給水閥，QCV 銅製											
50	壹. 七. 53	1 組	否		否	√	√					
	水泥混凝土構造物，蓄水設施，5T，含 2" 浮球遙控閥及爬梯											
51	壹. 九. 38	158m2	否		否	√	√		√	√ 1. 色彩計畫		
	橡膠地磚，彩色無縫式橡膠地墊(EPDM 材質)th:10mm											
52	壹. 九. 45	1 座	否		否	√	√					

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	雙人漫步機(豪華版)											
53	壹. 九. 49	1 組	否		否	√	√					
	雙人伸腰伸背器(簡易版)											
54	壹. 九. 59	1 座	否		否	√	√					
	雙人扭腰器(豪華版)											
55	壹. 九. 62	1 座	否		否	√	√					
	雙人大輪轉(豪華版)											
56	壹. 九. 64	1 座	否		否	√	√					
	雙人坐蹬(豪華版)											
57	壹. 九. 新增工項	1 式										
	兒童遊戲場設備，土丘攀爬設施											
57-1	壹. 九. 新增工項(1)	-	是		否	√		√ 1. 木種	√			

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	原木							2. 含水量 3. 材等				
57-2	壹. 九. 新增工項(2)	—	否		否	√	√			√ 1. 選樣		
	攀爬網											
58	壹. 九. 新增工項	30M2	否		否	√	√		√	√ 1. 選樣		
	兒童遊戲場設備，滑梯， 水泥磨石子											
59	壹. 九. 新增工項	1 式										
	兒童遊戲場設備，攀爬牆											
59-1	壹. 九. 新增工項(3)	—	否		否	√	√			√ 1. 選樣		
	兒童遊戲場設備，攀爬塊											
59-2	壹. 九. 新增工項(4)	—	否		否	√	√					
	兒童遊戲場設備，特多龍繩											
59-3	壹. 九. 新增工項(5)	—	否		否	√	√					
	兒童遊戲場設備，木板爬繩											

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
60	壹. 九. 新增工項	31. 6M	否		否	√	√		√	√ 1. 選樣		
	地景，磨石子扶手											
61	壹. 九. 新增工項	1 組	否		否	√	√					
	兒童遊戲場設備，鳥巢及一般鞦韆											
62	壹. 九. 新增工項	1 座	否		否	√	√					
	兒童遊戲場設備，遮陽風箏											
63	壹. 九. 新增工項	1 座	否		否	√	√					
	兒童遊戲場設備，遮陽風箏(大)											
64	壹. 九. 新增工項	1 座										
	光影鋼棚											
64-1	壹. 九. 新增工項(6)	—	否		否	√		√				
	結構用鋼料											
64-2	壹. 九. 新增工項(7)		否		否	√	√			√ 1. 色卡		

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (√)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料/設備名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
	結構用鋼料，烤漆											
64-3	壹. 九. 新增工項(8)	—	否		否	√			√	√ 1. 選樣		
	PVC 板											
65	壹. 九. 新增工項	46M	否		否	√		√		√ 1. 無輻射證明		
	安全扶手欄杆											
66	壹. 九. 新增工項	6 座	否		否	√		√				
	鍍鋅鋼料，遊戲設施告示牌											
67	壹. 九. 新增工項	1 座	否		否	√		√				
	鍍鋅鋼料，遊戲場告示牌											

備註：

1. 材料設備抽驗不合格時，以備忘錄通知承包商改正並要求承包商儘速將材料設備隔離標示並運離工地。
2. 須檢附試驗報告。

二、施工檢驗程序

(一)、自主品管檢查

1. 各單項工程於施工過程中，由品管人員依合約、設計圖說及施工規範之品質標準，按照自主檢查表逐項進行檢查，並將檢查結果確實記錄於自主檢查表，經品管人員、工地負責人核章後存檔於工地備查。
2. 自主檢查表製作原則應依不同施工階段詳列檢查細項、檢查標準量化與描述、檢查結果及缺失情形。檢查細項應涵蓋重點項目、經常發生缺失處及施工容易疏漏處。

(二)、檢驗停留點會同檢驗

當施工進行至檢驗停留點時，承包商須先辦理自主檢查，檢查合格後再向監造單位提出檢驗申請，俟檢驗合格後始得進行下一施工項目。

(三)、檢驗停留點

當單一工項施做完成，要進行下一施工步驟點，或施工數量達某一定程度時，應暫停繼續施作並通知監造單位會同檢驗。

(四)、施工作業流程及檢驗

於本工程合約內之工項，依合約責任要求，主要管制項目如圖 5-7。

項次	施工作業流程及檢驗圖	附註
1	放樣工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-1
2	鋼筋(銲接鋼線網)工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-2
3	模板工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-3
4	混凝土工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-4
5	鋪面標線工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-5
6	排水管溝工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-6
7	木作工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-7
8	金屬物件工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-8
9	鋼構工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-9
10	抵石子工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-10
11	水泥磨石子工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-11
12	混凝土面層工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-12
13	高壓混凝土緣石工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-13
14	透水性鋪面工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-14
15	無縫地墊工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-15
16	人工草皮工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-16
17	植栽移植工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-17
18	植栽新植工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-18
19	草皮鋪植工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-19
20	照明工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-20
21	配(分)電箱工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-21
22	澆灌工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-22
23	兒童遊戲場工程施工作業流程及檢驗圖	圖 5-7-23

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A([前置作業]) --> B{測量放樣查驗} B -- 不合格 --> A B -- 合格 --> C[現場調整] C --> D([完成]) </pre> ※※	依圖說或經現場指示	放樣工程自主檢查表
	1. 位置 2. 尺寸 3. 高程 4. 職安衛檢查	放樣工程自主檢查表
	1. 位置	放樣工程自主檢查表

圖 5-7-1、放樣工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[材料進場] --> B{材料查(試)驗} B -- 不合格 --> C[退料] C --> A B -- 合格 --> D[鋼筋組立] D --> E{組立查驗} E -- 不合格 --> D E -- 合格 --> F[完成] </pre>	1. 鋼筋號數 #3、#4、#5 鋼線網 D=__mm@__*__cm 2. 鋼筋(鋼線網)進 場需墊高至少 10cm，防止鋼筋 汙染及銹蝕	鋼筋(銲接鋼線網) 工程自主檢查表
	1. 垂直度及平直 度 2. 綁紮間距 3. 綁紮方式 4. 開口部位置、 尺寸 5. 預留筋位置	鋼筋(銲接鋼線網) 工程自主檢查表
	表面清潔	鋼筋(銲接鋼線網) 工程自主檢查表

圖 5-7-2、鋼筋(銲接鋼線網)工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[修正重新進場] --> B[材料進場] B --> C{材料查驗} C -- 不合格 --> D[退料] D --> A C -- 合格 --> E[放樣] E --> F[模板組立] F --> G{置前查驗 撤安衛查驗} G -- 不合格 --> H[拆模] H --> F G -- 合格 --> I[混凝土澆置] I --> J[養護] J --> K[拆模] </pre>	1. 模板型式、尺寸、外觀 2. 角材尺寸、外觀 3. 基礎尺寸、外觀	模板工程自主檢查表
	1. 依設計圖說規定	模板工程自主檢查表
	1. 斷面尺寸及高度 2. 垂直度及平直度 精度±3mm 3. 角材位置、間距 4. 斜撐固定@60cm 5. 開口部位置、尺寸 6. 預留筋位置 7. 預埋物件 8. 清潔口	模板工程自主檢查表
	1. 拆模期限	模板工程自主檢查表

圖 5-7-3、模板工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
-------	------	---------

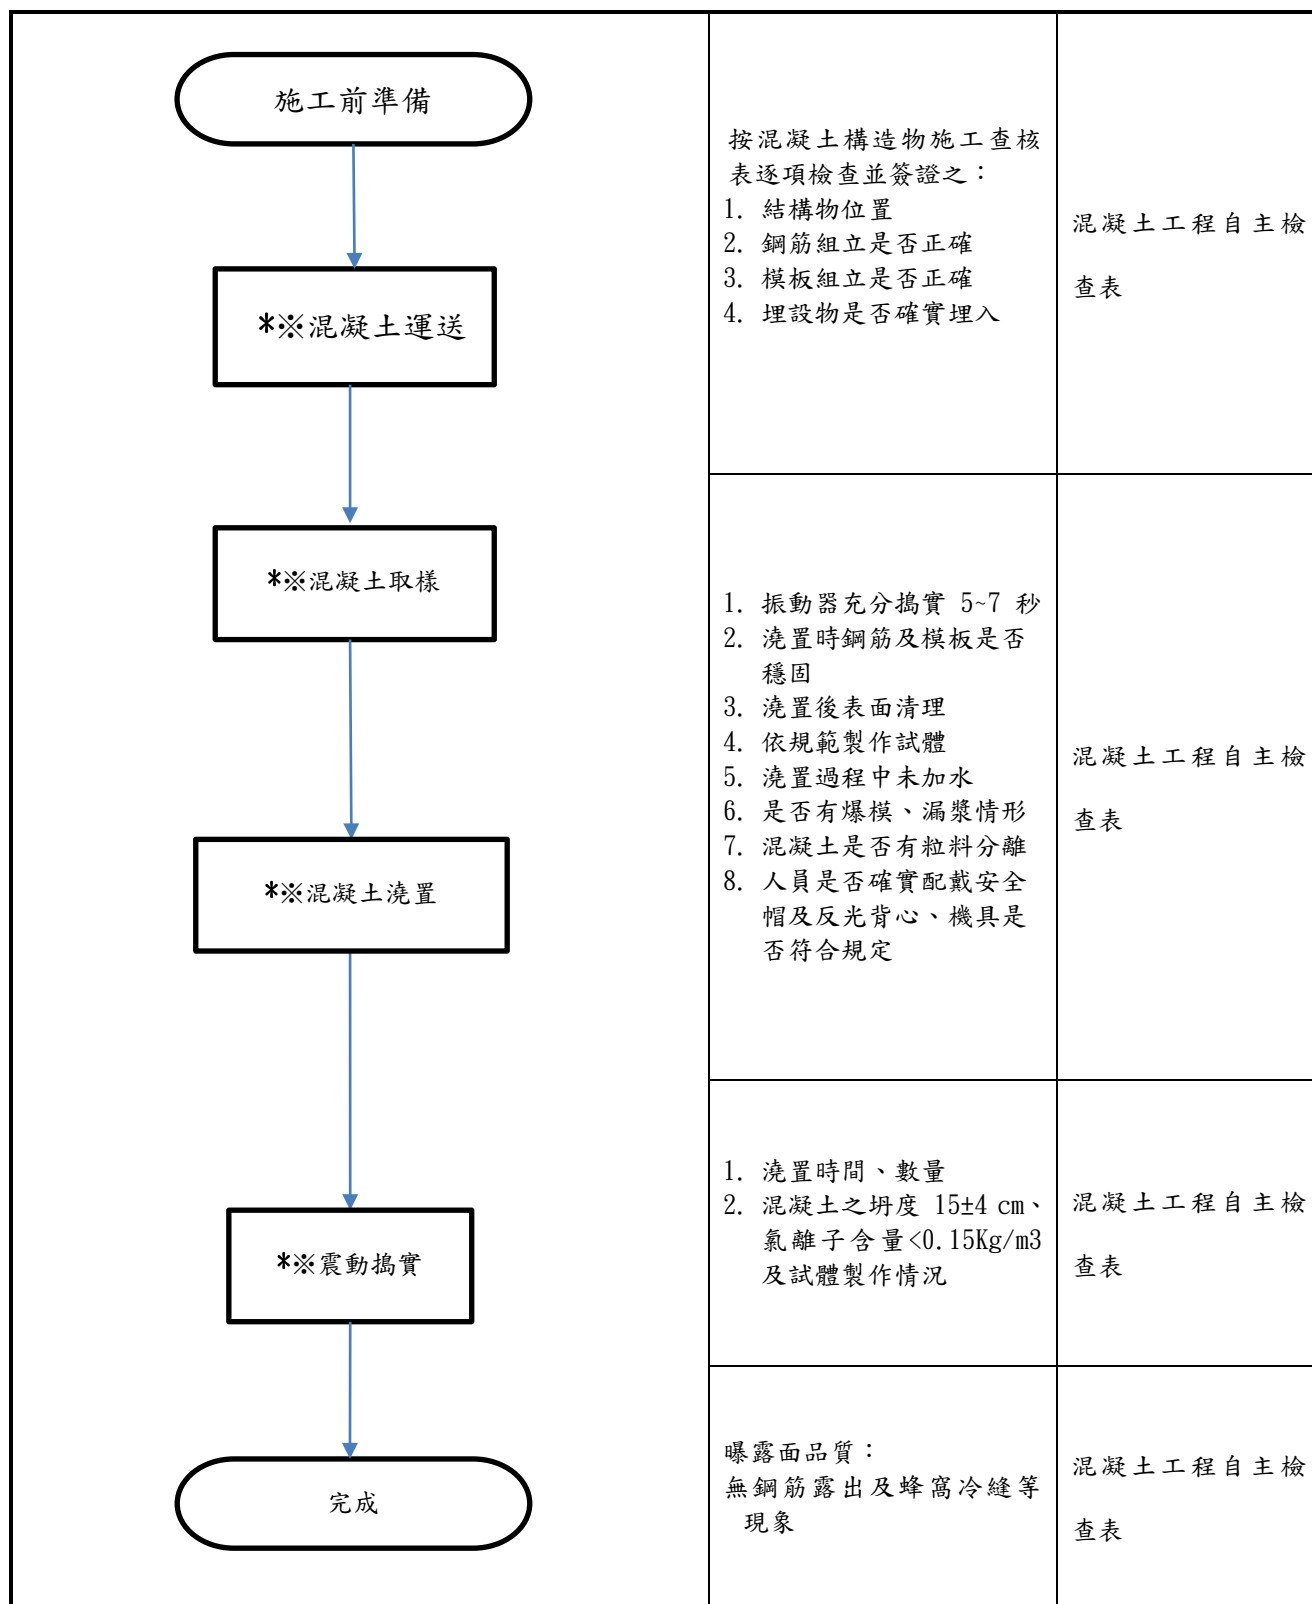


圖 5-7-4、混凝土工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[材料進場] B --> C{材料查驗} C -- 不合格 --> B C -- 合格 --> D[放樣] D -- ※ --> E{ } E -- 不合格 --> D E -- 合格 --> F[標線施作] F --> G{標線查驗 ※} G -- 不合格 --> F G -- 合格 --> H[完成] </pre>	1. 提供樣品及相關文件,經監造及業主核備 2. 依核可素材備料	鋪面標線工程自主檢查表
	材料於現場妥善保存	鋪面標線工程自主檢查表
	1. 放樣位置檢驗 2. 材料數量檢驗 3. 標線尺寸檢驗 4. 地坪表面須整潔 5. 人員是否確實配戴安全帽及反光背心、機具是否符合規定。	鋪面標線工程自主檢查表
	1. 尺寸是否正確 2. 顏色是否均勻 3. 整體是否平順無瑕疵	鋪面標線工程自主檢查表

圖 5-7-5、鋪面標線工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[測量放樣] B --> C[材料進場] C --> D{檢驗} D -- 不合格 --> C D -- 合格 --> E{職安衛查驗} E --> F[管線開挖] F --> G[放置管線及警示帶] G --> H{檢驗} H -- 不合格 --> G H --> I[完成] </pre> ※為自主檢查停留點 *為檢驗停留點	1. 檢送相關書面送審文件, 經監造單位審核。 2. 測定管線設備安裝位置 3. 材料規格尺寸查驗。	排水管溝工程自主檢查表
	1. 位置及造型數量得依現場會勘及相關決議酌予調整。 2. 埋設深度	排水管溝工程自主檢查表
	1. 功能是否正常 2. 數量及位置是否正確	排水管溝工程自主檢查表

圖 5-7-6、排水管溝工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[材料進場] B --> C{材料查驗} C -- 不合格 --> B C -- 合格 --> D[放樣] D --> E[安裝組立] E --> F{組立查驗} F -- 不合格 --> E F -- 合格 --> G[完成] </pre> *為檢驗停留點 ※為自主檢查停留點	1. 提供樣品及相關文件, 經監造及業主核備 2. 依核可素材備料	木作工程自主檢查表
	材料於現場妥善保存	木作工程自主檢查表
	1. 材料規格檢驗 2. 材料數量檢驗 3. 材料尺寸檢驗 4. 材料表面須平整	木作工程自主檢查表
	1. 安裝是否穩固 2. 尺寸是否正確 3. 整體是否平順 4. 五金配件需為不鏽鋼或熱浸鍍鋅處理	木作工程自主檢查表

圖 5-7-7、木作工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[材料進場] --> B{材料查驗} B -- 不合格 --> C[修正] B -- 合格 --> D{裝設查驗} D -- 不合格 --> E[修正] D -- 合格 --> F[補漆] F --> G([完成]) </pre> *為檢驗停留點 ※為自主檢查停留點	1. 架高放置	金屬物件工程自主 檢查表
	1. 材料種類 2. 物件規格 3. 數量	金屬物件工程自主 檢查表
	1. 尺寸 2. 焊接處平順 3. 固定方法 4	金屬物件工程自主 檢查表
	1. 固定穩定度 2. 完成面	金屬物件工程自主 檢查表

圖 5-7-8、金屬物件工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[材料進場] --> B{材料查驗} B -- 不合格 --> C[修正] B -- 合格 --> D{組立查驗} D -- 不合格 --> E[修正] D -- 合格 --> F[補漆] F --> G([完成]) </pre> *為檢驗停留點 ※為自主檢查停留點	1. 架高放置	鋼構工程自主檢查表
	1. 材料種類 2. 規格 3. 數量	鋼構工程自主檢查表
	1. 鋼構尺寸 2. 間距 3. 焊接處平順 4. 固定方法	鋼構工程自主檢查表
	1. 固定穩定度 2. 完成面	鋼構工程自主檢查表

圖 5-7-9、鋼構工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[材料進場] --> B[底層清理] B --> C[水泥漿打底 及壓條施作] C --> D{拌合石料施作} D -- 不合格 --> C D -- 合格 --> E[填縫劑施作] E --> F[完成] </pre> * 為檢驗停留點 ※ 為自主檢查停留點	1. 材料尺寸、數量 2. 水泥、石粉 3. 石子 1-1.5 分	抵石子工程自主檢 查表
	1. 面層抹平壓實 2. 勾縫設置	抵石子工程自主檢 查表
	1. 石材面清潔 2. 填縫劑八分滿	抵石子工程自主檢 查表

圖 5-7-10、抵石子工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[材料進場] --> B[底層清理] B --> C[水泥漿打底 及壓條施作] C --> D{拌合石料施作} D -- 不合格 --> C D -- 合格 --> E[填縫劑施作] E --> F[完成] </pre> *為檢驗停留點 ※為自主檢查停留點	1. 材料尺寸、數量 2. 水泥、石粉 3. 石子 1-1.5 分	水泥磨石子工程自主檢查表
	1. 面層抹平壓實 2. 勾縫設置	水泥磨石子工程自主檢查表
	1. 石材面清潔 2. 填縫劑八分滿	水泥磨石子工程自主檢查表

圖 5-7-11、水泥磨石子工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A([施工前準備]) --> B[放樣] B --> C[地坪施工] C --> D{施工後檢驗} D -- 不合格 --> C D -- 合格 --> E([完成]) </pre> *為檢驗停留點 ※為自主檢查停留點	1. 提送樣品	送審文件
	1. 依設計圖說規定	混凝土面層工程自主檢查表
	1. 水泥與砂比例1:3與適量石粒、水拌合 2. 應於接合不漏水之容器內 3. 拌合時間不少於3分鐘	混凝土面層工程自主檢查表
	1. 下料需均勻、厚度一致 2. 鎚刀拍打鎚平施壓	混凝土面層工程自主檢查表
	1. 待泥漿面完全乾透後進行斬琢 2. 斬琢方向性需一致 3. 深度需均勻	混凝土面層工程自主檢查表
	1. 表面與環境清潔	混凝土面層工程自主檢查表

圖 5-7-12、混凝土面層工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[測量放樣及整地] B --> C[鋪設底層] C --> D{鋪設底層檢查} D -- 不合格 --> C D -- 合格 --> E[基座施作] E --> F[鋪排緣石] F --> G{鋪排緣石檢查} G -- 不合格 --> F G -- 合格 --> H[完 成] </pre> *為檢驗停留點 ※為自主檢查停留點	1. 材料送審 2. 應照設計圖準確施工	1. 送審文件
	1. 測定施工範圍 2. 沿線設置固定控制點，施工中隨時校正 3. 決定排水方向及坡度	高壓混凝土緣石工程自主檢查表
	1. 整地至基座底層並清除雜草及廢棄物 2. 路基層壓實 3. 注意排水規劃及排水坡度，避免排水不良造成積水	高壓混凝土緣石工程自主檢查表
	1. 模板組立 2. 依設計高程定水準線 3. 底層混凝土澆置時依水準線澆置，待混凝土硬化後鋪設緣石	高壓混凝土緣石工程自主檢查表
	1. 依設計圖樣及坡度定基準線 2. 於基座上先鋪一層 1:3 水泥砂漿，然後砌築緣石 3. 砌築時注意緣石面不可沾到混凝土，若沾到應馬上用溼海綿擦拭。 4. 緣石間應緊密靠近，必免土壤流失。 *為檢驗停留點	高壓混凝土緣石工程自主檢查表

圖 5-7-13、高壓混凝土緣石工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[材料進場] --> B[底層清理] B --> C[水泥漿打底 及壓條施作] C --> D{拌合石料施作} D -- 不合格 --> C D -- ※ --> E[填縫劑施作] E --> F[完成] </pre>	4. 材料尺寸、數量 5. 水泥、石粉 6. 石子 1-1.5 分	透水性鋪面工程自主檢查表
	3. 面層抹平壓實 4. 勾縫設置	透水性鋪面工程自主檢查表
	3. 石材面清潔 4. 填縫劑八分滿	透水性鋪面工程自主檢查表

圖 5-7-14、透水性鋪面工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A([材料進場堆置]) --> B[測量放樣及組裝] B --> C{施工後檢驗} C -- 不合格 --> B C -- 合格 --> D([完成]) </pre>	1. 材料證明文件 2. 材料進場需墊高至少 10cm。	施工自主檢查表
	1. 組裝位置確認抽查前量化填入施工抽查紀錄表。 2. 安全距離 $\geq 183\text{cm}$	施工自主檢查表

圖 5-7-15、無縫地墊工程施工作業流程及檢驗圖

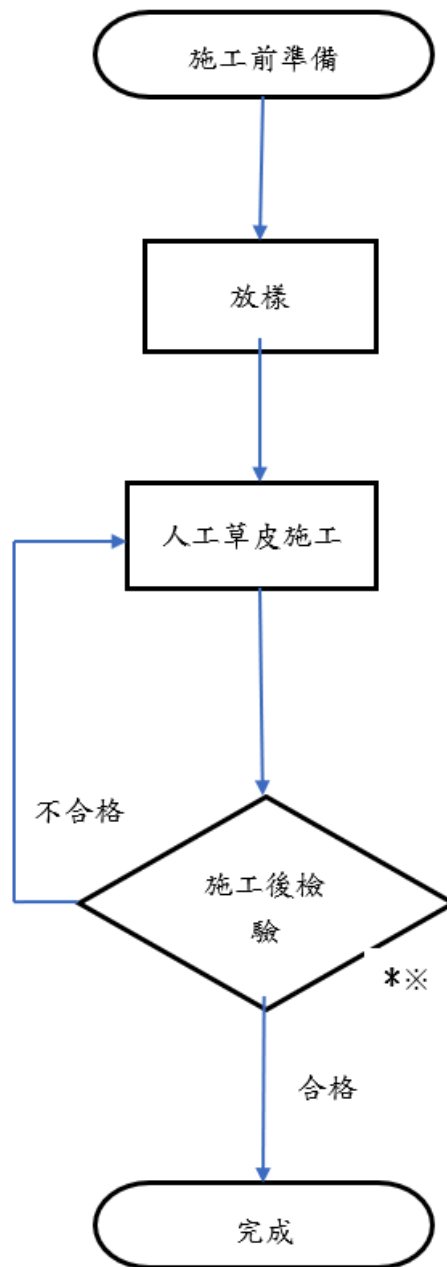


圖 5-7-16、人工草皮工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[計劃書、位置放樣] --> B{移植作業 職安衛查驗} B -- 不合格 --> C[修正] B -- 合格 --> D[澆灌] D --> E([完成(後續養護)]) </pre>	1. 數量 2. 樹種 3. 位置	施工自主檢查表
	1. 修枝 2. 樹幹以草繩或 PE 保鮮膜或報紙保護 3. 斷根、土球包覆 4. 植穴深度、寬度 5. 既有土壤無大礫石 6. 土球保護材拆除 7. 回填土壓實 8. 人員是否確實配戴安全帽及反光背心、機具是否符合規定、吊放是否有圍設安全距離即指派指揮人員。	施工自主檢查表
	1. 施作集水坑 2. 澆水 3. 支架	施工自主檢查表
	1. 澆水 2. 施肥 3. 病蟲害防治	施工自主檢查表

圖 5-7-17、植栽移植工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[材料進場] B --> C{查 驗} C -- 不合格 --> B C -- 合格 --> D{職安衛查驗} D -- 合格 --> E[施工] E --> F[完成] </pre>	1. 種植方法 2. 養護方法 3. 無紅火蟻證明	施工自主檢查表
	1. 種類是否正確 2. 規格是否正確 3. 數量是否正確	施工自主檢查表
	1. 種類是否正確 2. 規格是否正確 3. 數量是否正確 4. 位置是否正確 5. 施肥量是否符合契約規定 6. 回填土是否掘鬆 7. 人員是否確實配戴安全帽及反光背心、機具是否符合規定、吊放是否有圍設安全距離即指派指揮人員。	施工自主檢查表
	1. 是否確實養護 2. 施肥量是否正確 3. 病蟲害防治	施工自主檢查表

圖 5-7-18、植栽新植工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A([施工計畫]) --> B{材料進場} B -- 不合格 --> C[退料] B -- 合格 --> D[施工] D --> E[養護] E --> F([完成]) </pre>	1. 種植方法 2. 養護	施工自主檢查表
	1. 種類 2. 規格 3. 數量	施工自主檢查表
	1. 種類 2. 規格 3. 數量 4. 位置 5. 肥料 6. 回填土	施工自主檢查表
	1. 澆水 2. 施肥 3. 病蟲害防治	施工自主檢查表

圖 5-7-19、草皮鋪植工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A([施工前準備]) --> B[路燈基礎施作 及管路埋設] B --> C[燈具組裝] C --> D{施工後檢 驗} D -- 不合格 --> C D -- 合格 --> E([完成]) </pre>	樣式及數量確認。	施工自主檢查表
	位置、尺寸應依施工圖說。 雜物清除。	施工自主檢查表
	燈具形式應依施工圖說。 支架設立依施工圖說。	施工自主檢查表

圖 5-7-20、照明工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A([施工前準備]) --> B[基礎施作及管 路埋設] B --> C[配(分)電箱組 裝] C --> D{施工後檢 驗} D -- 不合格 --> C D -- 合格 --> E([完成]) </pre>	放樣位置確認。 數量確認。	施工自主檢查表
	位置、尺寸應依施 工圖說。	施工自主檢查表
	尺寸應依施工圖 說。	施工自主檢查表
	功能測試。	施工自主檢查表

圖 5-7-21、配(分)電箱工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[施工前準備] --> B[測量放樣] B --> C[材料進場] C --> D{查驗} D -- 不合格 --> C D -- 合格 --> E{職安衛查驗} E --> F[管線開挖] F --> G[放置管線及警示帶] G --> H{查驗} H -- 不合格 --> G H -- 合格 --> I[完成] </pre>	1. 檢送相關書面送審文件, 經監造單位審核。 2. 測定澆灌設備安裝位置 3. 材料規格尺寸查驗。	施工自主檢查表
	1. 位置及造型數量得依現場會勘及相關決議酌予調整。 2. 埋設深度	施工自主檢查表
	1. 功能是否正常 2. 數量及位置是否正確	施工自主檢查表

圖 5-7-22、澆灌系統工程施工作業流程及檢驗圖

作業流程圖	檢驗要點	相關記錄/文件
<pre> graph TD A[材料進場] --> B{材料查驗} B -- 不合格 --> C[修正] B -- 合格 --> D[基礎確認] D --> E{鐵件施作 職衛查驗} E -- 不合格 --> F[修正] E -- 合格 --> G{面材施作} G -- 不合格 --> H[修正] G -- 合格 --> I{其他設備安裝} I -- 不合格 --> J[修正] I -- 合格 --> K([完成]) </pre>	1. 架高放置	施工自主檢查表
	1. 材料種類 2. 規格 3. 數量	施工自主檢查表
	1. 養護日數足夠 2. 基礎面無積水問題	施工自主檢查表
	1. 高度 2. 間距 3. 焊接處平順 4. 固定方法	施工自主檢查表
	1. 材料尺寸 2. 固定方法 3. 收邊細節	施工自主檢查表
	1. 材料尺寸 2. 固定方法 3. 收邊細節	施工自主檢查表
	1. 固定穩定度 2. 完成面	施工自主檢查表

圖 5-7-23、兒童遊戲場工程施工作業流程及檢驗圖

陸、設備功能運轉檢測程序及標準

一、試運轉目的

完善之規劃設計與施工，此為機電設施能夠發揮功能之必要條件，然而在工程完工之後更需要良好的操作、管理與維護，才能達成且發揮預期目標，惟有正確操作並做好預防性維護工作，防範於未然，才能事半功倍，經濟有效。正確之操作可發揮良好之設備功能，科學之管理可以提高效率，完善之維護可以防範故障之發生，否則不但影響設備功能，進而降低處理效果，危害環境，增加操作維護費用。

試運轉可以測試各設施單體的功能是否合乎設計的要求，以及運轉是否正常，設備的配合程度，配管線等施工品質是否合於要求，並且自試運轉過程中發覺問題，解決問題，以便設施在正式運轉時能順利正常。

二、材料採購計畫、檢驗管制計畫

為了使施工品質達到品管理標準的要求，於材料進場前即做好計畫，控制材料進場時程及檢驗管制，方可執行下一步安裝工作，以確定進行中或已完成之工作，符合品質標準之要求。

設備檢測	設備功能運轉檢測標準
單機運轉	測試其開關接線迴路是否正確，燈具應採用符合國家標準並有正字標誌之國產品. 且應達契約所載之標準
系統檢測	測試燈具色溫是符合標準，燈具應採用符合國家標準並有正字標誌之國產品. 且應達契約所載之標準
整體檢測	測試其全彩燈具之呈現，為確認所有機電設備系統相互連結後，整體之運作能符合契約之要求，執行測試完成後依設備之性質。

表 6-1、單機運轉自檢標準表

施工流程	管理項目 (A)	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
燈具總類 及數量		施工前	目視	進貨完成 時每次	補正	設備功能 運轉自檢 紀錄表	
燈具功能 檢視	點亮功能 正常	施工後	目視	施工完成 時 一次	更換材料	設備功能 運轉自檢 紀錄表	
單色燈具 色溫檢測		施工後	儀器檢測	施工完成 時 一次	更換材料	設備功能 運轉自檢 紀錄表	色溫待主 辦 選定

表 6-2、單機運轉自檢標準表

施工流程	管理項目 (A)	檢查時機	檢查方法	檢查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
控制系統	得依承包商提供之手冊基本操作	施工後	測試操作	施工完成 時 一次	缺失改善	設備功能 運轉自檢 紀錄表	
手動開關	連接之燈具連動	施工後	操作	施工完成 時 一次	缺失改善	設備功能 運轉自檢 紀錄表	
定時開關	依設定時間作動	施工後	操作	施工完成 時 一次	缺失改善	設備功能 運轉自檢 紀錄表	
試運轉	整體連續 測試 3 日 以上	施工後	目視	施工完成 時 一次	缺失改善	設備功能 運轉自檢 紀錄表	

柒、自主檢查表

一、目的

自主檢查表製作原則應依不同施工階段詳列檢查細項、檢查標準量化與描述、檢查結果及缺失情形，檢查細項應涵蓋重點項目、經常發生缺失處及施工容易疏漏處；本工程依據品質管理標準項目，訂定自主檢查表實施自主檢查，以達第一級之品質管理系統目的，使本工程在施工過程中，各項作業能確實依工程契約之相關規定要求完成。本工程自主檢查表表格如表 6-1~6-7 所示。

項次	施工抽查項目	附註
1	放樣工程自主檢查表	表 7-1
2	鋼筋(銲接鋼線網)工程自主檢查表	表 7-2
3	模板工程自主檢查表	表 7-3
4	混凝土工程自主檢查表	表 7-4
5	鋪面標線工程自主檢查表	表 7-5
6	排水管溝工程自主檢查表	表 7-6
7	木作工程自主檢查表	表 7-7
8	金屬物件工程自主檢查表	表 7-8
9	鋼構工程自主檢查表	表 7-9
10	抵石子工程自主檢查表	表 7-10
11	水泥磨石子工程自主檢查表	表 7-11
12	混凝土面層工程自主檢查表-1	表 7-12
13	混凝土面層工程自主檢查表-2	表 7-13
14	高壓混凝土緣石工程自主檢查表	表 7-14
15	透水性鋪面工程自主檢查表	表 7-15
16	無縫地墊工程自主檢查表	表 7-16
17	人工草皮工程自主檢查表	表 7-17

18	植栽移植工程自主檢查表	表 7-18
19	植栽新植工程自主檢查表	表 7-19
20	草皮鋪植工程自主檢查表	表 7-20
21	照明工程自主檢查表	表 7-21
22	配(分)電箱工程自主檢查表	表 7-22
23	澆灌工程自主檢查表	表 7-23
24	兒童遊戲場工程自主檢查表	表 7-24

二、自主檢查表之執行

(一)、檢查人員及檢查時機：

各單項工程於施工過程中，由現場工程師逐項進行檢查，檢查完畢後應當場簽名，不應事後以蓋章方式處理；工地負責人核章後存檔於工地備查。當施工進行至檢驗停留點時，承包商須先辦理自主檢查，檢查合格後再向監造單位提出檢驗申請，俟檢驗合格後始得進行下一施工項目。

(二)、不符合情形處置及管制方法：

1. 施工中若查驗不合格時，現場工程師需紀錄於「自主檢查表」中，並依第八章不合格品管制之規定辦理，限期於時限內改善完成。
2. 如屬缺失發生頻率過高之項目或重大缺失，則應知會品管人員判別是否執行矯正與預防措施進行矯正活動。
3. 自主檢查結果應由品管人員辦理品管統計分析，並依統計結果，對於不符合事項依第八章矯正與預防措施辦理時機檢討執行，且對矯正結果辦理追蹤。

表 7-1、放樣工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-2、鋼筋(焊接鋼線網)工程自主檢查表

編號：

工程名稱	111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	檢查標準(定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
證明文件	出廠證明及無輻射證明		
進場堆置及完成加工之堆置	進場材料必須墊高至少10cm以上，防止污染及銹蝕		
表面處理	無銹蝕、油污、水泥漿等雜物		
※※ ☐ 鋼筋直徑、間距 ※※ ☐ 鋼線網尺寸	☐ D____ @____cm ☐ 鉸接鋼線網φ6mm，20cm*20cm		
※※綁紮或鉸接固定	☐ 1. 間距<20cm可間隔綁紮 ☐ 2. 間距≥20cm應逐步綁紮 ☐ 3. 鉸道長10cm±3mm		
※※搭接長度	40D或依施工圖 相鄰兩根鋼筋搭接位置至少應錯開直徑之25倍		
※※混凝土墊塊及間距	☐ D13鋼筋，墊塊間距≤80 cm ☐ D16(以上)鋼筋，墊塊間距≤1m。		
鋼筋(鋼線網)是否穩固	應穩固俾混凝土澆置時不致鬆動		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善(檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫7mm~10mm)。 2. 檢查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。			

工地負責人：

現場工程師：

表 7-3、模板工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-4、混凝土工程自主檢查表

編號：

工程名稱	111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
鋼筋、模板組立檢查	已完成鋼筋、模板組立檢查合格		
澆置範圍	範圍是否正確		
*※混凝土拌和至到場 卸料時間控制	澆置完成 ≤ 90 分鐘		
*※混凝土強度	☐ 140 kgf/cm ² ☐ 210 kgf/cm ²		
*※混凝土溫度	不得低於13℃，亦不得高於32℃		
*※混凝土坍度	設計坍度150mm之許可差為 ± 40 mm		
*※氯離子含量	≤ 0.15 kg/m ³		
*※試體取樣	每組取樣至少製作5個試體		
混凝土澆置落下高度	1. 管口至澆置面應 ≤ 0.5 m 2. 混凝土表面不得產生析離現象，		
澆置間隔時間	澆置間隔時間應 ≤ 20 min		
振動棒	澆置15分鐘內振動，垂直插入前層深度10cm，間隔45cm，時間5~10秒		
混凝土養護	每日灑水或以不織布濕潤覆蓋		
荷載狀況	澆置後24小時內禁止荷載		
拆模及表面檢查	平順無蜂巢、無冷縫、無表面龜裂等現象之狀況		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地負責人：

現場工程師：

表 7-5、鋪面標線工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-6、排水管溝工程自主檢查表

編號：

工程名稱		111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱				
檢查位置			檢查日期	
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目		檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查 結果
放樣	配管位置	配管位置經監造單位確認		
進料	材料堆放位置	進場材料必須墊高至少 10cm，防止汙染		
*※材料	高密度聚乙烯管	D=160mm D=200mm D=300mm D=600mm		
	鋼筋混凝土管 B 型，三級	D=600mm D=800mm D=1000mm D=1200mm D=1500mm		
	軟式盲溝透水管	2" 2.5" 3" 4"		
*※管線 埋設	管溝深度	30~60cm		
	埋設物	警示帶		
	管材完整性	無破損		
	管內清潔	管內清潔無雜物		
	經過車道之管路	加裝套管保護		
	銜接牢固	牢固無鬆動		
設備安裝	安裝	牢固		
*※完工	試水	無漏水之情形發生		
	暗溝	洩水孔確實安裝 順接既有水溝、排水順利無積水 熱浸鍍鋅蓋板排列筆直		

缺失複查結果：

☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片）

☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： _____ 簽名： _____

備註：

1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地負責人：

現場工程師：

表 7-7、木作工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-8、金屬物件工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-9、鋼構工程自主檢查表

編號：

工程名稱		111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱				
檢查位置		檢查日期		
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目		檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查 結果
基礎	基礎面	清潔無積水問題		
※※金屬 結構	金屬材質	☐ 結構用鋼料 ☐ 不鏽鋼料 ☐ 鋁合金 ☐ 鋁料		
	結構尺寸	__*__*__cm(±5%)		
	結構間距	__cm(±5%)		
	鎖固方式	與送審施工圖相符		
	接合處處理	磨平及拋光		
※※表面	烤漆	顏色同送審核定顏色		
※※完成 面	固定	穩固		
	完成面	無變形、掉漆		
	表面	無砂漿殘留及其他雜物		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：				
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。				

工地負責人：

現場工程師：

表 7-10、抵石子工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-11、水泥磨石子工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-12、混凝土面層工程自主檢查表-1

(施工前及施工完成檢查)

版次：第 1 版

編號：

工程名稱	111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 /無此檢查項目		
管理項目	檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
地面平整度	平整無沉陷		
材料進場堆置	進場鋼線網必須墊高至少 10 cm 以上，防止污染及銹蝕		
※※混凝土養護	澆置後七日內表面須灑水保持濕潤狀態		
※安全衛生查驗點	檢視安全衛生查驗表單填報		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) ☐ 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 檢查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。			

工地負責人簽名：

現場工程師：

(施工前及施工完成檢查)

編號：

現場工程師：

表 7-14、高壓混凝土緣石工程自主檢查表

編號：

工程名稱	111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 /無此檢查項目		
管理項目	檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
材料進場檢查	依材料進場自主檢查表		
基礎開挖深度	深度：		
路基整理	清除雜草及廢棄物		
整地高程	開挖至設計高程並壓實		
請參考模板工程部份	依設計圖說要求		
請參考混凝土工程部份	依設計圖說要求		
*※鋪排高程	依設計圖說要求		
*※鋪排型式	依設計圖說要求		
*※緣石表面	緣石面不可沾到混凝土		
鋪面清潔	緣石表面清潔與四周環境整理		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 檢查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。			

工地負責人簽名：

現場工程師：

表 7-15、透水性鋪面工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-16、無縫地墊工程自主檢查表

編號：

工程名稱	111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 /無此檢查項目		
管理項目	檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
證明文件	出廠證明及材質證明書		
*※進場堆置及完成加工之堆置	進場材料必須墊高至少10cm以上，防止污染		
*※材料規格	☐ SBR(含膠)1cm ☐ EPDM(表層)1cm ☐ SBR+XPE，5cm 以下 ☐ SBR+XPE，5cm-10cm		
*※測量放樣	組裝位置是否正確		
構件接合	鋪面是否平整		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸(例：磚縫 7mm~10mm)。 2. 檢查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 本表由現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。			

工地負責人簽名：

現場工程師：

表 7-17、人工草皮工程自主檢查表

版次：第 1 版

編號：

工程名稱	111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
地面平整度	平整無沉陷		
*※材料進場堆置	進場材料必須墊高至少10cm以上，防止污染及銹蝕		
*※鋼線網規格	D=6.00mm，20*20cm		
*※綁紮或銲接固定	1. 間距<20cm可間隔綁紮 2. 銲接長度至少10cm		
*※搭接長度	竹節銲接鋼線網≥20cm，至少一網目		
*※混凝土墊塊	混凝土墊塊間距： D13銲接鋼線網，墊塊間距≤80 cm		
*※放樣及高程控制	設置樣板、水線		
*※保護層厚度	保護層厚度及許可差： 75mm±12.5mm		
*※混凝土強度及自拌和廠 至到場澆置完成時間	210 kgf/cm ² 澆置完成≤90分鐘		
*※溫度	不得低於13℃，亦不得高於32℃		
*※坍度	設計坍度160mm之±40mm		
*※氯離子含量	NaCl離子換算≤0.15kg/m ³		
*※試體取樣	取樣製作混凝土圓柱試體，每組取樣 至少製作5個試體		
*※人工草皮鋪設	2~5mmSBR 橡膠 顆粒膠粒混合 PU膠	t=_____cm	
	人工草皮，草長_____cm		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地負責人簽名：

現場工程師：

表 7-18、植栽移植工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-19、植栽新植工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-20、草皮鋪植工程自主檢查表

編號：

[illegible]

工地負責人：

現場工程師：

表 7-21、照明工程自主檢查表

編號：

工程名稱	111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程					
分項工程名稱						
檢查位置				檢查日期	年 月 日	
施工流程	☐ 施工前 ☒ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查					
檢查結果	☒ 檢查合格 ✕有缺失需改正 ／無此檢查項目					
管理項目	檢查標準（定量定性）			實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果	
證明文件	出廠證明					
材料進場堆置	進場材料必須墊高至少10cm以上，防止污染及銹蝕					
*※燈具種類	☐ 景觀高燈，(LED照明設備)H=3.5~5M ☐ LED軟條燈，(LED照明設備)					
*※管線基礎埋設	管線埋設深度 $\geq 60\text{cm}$					
	導線管內應先完全清除乾淨。在每一空管槽內應留下一尼龍繩以備未來安放電線或電纜用，同時其出口應加帽或加栓塞，以防止雜物或水份進入					
	混凝土基座頂面應設洩水槽					
	預埋螺栓 $\varnothing = 25.4\text{mm}$ ，L=1016mm熱浸鍍鋅					
	裸露螺栓過長有危險之虞者，須加裝蓋頭螺帽或螺栓保護套					
*※燈桿長度	☐ 景觀燈，5000~6000mm					
*※照明燈具組裝施工	固結部分是否牢固					
	接地設施標準					
	漏電斷路器標準					
*※功能測試	接地測試 $R < 50 \Omega$					
缺失複查結果：						
☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片）						
☐ 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 項」進行追蹤改善						
複查日期： 年 月 日						
複查人員職稱：				簽名：		

工地負責人簽名：

現場工程師：

表 7-22、配(分)電箱工程自主檢查表

編號：

工程名稱	111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	年 月 日
施工流程	☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目	檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查 值）	檢查結果
材料要求	核對核可型錄、訂貨單內容數量、目視並輔以尺規丈量		
*※盤面儀表電驛控制及內部組件(含無熔絲斷路器)之廠牌、規格、數量應與核定圖說面相符。	須符合送審資料及施工圖說		
*※配電盤安裝位置、高度及尺寸是否正確?	依施工圖說及規範		
*※配電盤箱體應有連接接地線。	接地線徑依施工圖說及規範		
*※電纜(線)進出口開孔應有防護墊圈，以防電纜刮傷	目視進出口開孔應有防護墊圈		
*※端子台應留有規定數量以上之備用端子及接線端子號碼應與設計圖一致。	核對承認圖端子數量及接線端子號碼		
*※核對盤內匯流排相序顏色是否正確。	三相:紅白藍 N相:黑 單相:紅藍 N相:黑		
中板迴路標示是否正確。	目視中板迴路應有標示		
缺失複查結果： ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片） ☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			
備註： 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「／」。 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

表 7-23、澆灌工程自主檢查表

編號：

工程名稱		111-112 年度桃園市公園綠地景觀工程(開口合約)-北區 第 4 次派工-蘆竹區新庄子段 1957 地號遊戲場新闢工程		
分項工程名稱				
檢查位置			檢查日期	
施工流程		☐ 施工前 ☐ 施工中檢查 ☐ 施工完成檢查		
檢查結果		☒ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 ☐ 無此檢查項目		
管理項目		檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 （敘述檢查值）	檢查結果
放樣	配管位置	配管位置經監造單位確認		
進料	材料堆放位置	避免陽光直曬或易破損之位置		
*※ 管線埋設	管溝深度	管徑>3”：管溝深度≥60cm 管徑 2~3”：管溝深度≥40cm 管徑≤1 1/2”：管溝深度 ≥30cm		
	埋設物	警示帶		
	管完整性	無破損		
	管內清潔	管內清潔無雜物		
	經過車道之管路	加裝套管保護		
	銜接牢固	牢固無鬆動		
設備安裝	安裝	牢固		
*※ 完工	試水	無漏水之情形發生		

缺失複查結果：

- ☐ 已完成改善（檢附改善前中後照片）
☐ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期： 年 月 日

複查人員職稱： 簽名：

備註：

1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。
2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

工地負責人：

現場工程師：

捌、不合格品之管制

一、不合格材料及設備之管制

- (一)、材料經查驗不合格時，品管人員在運離工地前必須標示「不合格」字樣於該批材料上，必要時以警示帶輔助標示，以防施工人員誤用。
- (二)、經判定後不合格者依下列情況處理：
 - 1. 立即運離工地：例如預拌混凝土。
 - 2. 隔離：以黃色警示帶與合格品隔離。
 - 3. 紅色標示牌：標示牌註明日期，3 日內運離工地。
 - 4. 藍色標示牌：標示牌註明日期，7 日內運離工地。
- (三)、不合格材料應退貨或依契約規定辦理，材料重新進場時應加倍抽驗。

二、施工不合格品之管制

- (一)、依自主檢查表逐項檢查，若施工之品質未達到合格標準時，就必須詳載缺失情形。
- (二)、施工不合格，除了登錄於自主檢查表外，還須以噴漆、簽字筆或粉筆，將不合格之處標示出來，以便確認修改。
- (三)、缺失情形未能當場立即改善完成或複檢仍不合格者，品管人員應填具「不合格品改善管制總表」(表 8-1)，進行追蹤改善。

三、不合格品改正與追蹤

- (一)、對不符合設計圖說、規範或合約規定之材料及施工品質均視為缺失，若有缺失則需註明缺失情形及採取改善方法，填具「不合格品改正紀錄表」(表 8-2)，缺失必須追蹤列管，缺失經複檢若仍有缺失者必須繼續追蹤至完成改善為止；缺失經確認完成改善後，始得存檔備查。
- (二)、缺失改善前中後，都必須照相存證，黏貼於「不合格品改善照片表」(表 8-3)。

表 8-1、不合格品改善管制總表
不合格品改善管制總表

編號：QA-

項次	缺失位置	不合格事項	改善方式	缺失日期	改善日期	備註

表 8-2、不合格品改正紀錄表
不合格品改正紀錄表

編號：QB-

工程名稱			
監造廠商	湧泉景觀顧問有限公司	檢查日期	
承攬廠商	五嶺營造有限公司	限定完成改善日期	
缺失具體情形、位置、範圍： 檢查人員簽名：			
採取改正措施：			
缺失複查日期： 複查結果： ☐改善完成 ☐未完成改善（說明： ☐其他（說明： 複查人員簽名：			

工地負責人簽名：

品管人員簽名：

備註：本單應併同改正前中後照片一式二份，一份建檔保存於工地，一份併入估驗計價資料。

表 8-3、不合格品改善照片表
不合格品改善照片表

	缺失改善前 說明：
	缺失改善中 說明：
	缺失改善後 說明：

工程名稱：

玖、文件記錄管理系統

一、文件管理系統

有關各類文件檔案之管理，主要係將公文往來、會議紀錄、品管文件（各項材料施工查證紀錄、檢試驗報告、施工照片、改正報告）、估驗紀錄、設計書圖等予以個別彙整建檔如表 9-1 所示。

文件紀錄分類代碼

總類	總類代碼	細類	細類代碼	保存期限 (建議)
公文	N	總收文	N A	完工後三年
		總發文	N R	完工後三年
文件 申報	H	開工、停工、竣工報告表	H A	完工後三年
		工程保險	H B	完工後三年
圖說	D	合約書圖	D C	完工後三年
		變更設計圖	D R	完工後三年
		竣工圖	D G	完工後三年
送審 資料	P	計畫書	P Q	完工後三年
		材料送審	P C	完工後三年
職業安 全衛生	R	協議組織會議紀錄	R A	完工後三年
	R	一般安全衛生教育訓練紀錄	R B	完工後三年
	E	工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表	ES-01	完工後三年
	E	工程整體危害因素告知單	ES-02	完工後三年
	E	一般性作業安全衛生查驗表	ES-03	完工後三年
	E	消防、急救設備檢查表	ES-04	完工後三年
	E	土方工程作業安全檢查表	ES-05	完工後三年
	E	模板作業安全檢查表	ES-06	完工後三年
	E	鋼筋綁紮作業安全檢查表	ES-07	完工後三年
	E	混凝土澆置作業安全檢查表	ES-08	完工後三年
	E	鋼構作業安全檢查表	ES-09	完工後三年
	E	汛期工地防災減災自主檢查表	E W	完工後三年
	E	工地環境清潔及交通維持安全措施檢查表	E P	完工後三年
	E	緊急災害事故立即回報單	E E	完工後三年

進度報告	G	工程日報表	G D	完工後三年
		工程進度表	G M	完工後三年
施工紀錄	W	施工照片	W A	完工後三年
材料設備	T	材料/設備送審管制總表	T A	完工後三年
		材料設備檢（試）驗管制總表	T B	完工後三年
		材料自主檢查表	T C	完工後三年
		材料退料紀錄單	T D	完工後三年
		材料/設備品質抽驗紀錄表	T E	完工後三年
檢驗	E	主任技師督察紀錄表	E A	完工後三年
		施工測量工程自主檢查表	EW-01	完工後三年
		鋼筋工程自主檢查表	EW-02	完工後三年
		模板工程自主檢查表	EW-03	完工後三年
		混凝土工程自主檢查表	EW-04	完工後三年
		瀝青混凝土施工自主檢查表	EW-05	完工後三年
		銲接鋼線網施工自主檢查表	EW-06	完工後三年
		景觀植栽施工自主檢查表	EW-07	完工後三年
不合格	Q	不合格品改善管制總表	Q A	完工後三年
		不合格品追蹤改善紀錄	Q B	完工後三年
估驗	B	估驗計價	B U	完工後三年
會議記錄	R	工地檢討會	R W	完工後三年
		施工界面協調會	R C	完工後三年

表 9-1、文件紀錄分類代碼

二、記錄管理作業程序

類文件、紀錄與表單，依其性質加以區分並編號建檔，以作追蹤考核之參考。文件依以下格式進行編碼如圖 8-1 所示。



文件編碼圖例

細類代碼	流水號	版次
A E	001	01

圖 9-1、文件編碼圖例

附件

一、工程人員證書

	
技 師 證 書	
技證字第 007975 號	
姓 名：	曾英俊
性 別：	男
出 生 年 月 日：	民國 69 年 3 月 17 日
身分證統一編號：	██████████
科 別：	結構工程科
考試及格證書字號：(100) 專高技字第 000336 號	
上列申請人經技師考試及格依法請領技師證書 核與技師法規定相符合行發給證書此證	
行政院公共工程委員會 主 任 委 員 陳振川	
	
中華民國 101 年 3 月 22 日	

(一)、主任技師證書



(二)、工地主任證

結業證書

證書編號第 KE1100443 號

詹為丞 性別：男 身分證統一編號：[REDACTED]

民國八十六年四月二十四日生，
參加本會於民國一一〇年七月十日
至民國一一〇年九月十二日委託
中原大學舉辦之第 KE 11002 期
「公共工程品質管理訓練班」84 小時，
成績及格准予結業特此證明



(未蓋銅印者無效)

行政院公共工程委員會
主任委員

吳澤成



中華民國 一一〇 年 十二 月 日

(三)、品管人員結業證書

勞工安全衛生教育訓練 結業證書				
證書 字號	110N05701040103	補證 次數		
姓名	鄒智宇	出生 日期	84.05.02	
身分證 統一編號	[REDACTED]			
訓練 單位	社團法人中華民國工業安全衛生協會附設新北職業訓練中心			
訓練 種類	營造業甲種職業安全衛生業務主管教育訓練			
訓練 日期	109.12.08至109.12.25	發證 日期	110.01.18	
新北市政府新北勞檢字第1094800447號				



(四)、職業安全衛生業務主管證書
